



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 657/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 28 มิ.ย. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานปักเสา-พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	10,14 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา-พาดสายแรงสูง บ้านหนองกระทุ่ม	DAA55-04 หน้า บ.สยามโซลาร์	ดิสชั่วคราวหน้า รุ่งสวัสดิ์ค้าไม้	นายศักรินทร์ แก้ว ปานกัน โทร.080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขส.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA05 จาก DAA55-04 ถึง ดิสชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
ในวันที่ 10,14 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 900/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฟ้าวิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายพิภพ โทร 080-
9634 6904 แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๑๖.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตำบลหนองกระทุ่ม วงจร DAA05					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10,14/7/2024	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	900/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04						
5	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดช.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
6	DIS ชั่วคราว DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS หน้ารุ่งสวัสดีค้าไม้
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DAA05S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
14	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
19	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
20	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DAA05S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
24	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก DAA04						
25	DIS ชั่วคราว DAA05	ปลด	สับ		ดช.		DIS หน้ารุ่งสวัสดีค้าไม้
26	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
27	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
28	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟฟ้าเพื่อให้งานก่อสร้างรางรถไฟฟ้า-พาดสาย
 วงจร DAA 05 ตั้งแต่ DAA5S-04 หน้าสถานีไฮดรอลิก ถึง DISชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้

สถานีเดิมบาง

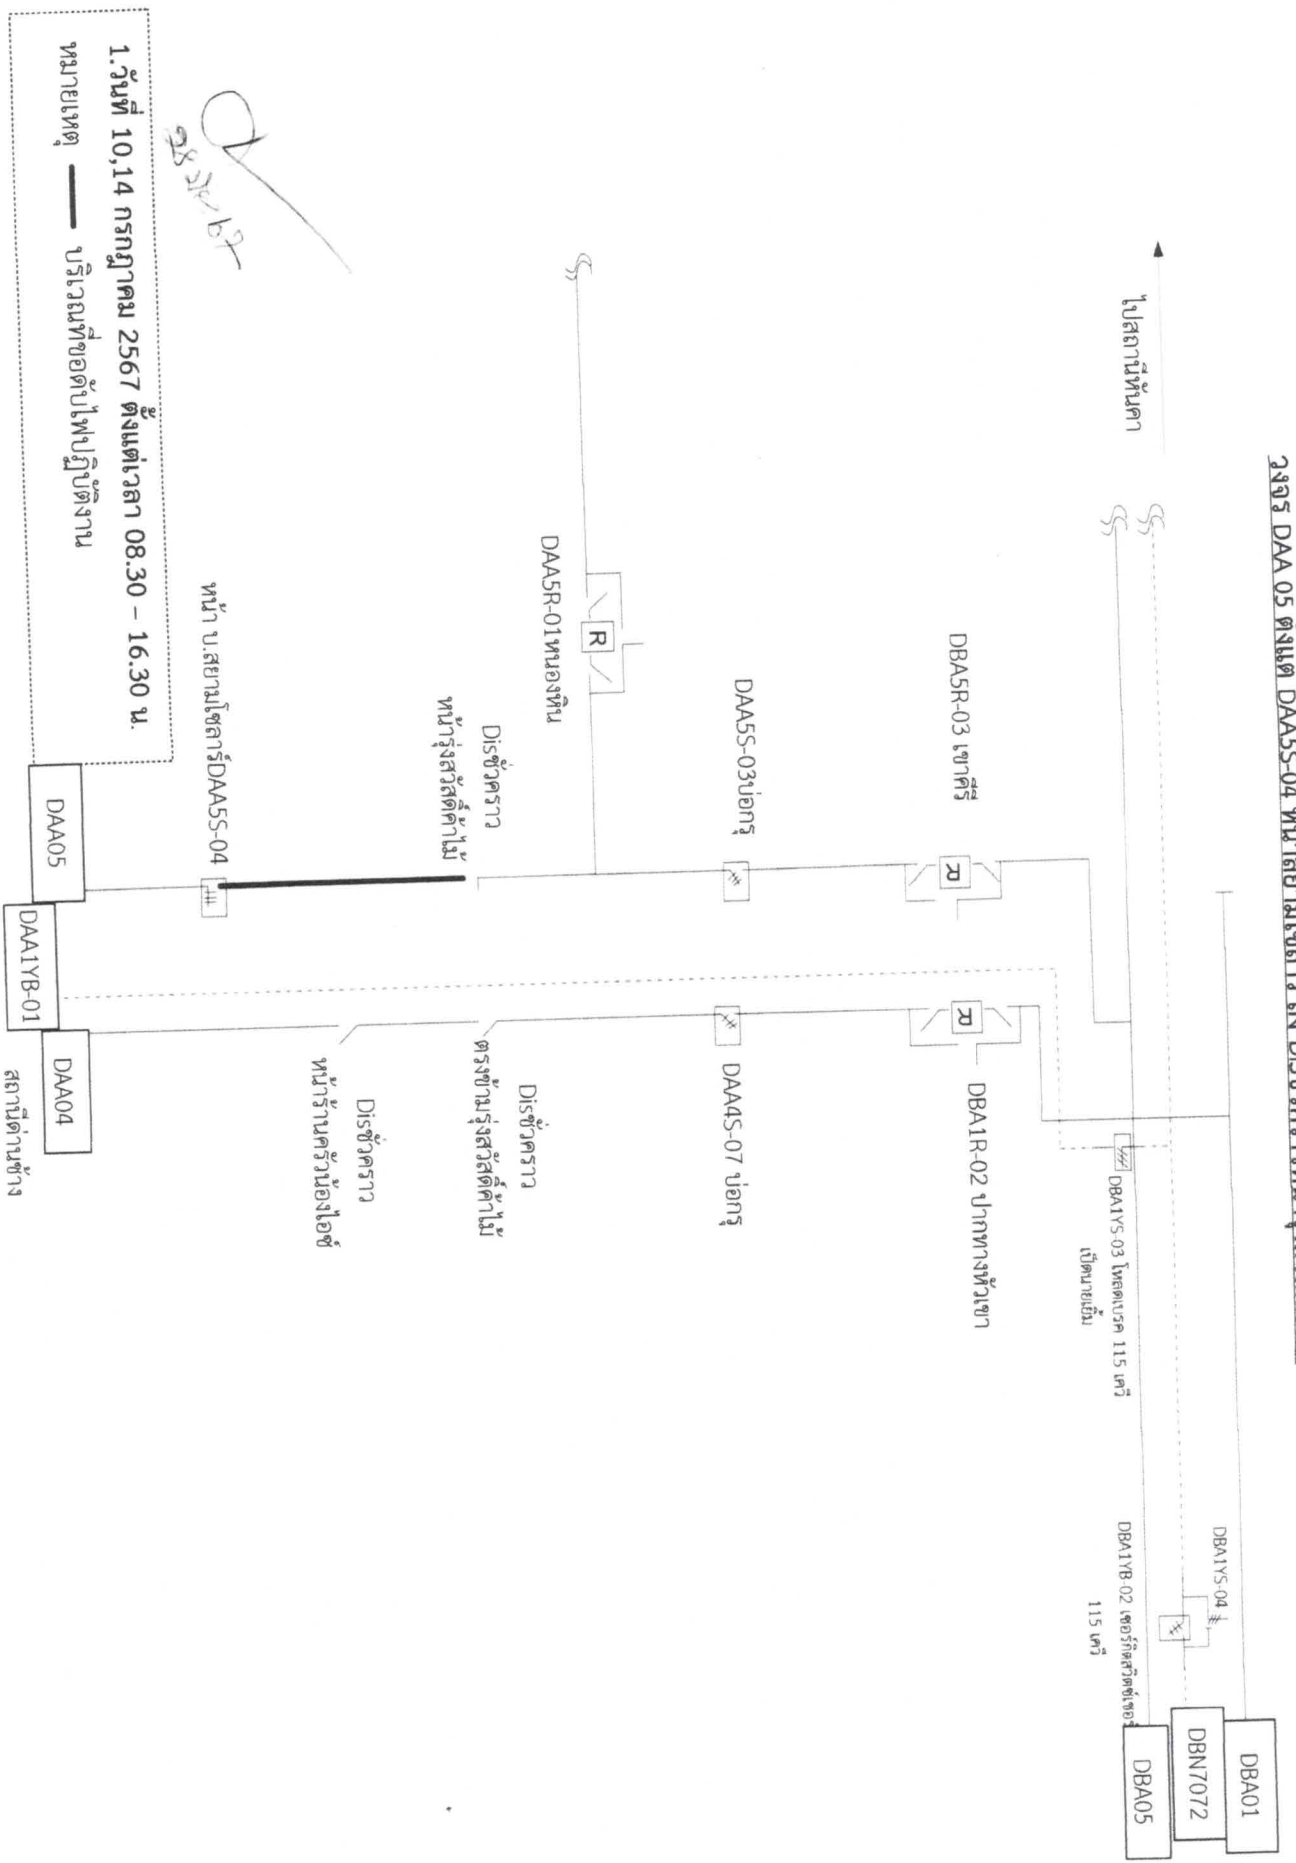

Handwritten signature and date:
 28/11/22

1.วันที่ 10,14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน
