



Switching Deadline  
วันที่ 16 ก.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๒.ก.๓.ค.ป.บ.(ก.บ.)- ๗๕๑ / ๒๕๖๔

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หลังรีโคสเซอร์ตงซีเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC01 หลังรีโคสเซอร์ SPC01R-01 รวมทรัพย์สินถาวร ตงซีเหล็ก	๑๗ ก.ค.๒๕๖๔	๐๘.๐๐น.	๑๖.๓๐น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ต.มม.	DIS ชั่วคราว ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค	DIS ชั่วคราว ตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕
๒.	SPC01 หลังรีโคสเซอร์ SPC01R-01 รวมทรัพย์สินถาวร ตงซีเหล็ก	๒๑ ก.ค.๒๕๖๔	๐๘.๐๐น.	๑๖.๓๐น.	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายเคเบิล SAC ๑๘๕ ต.มม.	DIS ชั่วคราว ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค	SF6 DBA03S-11 บ้านวังหว้า	นายจิระยุทธ อางศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....มีไหลดผู้ใช้ไฟ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อางศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร ๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๒ พิดเคอร์ SPC01 จาก DIS ชั่วคราวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค ถึง SF6 DBA03S-11 บ้านวังหว้า

ในวันที่ 21 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 914/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุฑทอง ลาภิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิระยุทธ อางศิริ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๗๒๓, กฟส. ๖๕๐

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
อ.ก. 7/๗๓๗๗๗

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

เบสงานสวทชง


1. สถานที่ทำงาน	ศาลเจ้าพ่อตันแค - บ้านวังห้ว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทา	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	914/64	
4. เตรียมการสวทชงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวทชงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวทชงโดย				วันที่	9 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวทชงโดย				1. นายเพชรดิน,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติกอน ดาเนนการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวทชง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		Load = 10.54 MW
3	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load = 3.02 MW
4	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	รวมทรัพย์สินถาวรตั้งซีเหล็ก
5	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 11.16 MW
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load = 2.01 MW
7	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPC01						
8	SPC01S-11	ปลด	สับ		ศปจ.		หน้าวัดปุเจ้า
9	SPC01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		หน้าบ้อมตำรวจบ้านกล้วย
10	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
11	DBA03S-08	ปลด,ลือคคาน	สับ		สข.		ร้านเทเลวิซ
12	DBA03S-11	สับ	ปลด,ลือคคาน		ศปจ.		วังห้ว
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	Dis ชค. SPC01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		ศาลเจ้าพ่อตันแค
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
19	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
20	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.	R	รวมทรัพย์สินถาวรตั้งซีเหล็ก
21	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
24	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกตก่อน ดาเนนการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
27	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
28	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
29	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R รวมทรัพย์สินถาวรตั้งชี้เหล็ก
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	Dis ชค. SPC01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ศาลเจ้าพ่อต้นแค
34	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก DBA03						
35	DBA03S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 วังหว่า
36	DBA03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 ร้านเทเลวิซ
37	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPC01 คิน						
38	SPC01S-10	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS หน้าป้อมตำรวจบ้านกล้วย
39	SPC01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS หน้าวัดปู่เจ้า
40	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
41	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
42	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R รวมทรัพย์สินถาวรตั้งชี้เหล็ก
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC

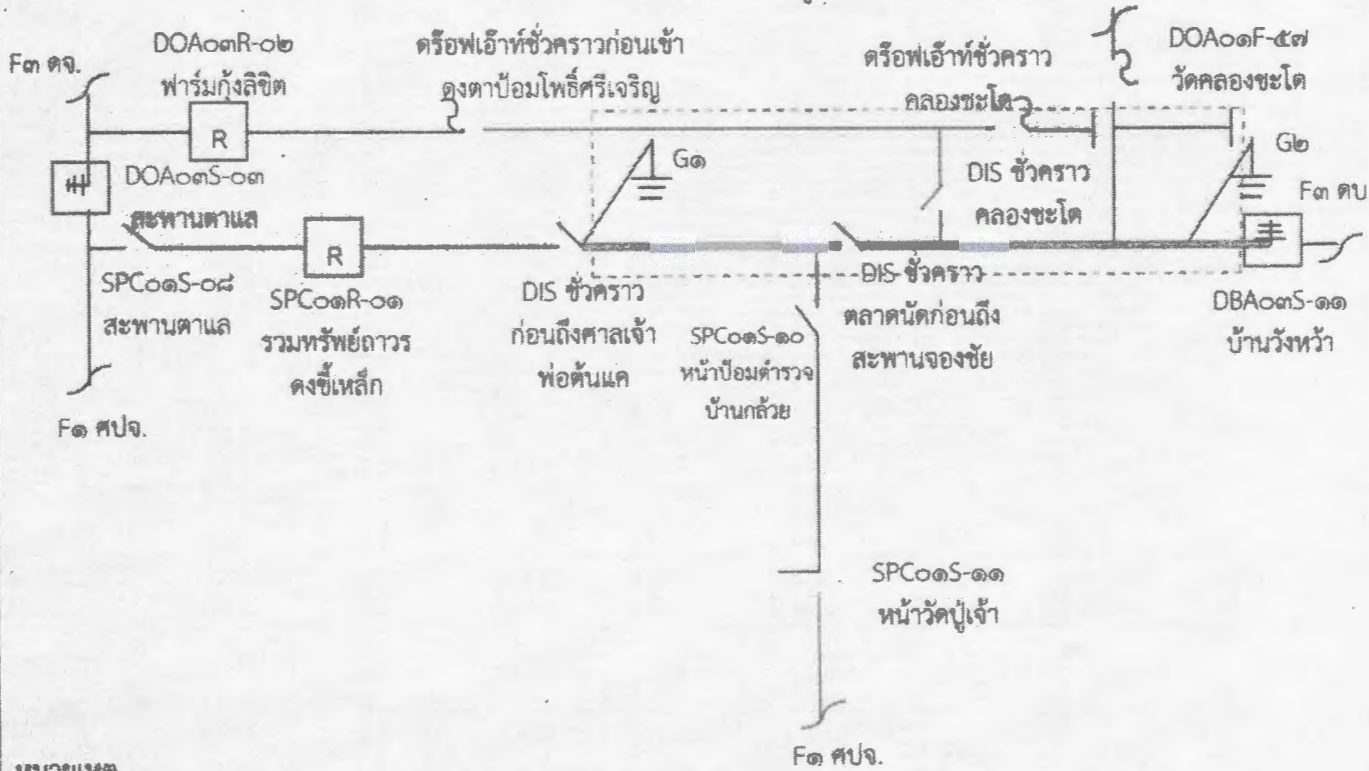

หมายเหตุ

๑. ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายเคเบิล ๑๘๕ SAC
๒. วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓. ตั้งรีเลย์เซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Nonrecloseing ตั้ง F๓ ดบ.อยู่ Manual
๔. ปลด DIS ชั่วคราวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค
๕. ปลด SF๖ DBA๐๓S-๑๑ บ้านวังหว้า
๖. ปลด DIS ชั่วคราวคลองชะโด
๗. จ้ม ซ็อตกราวด์ G๑ , G๒
๘. แจ้งช่างดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงได้
๙. ตั้งรีเลย์เซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Normal ตั้ง F๓ ดบ.อยู่ AUTO
๑๐. งานแล้วเสร็จ
๑๑. ตั้งรีเลย์เซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Nonrecloseing
๑๒. ปลด ซ็อตกราวด์ G๑ , G๒
๑๓. จ่าย DIS ชั่วคราวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อต้นแค
๑๔. จ่าย DIS ชั่วคราวตลาดนัดก่อนถึงสะพานจองชัย
๑๕. ตั้ง F๑ สปจ.อยู่ Manual
๑๖. จ่าย DIS SPC๐๑S-๑๐ หน้าบ้อมตำรวจบ้านกล้วย
๑๗. ปลด DIS SPC๐๑S-๑๑ หน้าวัดปู่เจ้า
๑๘. ตั้งรีเลย์เซอร์ SPC๐๑R-๐๑ ดงซีเหล็ก อยู่ Normal
๑๙. ตั้ง F๑ สปจ.อยู่ AUTO
๒๐. เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
