



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๒๐๘ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หลัง BEA๘R-๐๑ ตามแผนผัง

สิ่งขบแผน จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA8R-01	14 มิ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง ๒๒ kV และ หม้อแปลง	BEA8R-01	DIS ชั่วคราว คลองพระพิมล	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พชง.6 ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) จาก BEA๘R-๐๑ ถึง คลองพระพิมล

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ป. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEA^{๐๑} จาก BEA8R-๐๑ ถึง DIS ชั่วคราว คลองพระพิมล.

ในวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 930/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ฝาสิงห์ ประสานงานขอตัดไฟกับ ทพ.ประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายปริกที โพธิ์เชิด)
ผคฟ. 4 กทท นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บด.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ รีโคสเซอร์ BEA08R-01-DIS ชั่วคราว คลองพระพิมล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง 22 KVและหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 930/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 4 มิถุนายน 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 4 มิถุนายน 2566		
	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
3	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
4	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
5	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R สีแยกบางก่าง
6	ย้ายโหลด BEA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN05						
7	BEA08S-27	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 โรงสีป.เฟื่องฟู
8	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
9	แจ้งช่างกฟอ.บล.ปลดใบมีดออกไลน์ BEA08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
11	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองพระพิมล
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	หลังจาก กฟอ.บล. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
16	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
17	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
18	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R สีแยกบางก่าง
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
24	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
25	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	สี่แยกบางกาว้อง
27	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
28	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บล.		DIS	คลองพระพิมล
29	ย้ายโหลด BEA09 บางส่วนกลับจาก SPN05							
30	แจ้งช่างฟอ.บล.สับใบมีดออกไลน์ BEA08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส							
31	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R	ป้อมตำรวจบางไทร
32	BEA08S-27	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6	โรงสีป.เฟื่องฟู
33	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
34	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
35	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ป้อมตำรวจบางไทร
36	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	สี่แยกบางกาว้อง
37	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

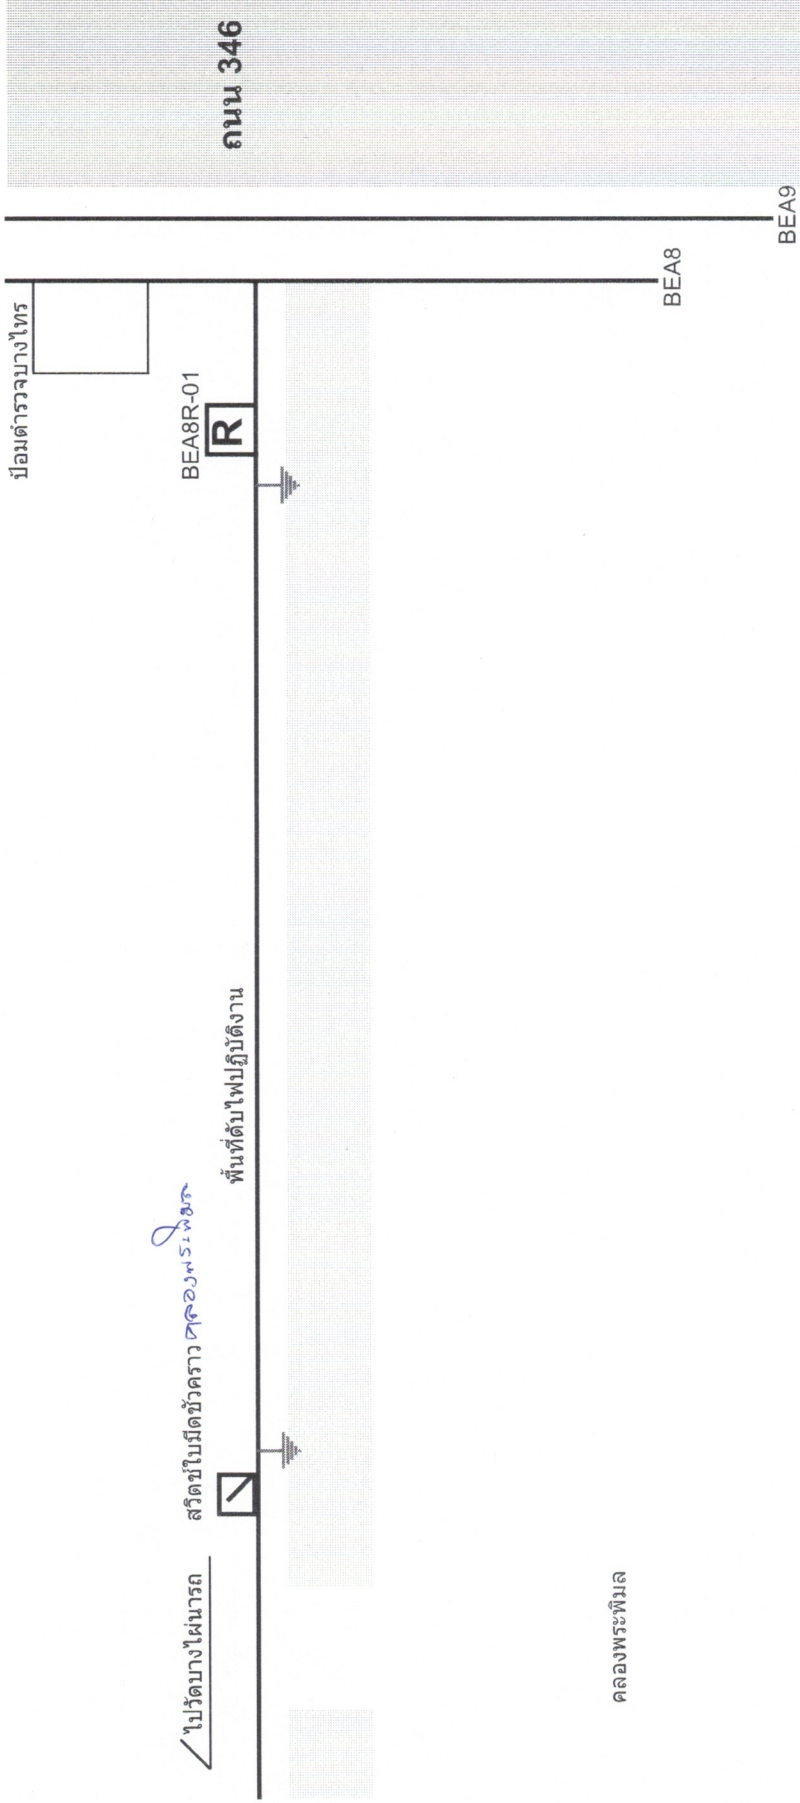

คลองพระพิมล

ฝั่งดับไฟ 22 KV. วันที่ 14 มิถุนายน 2566 BEA8R-01 ถึงคลองพระพิมล
