



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ.) ๒๕๐๒ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาไฟฟ้า, หม้อแปลง ออกจากที่ดินส่วนบุคคล บริเวณตรงข้าม CJ บ้านท่าไชย ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.6 (UTG)	23 มิ.ย. 66	08.00	17.00	ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาไฟฟ้า, หม้อแปลง ออกจากที่ดินส่วนบุคคล บริเวณตรงข้าม CJ บ้านท่าไชย (ตัดDDEโดยขอทไลน์กระเช้า)	SF6 ชั่วคราวหน้าเมืองไทย แคบปีดอล	DDE หน้าเซเวน บ้านท่าไชย	นายจنگกล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงกฟอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผขฟ.๒๑๑ราย) ..หม้อแปลงเฉพาะรายจำนวน ๒ เครื่อง...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.....โทร๐๘๕-๒๖๖๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ UTd 6 จาก SF6 ๖๐. หน้าไทยเดมปีดอล ถึง DDE หน้าเซเวน บ้านท่าไชย.
ในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 969/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณวิไล เกียงพงู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจنگกล โพธิกุล

(นายอรุณวิไล เกียงพงู)
วคก. 5 ๓๓๓ นว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๓๐๖., กฟร.ลพพ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านท่าไชย (UTG06)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 969/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง					วันที่	15 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	15 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	15 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	R.บ้านทางตลาด
4	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
5	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	ตรงข้าม สนง.กฟส.สองพี่น้อง
6	ย้ายโหลดวงจร UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO03						
7	SPO03S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
8	SF6 ไลน์ UTG06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ชั่วคราว หน้าเมืองไทยแคบิตอล
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ทำการปลดโหลดบริเวณพื้นที่ดับไฟไลน์วงจร UTG06 ออก						
11	หลังจากทำการปลดโหลดบริเวณพื้นที่ดับไฟไลน์วงจร UTG06 ออก เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE ไลน์วงจร UTG06 บริเวณหน้าเซเว่นท่าไชย ออกทั้ง 3 เฟส (ปลดแบบมีไฟ)						
13	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE ไลน์วงจร UTG06 บริเวณหน้าเซเว่นท่าไชย ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	R.บ้านทางตลาด
20	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
21	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	ตรงข้าม สนง.กฟส.สองพี่น้อง
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
26	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R R.บ้านทางตลาด
29	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
30	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R ตรงข้าม สนง.กฟส.สองพี่น้อง
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE ไลน์วงจร UTG06 บริเวณหน้าเซเว่นท่าไชย เข้าทั้ง 3 เฟส (เชื่อมแบบมีไฟ)						
33	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE ไลน์วงจร UTG06 บริเวณหน้าเซเว่นท่าไชย เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
34	ย้ายโหลดวงจร UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO03						
35	SF6 ไลน์ UTG06	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ชั่วคราว หน้าเมืองไทยแคปปิตอล
36	SPO03S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R R.บ้านทางตลาด
39	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
40	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R ตรงข้าม สนง.กฟส.สองพี่น้อง
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังก่อนดับไฟ

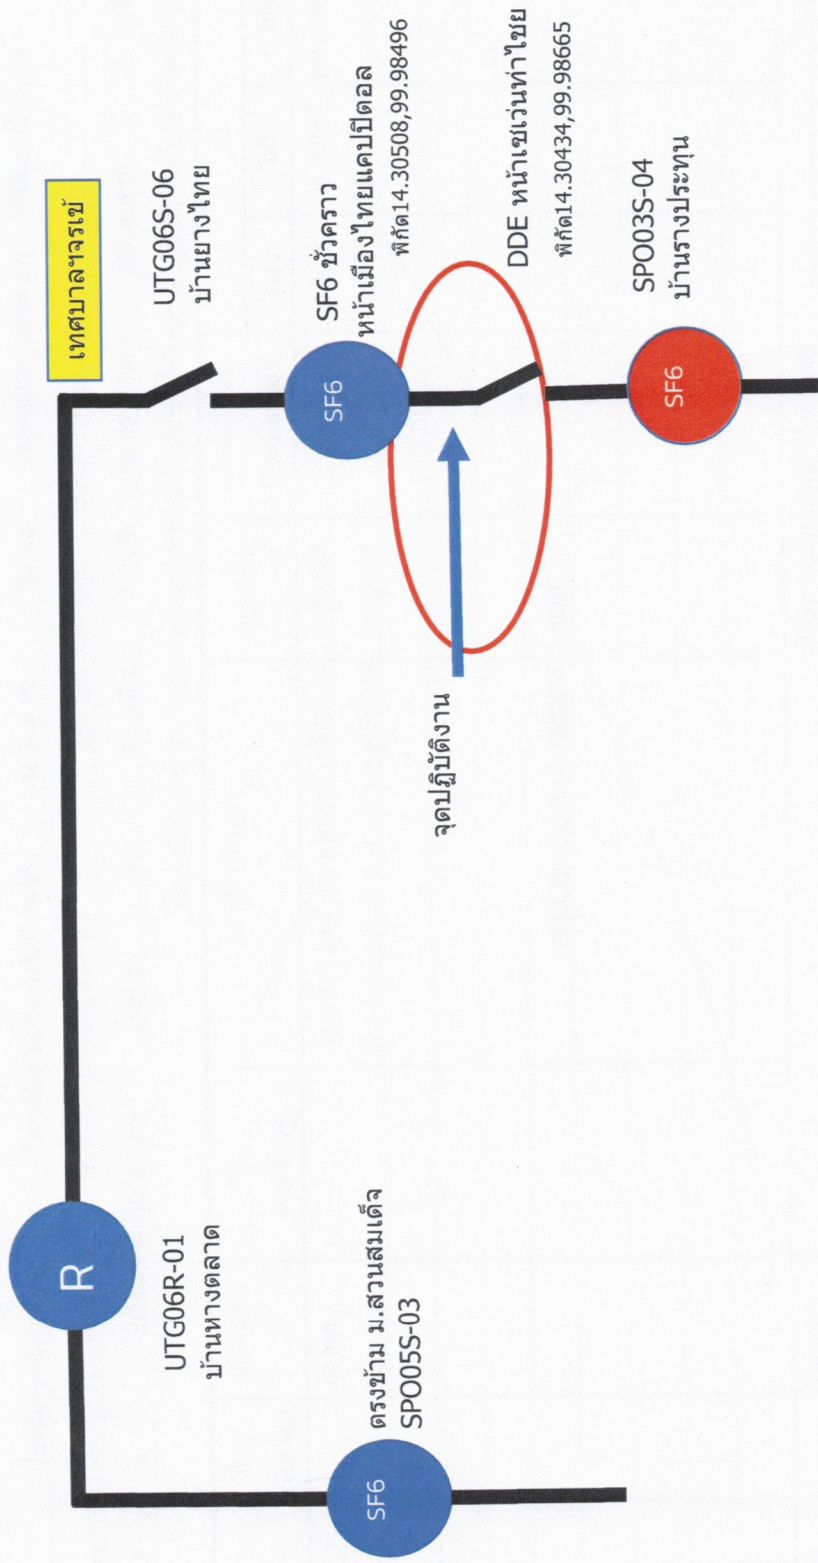

แผนผังหลังดับไฟ

