



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

23 ก.ค. 67

เลขที่ ก.3 ดน.(ปน) 718 /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิธีราษฎร์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 15 ก.ค. 2567  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เคอิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย วงจร DAA ๐๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA05R-01	26 ก.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา/ พาดสาย หลัง DAA05R-01 หนองหิน	DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราว วัดหนองหิน	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน พงษ.4 ผจก.กฟอ.ดบ. 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปน โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.875804... Long: ...99.848597...  
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.903918... Long: ... 99.825899.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ลงชื่อ.....  
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Dis ๓๓. อังคนัน

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DAA5 จาก DAA5R-01 ถึง  
ในวันที่ 26 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 994/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. ๓๖ ๓๖ ๓๖  
17 ก.ค. 67

นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายศันรินทร์ แก้วปานกัน)  
จก.๕ ๖๖๓ ๕๕-คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองหิน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสายส่ง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 994/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	20 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>พิชชา</i>				วันที่	20 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.		R หนองหิน
5	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
6	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน ฝาก DAA06						
7	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
8	DIS ชค. DAA6	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สามแยกหนองหิน
9	DIS ชค. DAA5	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS วัดหนองหิน
10	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
12	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		R หนองหิน
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ออกทั้ง 3 เฟส						
14	ตรวจสอบ Sw. Bypass ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุดจุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุดจุด G2						
17	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
19	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
20	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
21	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
22	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจจุดจุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจจุดจุด G2						
25	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
26	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
27	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
28	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
29	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับใบมีดด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		ดบ.		R หนองหิน


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน กลับจาก DAA06						
33	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
34	DIS ชค. DAA5	ปลด	สับ		ดบ.		DIS วัดหนองหิน
35	DIS ชค. DAA6	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สามแยกหนองหิน
36	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
37	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
38	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
39	DAA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R หนองหิน
40	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟฟ้า เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01 หนองหิน ถึง ตัดชั่วคราววัดหนองหิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

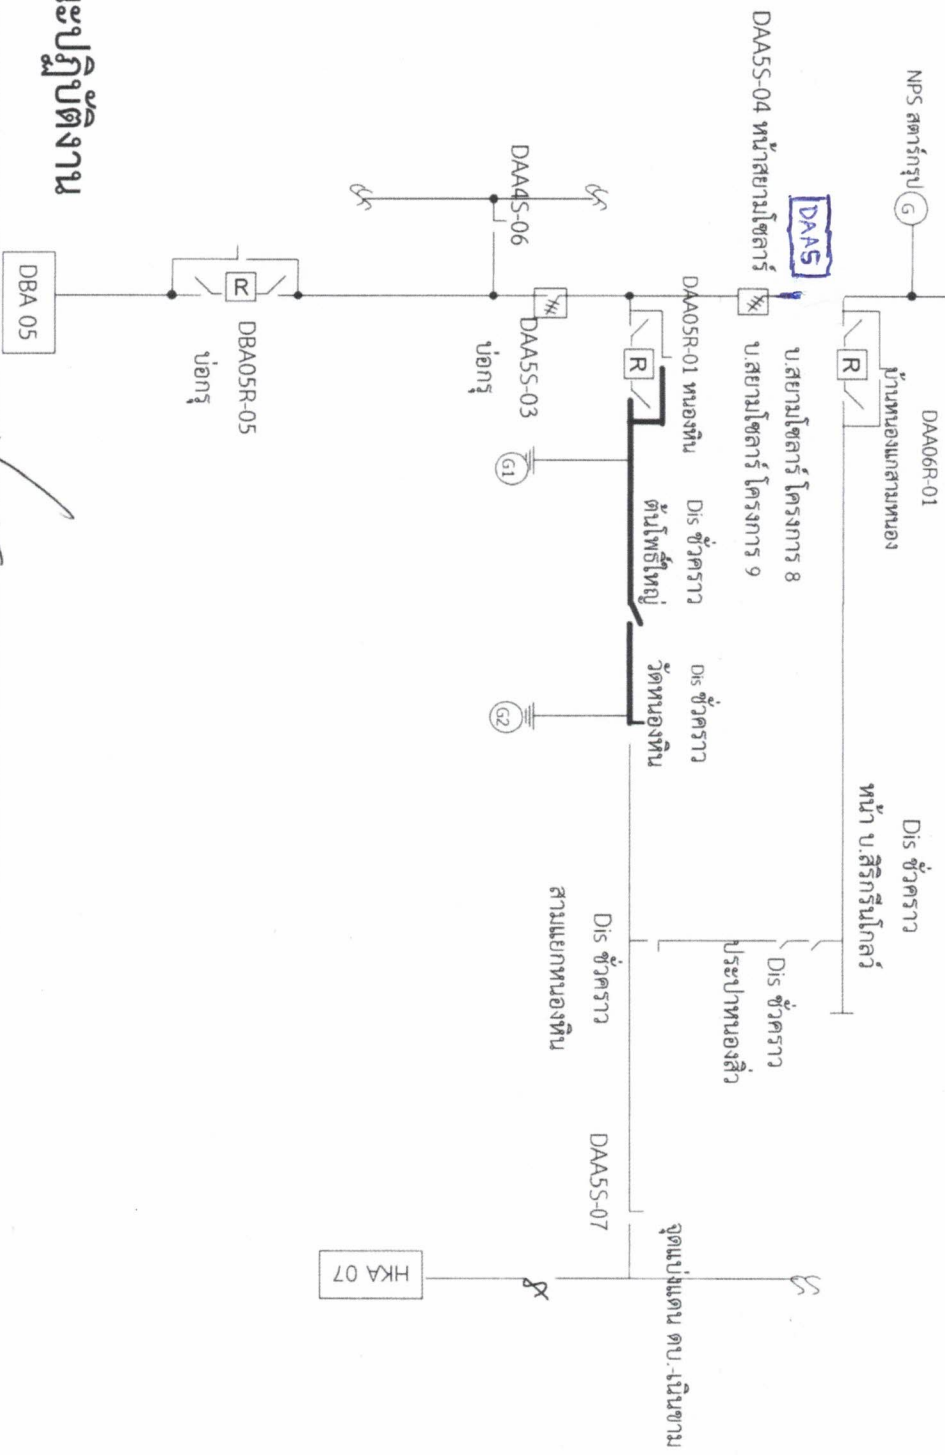

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ตัดไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหลังรีดลอสเซอร์ DAA5R-01 หนองหิน

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

*Handwritten signature*
