



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝปบ.น.3

โทรสารขอปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สายส่ง/สถานี

ชื่อผู้รับ.....ตำแหน่ง.....	ด้วย กฟฟ.....กจค.1(บก2)..... ประสงค์จะขออนุมัติ	
ชื่อผู้ส่ง.....ตำแหน่ง.....	☒ ดับไฟ ☐ ถ่ายเทโหลด เพื่อปฏิบัติงานในระบบ	
เลขที่.....วันที่.....	☐ จำหน่ายแรงสูง ☐ สายส่ง ☒ สถานี มีรายละเอียดดังนี้	
ฟีดเดอร์	KBG04YB-01	
สถานีไฟฟ้า	สถานีฯค่ายบางระจัน	
วัน/เดือน/ปี	20-27 ธันวาคม 2565	
ระหว่างเวลา	08.00 น. - 17.00 น.	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ปริมาณงาน	งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีฯค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2	
แผนการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์	ว/ด/ป เริ่มงาน : 20 ธันวาคม 2565	ว/ด/ป แล้วเสร็จ : 27 ธันวาคม 2565
เลขที่อนุมัติ/หมายเลขงาน	ที่ กจค.1(บก2)(วฟ.) 1909/2565 ลว. 9 ธ.ค. 2565	
สถานที่ปฏิบัติงาน	สถานีฯค่ายบางระจัน	
บริเวณที่ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน (ตามแผนผังแนบ แผ่น)	สถานีฯค่ายบางระจัน	
ผู้ควบคุมงาน/รหัสรถยนต์	นายธงชัย พักขาว รก.กค.น3	
ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไฟดับ	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป	รวม.....ราย
	ผู้ใช้ไฟประเภท ฟาร์มไก่, ฟาร์มหมู, บ่อปลา, บ่อกุ้ง	รวม.....ราย
	ผู้ใช้ไฟอื่นๆ	รวม.....ราย
(หากส่งโทรสารฯ ถึง ฝปบ.น.3 น้อยกว่า 7 วันทำการ ให้ระบุเหตุผลในหมายเหตุ)		
หมายเหตุ..... (.....)		
พยากรณ์สภาพอากาศวันปฏิบัติงาน:.....		
เรียน อ.ฝปบ.น.3 ผ่าน อ.ก.บ.น.3 ผคฟ.พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ปฏิบัติงานได้ตามคำขอ ฟีดเดอร์.....KBG01YB-01 จาก.....จุดปลด TAKE OFF..... ถึง.....D/S Riserpole ของแต่ละฟีดเดอร์..... ในวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง.....น. ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ระหว่างเวลา.....น. ถึง 17.00 น. ตามรายละเอียดขั้นตอนการทำงานสวิตชิง เลขที่.....6505070..... จำนวน.....6.....แผ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  (.....นายคมสัน คุ้มปรีดี.....) ตำแหน่ง.....ชผ.คฟ.น.3 รักษาการแทน ผผ.คฟ.น.3.....15 / ธ.ค. / 2565.....	ที่ น.3 กปบ.(คฟ.) - 4656/2565 เรียน ผจก..สห..คนจ..ผคฟ.1.อก.ว.น.3.อก.น.น.3.....อก.กค.น.3.อก.ป.น.3.อก.ช.น.3 , อก.จค.1(บก2) ☒ อนุมัติและแจ้ง กฟฟ./สถานีฯในสังกัด ทราบและดำเนินการต่อไป ☒ ให้ ผจก.1 จัดเตรียมพนักงานในสถานีฯดังต่อไปนี้ สถานีฯ.....ค่ายบางระจัน..... ☐ ให้เลื่อนไปดำเนินการในวันที่..... เนื่องจาก..... ☒ อาจมีแรงดันไฟฟ้าตก อ.ค่ายบางระจันบางส่วน, โรงสีกวงเจริญ บริเวณ.....อ.บางระจันบางส่วน, โรงน้ำแข็งโพธิ์หอม แรงดันประมาณ 20.23-20.80 เควี ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า ถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้  (.....นายโสภณ แสงทอง.....) ตำแหน่ง.....ชก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ฝปบ.น.3.....15 / ธ.ค. / 2565.....	

กป√บ.(คฟ.)-01/64 วันที่เริ่มใช้ 1.ก.พ. 2564 (แบบฟอร์มแนบตามบันทึกเลขที่ น.3 กปบ.(คฟ.) -)

สามารถตรวจสอบอนุมัติสวิตชิงได้ที่ QR Code





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กจค.1(บก2) ถึง ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ กจค.1(บก2)(วฟ.) 1909 /2565 วันที่ - 9 ส.ค. 2565
เรื่อง สรุปประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้า
จ่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1
เรียน คณะกรรมการตรวจรับฯ
นายวรวิทย์ เจริญดำเนินกิจ รฟ.บก.1
นายชินบดี เตียนศรี อก.กส.
นายเนติ โพธิวัฒน์ อก.กค.(น.3)
อก.ทอ., อก.กค.(น.3), อก.ปบ.(น.3), อก.บข.(น.3)
ผู้ควบคุมงานฯ
นายธงชัย พักขาว รก.กค.(น.3)

ตามที่ กจค.1(บก2) ได้เชิญส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าจ่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านระบบ Google Meet นั้น

กจค.1(บก2) ได้จัดทำสรุปประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแนบ หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่ กจค.1(บก2) อาคาร 2 ชั้น 6 กฟภ. สำนักงานใหญ่ ภายใน 7 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดถือว่าสรุปประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพล คำสวน)
อก.จค.1(บก2)

สรุปประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test
งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผ่านระบบ Google Meet

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

อก.จค.1(บก2) กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test ของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ตามสัญญาจ้าง TDDP2-02/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่ได้ประชุมไว้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างและการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันกำหนดแผนงานทดสอบใหม่ในครั้งนี้

มติที่ประชุมให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 2 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วน of ระบบ 115 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

1.1 เพื่อนำหม้อแปลง TP2 เข้าใช้งานในระบบแทนหม้อแปลง TP1

1.2 ดำเนินการปลดสาย Loop Al 400 sq.mm. Bay-02 TP1 ออกเพื่อเตรียมปรับปรุงต่อไป

2. เปลี่ยนแปลงกำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 3 จากเดิมวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วน of ระบบ 115 kV และ 22 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

2.1 ดำเนินการสลับสาย control ระหว่างตู้ TCB1 กับ LRP2

2.2 Pre-Commissioning Bay-02, 03

2.3 Commissioning Bay-02, 03

2.4 115 & 22 kV Function 50BF test

2.5 Function Tie Bus YS-03

2.6 TP1 87T Stabilize test

2.7 87B Stabilize test

2.8 ทดสอบ AC Withstand ในส่วนของ 115 kV Switchyard Bay-02, 03 โดยเริ่มทดสอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันทดสอบในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

3. ก่อนถึงวันดำเนินการทดสอบ AC Withstand voltage test ให้ผู้รับจ้าง นำส่งหนังสือแจ้งความพร้อมในการทดสอบฯ ให้ กจค.1(บก2) เพื่อประสานงานแจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายพนิตย์ อารีรักษ์ ชผ.วฟ. กจค.1(บก2)

รับรองรายงานการประชุม นายณัฐพล คำสวน อก.จค.1(บก2)



เอกสารแนบ
รายละเอียดแผนงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กจค.1(บก2)

ถึง ส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ กจค.1(บก2)(วฟ.) 1828 /2565 วันที่ 30 พ.ย. 2565

เรื่อง สรุปรประชุมเตรียมความพร้อม AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้า
ค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1

เรียน คณะกรรมการตรวจรับฯ

นายวรวิทย์ เจริญดำเนินกิจ รฟ.บก.1

นายชินบดี เตียนศรี อก.กส.

นายเนติ โพธิ์วัฒน์ อก.กค.(น.3)

อก.ทอ., อก.กค.(น.3), อก.ปป.(น.3), อก.บช.(น.3)

ผู้ควบคุมงานฯ

นายธงชัย พักขาว รก.กค.(น.3)

ตามที่ กจค.1(บก2) ได้เชิญส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร SCADA กฟน.3 นั้น

กจค.1(บก2) ได้จัดทำสรุปรประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแนบ หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่ กจค.1(บก2) อาคาร 2 ชั้น 6 กฟภ. สำนักงานใหญ่ ภายใน 7 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดถือว่าสรุปรประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพล คำสวน)

อก.จค.1(บก2)

สรุปประชุมเตรียมความพร้อม AC Withstand voltage test
งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร SCADA กฟน.3

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อแนบ)
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ผู้แทนจาก กจค.1(บก2) กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test ของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ตามสัญญาจ้าง TDDP2-02/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมทดสอบ End-to-End ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างและการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันกำหนดแผนงานทดสอบในครั้งนี้

1. สถานะงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ ปัจจุบันตามแผนงานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบจำเป็นต้องขอตัดกระแสไฟฟ้า 3 ช่วง
2. กำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วนของระบบ 115 kV และ 22 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
 - 2.1 ติดตั้งและเชื่อมต่อ 115 kV Main Bus & Transfer Bus
 - 2.2 ติดตั้งและเชื่อมต่อ 22 kV Main Bus no.1 ระหว่างตู้ 05VB-01 กับ 1CVB-01
 - 2.3 ติดตั้งระบบ Arc protection และทดสอบการทำงานทั้ง Bus no.1 & Bus no.2
 - 2.4 ทดสอบในส่วนของ 115 & 22 kV Function 50BF
 - 2.5 ทดสอบ AC Withstand ในส่วนของ 115 kV Bay Tie, Bay TP2, 22 kV Switchgear และ 22 kV Cap Bank
3. กำหนดทดสอบ End-to-End ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด point ในการทดสอบสอดคล้องตามแผนทดสอบ AC Withstand ตามข้อ 2.5
4. กำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วนของระบบ 115 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
 - 4.1 เพื่อนำหม้อแปลง TP2 เข้าใช้งานในระบบแทนหม้อแปลง TP1
 - 4.2 ดำเนินการปลดสาย Loop Al 400 sq.mm. Bay-02 TP1 ออกเพื่อเตรียมปรับปรุงต่อไป
5. กำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 3 ในวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2565 โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วนของระบบ 115 kV และ 22 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้
 - 5.1 ดำเนินการสลับสาย control ระหว่างตู้ TCB1 กับ LRP2
 - 5.2 Pre-Commissioning Bay-02, 03
 - 5.3 Commissioning Bay-02, 03
 - 5.4 115 & 22 kV Function 50BF test
 - 5.5 Function Tie Bus YS-03

5.6 TP1 87T Stabilize test

5.7 87B Stabilize test

5.8 ทดสอบ AC Withstand ในส่วนของ 115 kV Switchyard Bay-02, 03 โดยเริ่มทดสอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ซึ่งรับไฟจาก Line 2 และสิ้นสุดวันทดสอบในวันที่ 24 ธันวาคม 2565

6. กำหนดทดสอบ End-to-End ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด point ในการทดสอบสอดคล้องตามแผนทดสอบ AC Withstand ตามข้อ 5.8

7. กำหนดแผน On job Training (OJT) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ให้ผู้รับจ้าง จัดส่งเอกสาร และรายละเอียดกำหนดการ ให้ กจค.1(บก2) เพื่อประสานงานแจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

8. ให้ผู้รับจ้าง จัดส่ง Switching Order ให้ กจค.1(บก2) เพื่อแจ้ง กทอ. ตรวจสอบเตรียมพร้อมทดสอบ AC Withstand Voltage Test ต่อไป .

9. หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบ AC Withstand Voltage Test เนื่องจากเหตุความไม่พร้อมใดๆจากส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ ผู้รับจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน ประสานงาน กพน.3 เพื่อดำเนินการทดสอบดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายพนิตย อารีรักษ์ ชผ.วฟ. กจค.1(บก2)

รับรองรายงานการประชุม นายเชิดพงศ์ ทองพุ หผ.วฟ. กจค.1(บก2)



เอกสารแนบ
รายละเอียดแผนงาน



แบบฟอร์มรับ - ส่งโทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้รับ.....นายเสกสรรค์ พุดประเสริฐ.....	ชื่อผู้ส่ง.....
ตำแหน่ง.....ผจก.คนจ.....	ตำแหน่ง.....
เลขที่.....ท.น.3.กปน.(คฟ) 4639/2565	วันที่.....14 ธ.ค. 2565

ข้อความ / เอกสารแนบ - แผ่น

ด้วย กปน.น.3 มีแผนงานดับไฟ 115 เควี สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ในวันที่ 20-27 ธ.ค. 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (ข้าม Peak) เพื่อให้บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอว์ล จำกัด ดำเนินการสลับสายคอลโทรระหว่างตู้ TCB1 และ LRP2 ,Precommissioning Bay-02,03 ,ทดสอบ 115&22 kV. Function 50BF Test ,Function Tie Bus YS-03 ,TP1 87T Stabilize Test และ 87B Stabilize Test รองรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตามหนังสือเลขที่ กจค.1(บก2)(วฟ.)-1909/2565 ลว. 9 ธ.ค. 2565 ทั้งนี้สามารถย้ายโหลดสถานีค่ายบางระจัน ไปรับการจ่ายไฟจาก สถานีข้างเคียงได้ทั้งหมดแต่จะมีผู้ใช้ไฟบางพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	พื้นที่ผลกระทบแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน	พื้นที่ไฟดับ
20-27 ธ.ค. 2565	อ.ค่ายบางระจันบางส่วน และโรงสีกวางเจริญ (แรงดันประมาณ 20.35-20.80 เควี) อ.บางระจันบางส่วน และ โรงน้ำแข็งโพธิ์หอม (แรงดันประมาณ 20.23-20.68 เควี)	-

กปน.น.3 ได้พิจารณาแล้วการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ไฟทราบว่าจะมีผลกระทบฯ ดังกล่าวในวันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 18.00 น. พร้อมทั้งประสานงานบริษัท VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบให้ปลดการเชื่อมต่อจากระบบตามวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ประสานงานกับ กฟจ.สิงห์บุรี(คุณอิศราฯ) และ กฟส.อ.ค่ายบางระจัน (คุณศุภชัยฯ) ทราบด้วยวาจาแล้วสำหรับรายละเอียดขั้นตอนการทำสวิตซึ่งจะจัดส่งให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายโสภณ แสงทอง)

ชก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3
14 ธ.ค. 2565

ที่ น.3 กปน.(คฟ.)- 4640 /2565

เรียน ผชก.(น3), อผ.ปบ.น.3, อผ.วบ.น.3

เพื่อโปรดทราบ

เรียน อก.จค.1(บก2), อก.กค.น.3, อก.บข.น.3, อก.ปบ.น.3(ผจฟ.1), อก.ปบ.ก.3, ผจก.สท.


เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดขั้นตอนสวิตซึ่งจะจัดส่งให้ต่อไป

(นายโสภณ แสงทอง)

ชก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3

14 ธ.ค. 2565

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

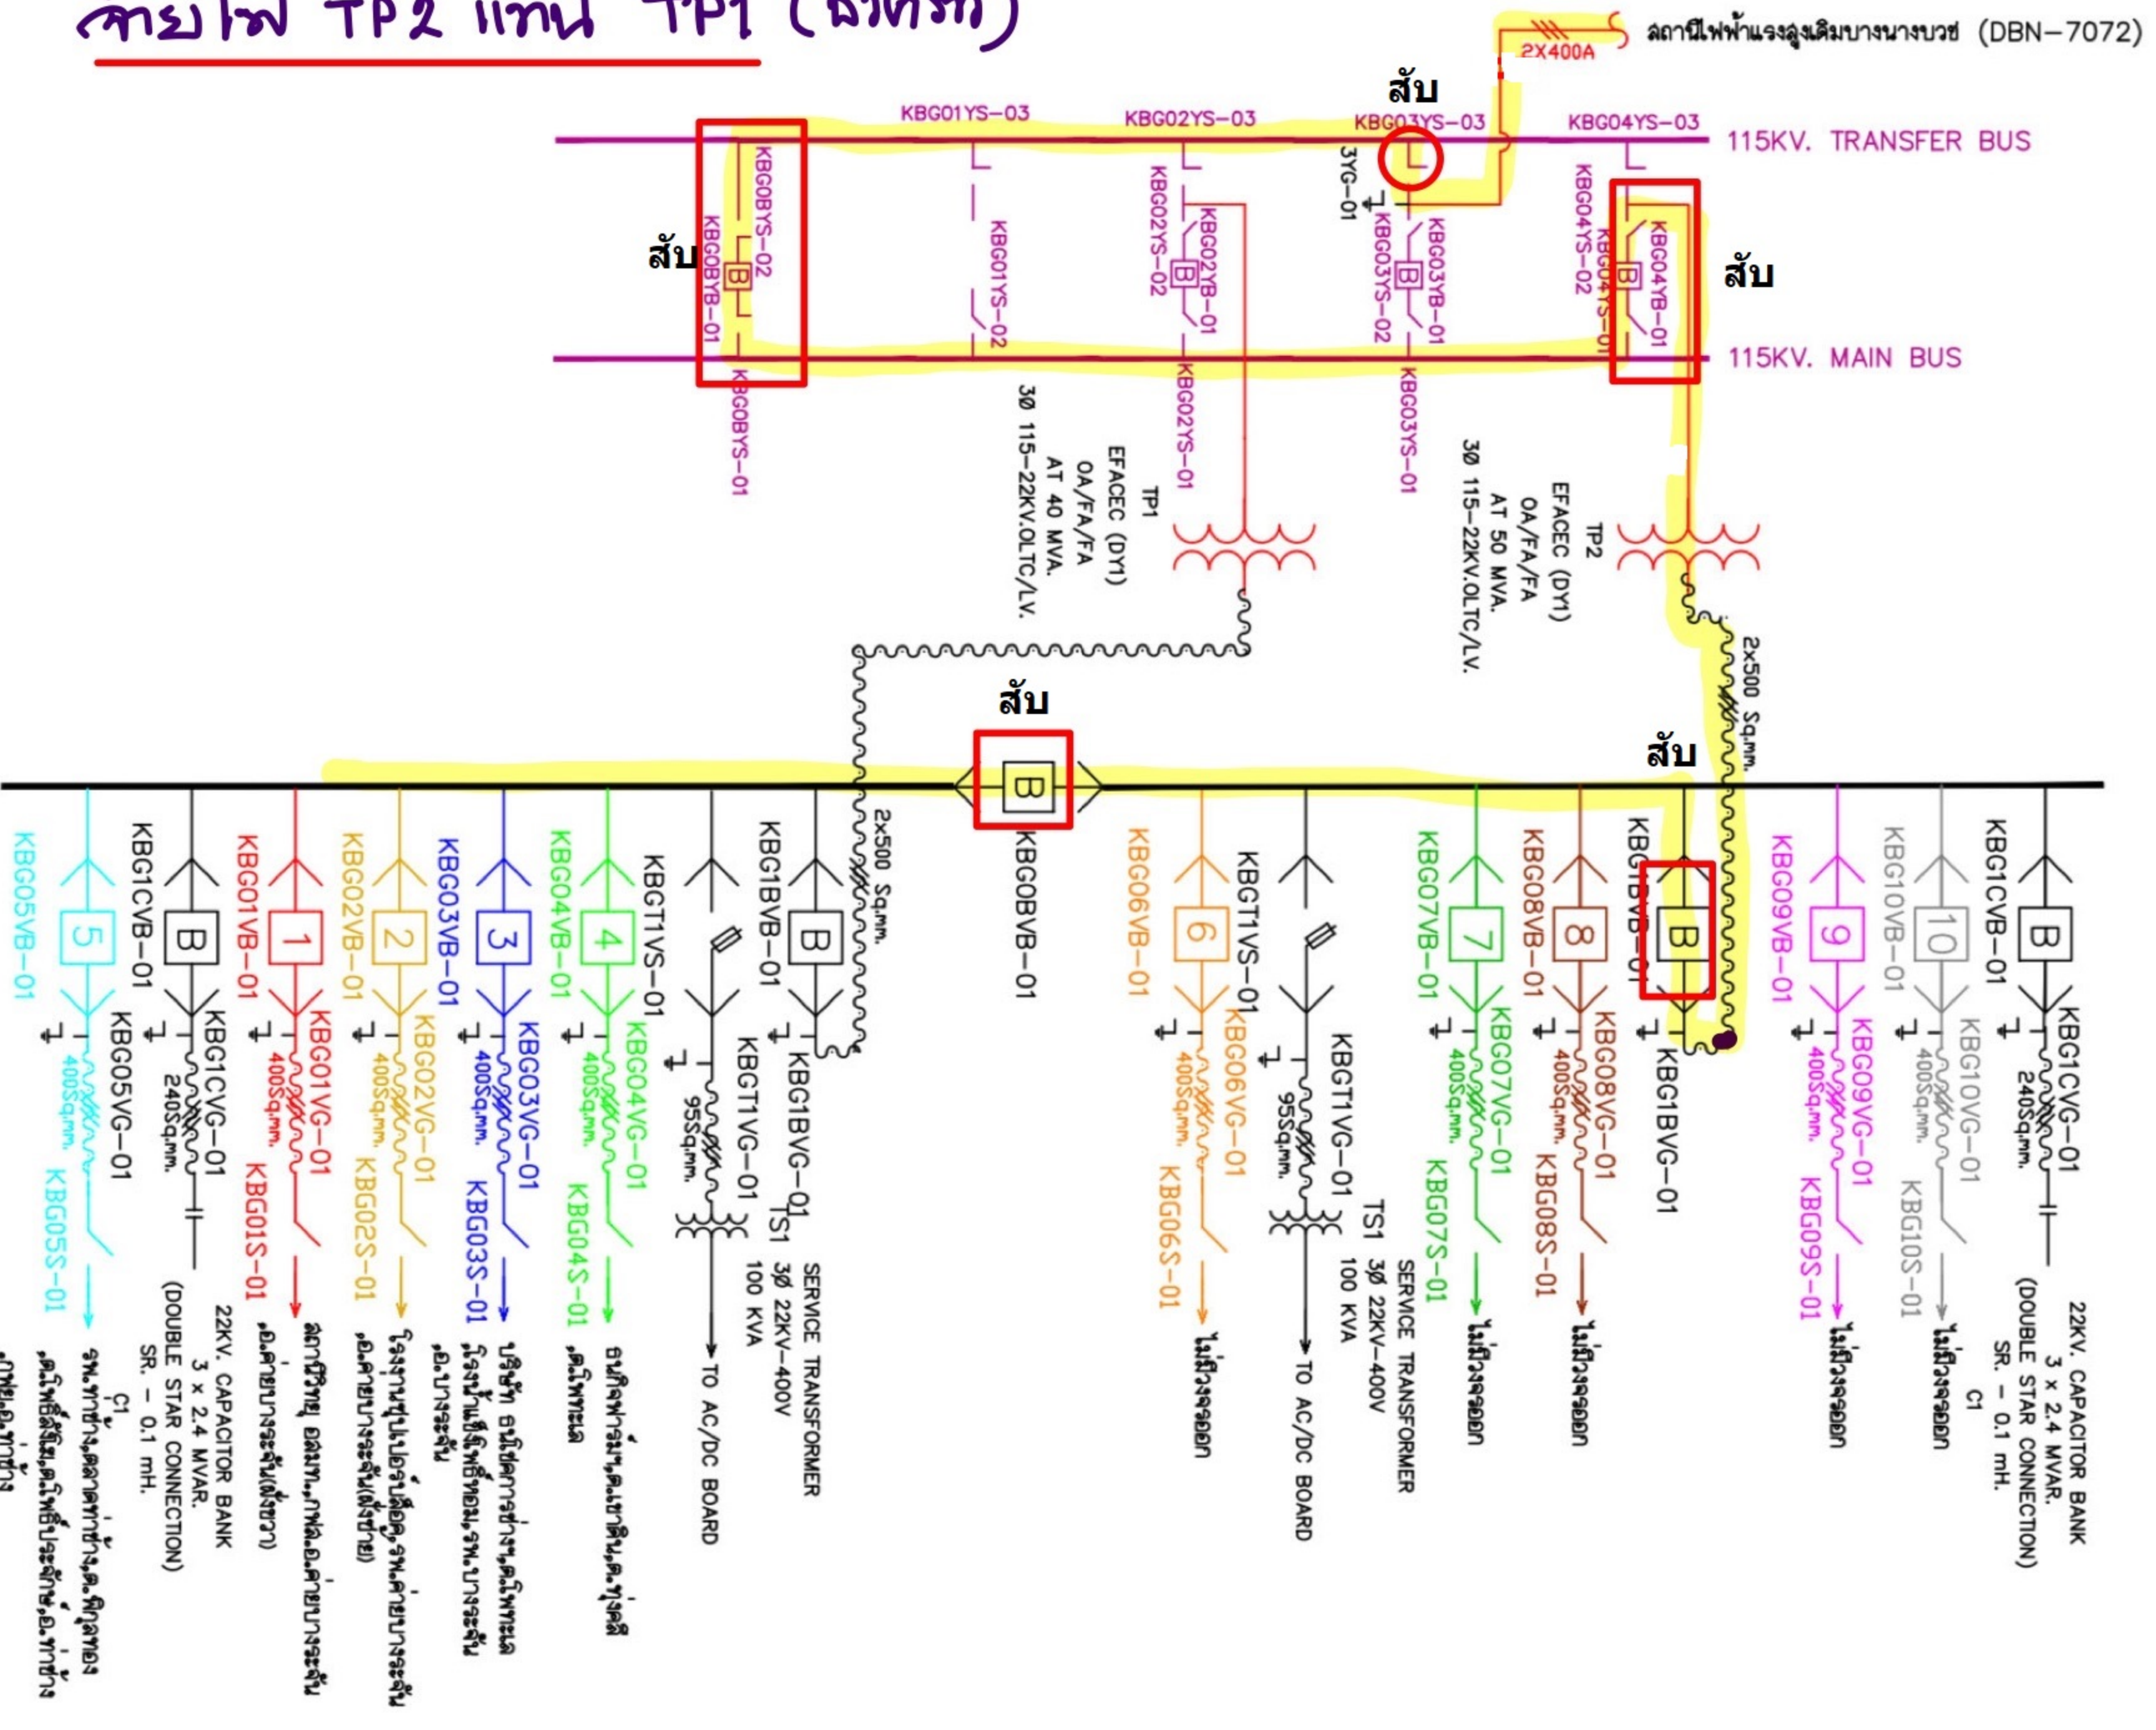

ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ด้วย								
ที่	แผนดำเนินการ			ดำเนินการจริง				หมายเหตุ
	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	
	ขั้นตอนสวิตชิงดับไฟสถานีจ่ายบางระจัน วันที่ 20 ธันวาคม 2565							
	ขั้นตอนนำโหลด KBG01 ไปฝาก SBA10 (โหลดรวม 4.5+3.1=7.7 MW.)							
1	OFF AUTO	KBG01VB-01	SCADA UP					
2	OFF AUTO	SBA10VB-01	SCADA UP					
3	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
4	สับ	SBA10S-08	SCADA UP					อสมท.
5	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
6	ปลด	KBG01VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
8	ปลด TRUCK	KBG01VB-01	สถานีฯคบจ.					
9	แขวนป้ายห้ามสับ KBG01VB-01		สถานีฯคบจ.					
10	ปลด	KBG01S-01	รถ.คบจ.					RISERPOLE
11	ON AUTO	SBA10VB-01	SCADA UP					
	ขั้นตอนนำโหลด KBG02 ไปฝาก SBA02 (โหลดรวม 4.8+3.3=8.1 MW.)							
1	OFF AUTO	KBG02VB-01	SCADA UP					
2	OFF AUTO	SBA02VB-01	SCADA UP					
3	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
4	สับ	SBA02S-07	SCADA UP					ตรงข้าม อสมท.
5	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
6	ปลด	KBG02VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
8	ปลด TRUCK	KBG02VB-01	สถานีฯคบจ.					
9	แขวนป้ายห้ามสับ KBG02VB-01		สถานีฯคบจ.					
10	ปลด	KBG02S-01	รถ คบจ.					RISERPOLE
11	ON AUTO	SBA02VB-01	SCADA UP					

สำหรับศูนย์ฯ ฝปบ.น.3

เตรียมการสวิตชิงโดย...นายธนาพร คำแถลง...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสวิตชิงโดย...นายภาณุพงศ์ วงษ์ตา...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

อนุมัติสวิตชิงโดย...นายโสภณ แสงทอง...ลงชื่อ...วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ด้วย								
ที่	แผนดำเนินการ			ดำเนินการจริง				หมายเหตุ
	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	
	ขั้นตอนนำโหลด KBG03 ไปฝาก SBA06 (โหลดรวม 6.1+1.1=7.2 MW.)							
1	OFF AUTO	KBG03VB-01	SCADA UP					
2	NON	SBA06R-01	SCADA UP					
3	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
4	สับ	KBG03S-08	รถ บรจ.					ไปรษณีย์
5	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
6	ปลด	KBG03VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
8	ปลด TRUCK	KBG03VB-01	สถานีฯคบจ.					
9	แขวนป้ายห้ามสับ KBG03VB-01		สถานีฯคบจ.					
10	ปลด	KBG03S-01	รถ คบจ.					RISERPOLE
11	NORMAL	SBA06R-01	SCADA UP					
	ขั้นตอนนำโหลด KBG04 ไปฝาก DBA08 (โหลดรวม 4.9+2.3=7.2 MW.)							
1	OFF AUTO	KBG04VB-01	SCADA UP					
2	OFF AUTO	DBA08VB-01	ก.3					
3	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
4	สับ	KBG04S-14	รถ คบจ.					วัดกาบบัว
5	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
6	ปลด	KBG04VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
8	ปลด TRUCK	KBG04VB-01	สถานีฯคบจ.					
9	แขวนป้ายห้ามสับ KBG04VB-01		สถานีฯคบจ.					
10	ปลด	KBG04S-01	รถ คบจ.					RISERPOLE
11	ON AUTO	DBA08VB-01	ก.3					

สำหรับศูนย์ฯ ฝปบ.น.3

เตรียมการสวิตชิงโดย...นายธนาพร คำแถลง...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสวิตชิงโดย...นายภาณุพงศ์ วงษ์ตา...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

อนุมัติสวิตชิงโดย...นายโสภณ แสงทอง...ลงชื่อ...วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ประชาชนพึงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ด้วย								
ที่	แผนดำเนินการ			ดำเนินการจริง				หมายเหตุ
	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	
	ขั้นตอนปลดเบรกเกอร์ระบบ 115 kV.							
1	ปลด	KBGBVB-01	SCADA UP					Tie bus
2	ปลด TRUCK	KBGBVB-01	สถานีฯคบจ.					
3	แขวนป้ายห้ามสับ KBGBVB-01		สถานีฯคบจ.					
4	ปลด	KBG02BVB-01	SCADA UP					Incoming2
5	ปลด TRUCK	KBG02BVB-01	สถานีฯคบจ.					
6	แขวนป้ายห้ามสับ KBG02BVB-01		สถานีฯคบจ.					
7	ปลด	KBG04YB-01	SCADA UP					
8	ปลด	KBG04YS-01	SCADA UP					
9	ปลด	KBG04YS-02	SCADA UP					
10	แขวนป้ายห้ามสับ KBG04YB-01		สถานีฯคบจ.					
11	OFF AUTO	DBN-7072	กฟผ.					
12	ปลด	KBGBYB-01	SCADA UP					
13	ปลด	KBGBYS-01	SCADA UP					
14	ปลด	KBGBYS-02	SCADA UP					
15	แขวนป้ายห้ามสับ KBGBYB-01		สถานีฯคบจ.					
16	ปลด	KBG03YS-03	SCADA UP					
17	HL.กระเช้า115 KV:ปลด TAKE OFF หน้าสถานีฯเสร็จแล้วแจ้งกลับ							
18	ON AUTO	DBN-7072	กฟผ.					
19	ทีมงานใช้ VOLTAGE DETECTOR ตรวจสอบแรงดันว่าไฟดับแล้ว							
20	ทีมงานช็อตกราวด์ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน							
21	ชื่อผู้ดำเนินการช็อตกราวด์.....เวลาที่ช็อตกราวด์.....น.							
	หมายเหตุ ช่วงเย็นหลังทีมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละวันสามารถจ่ายไฟขึ้น BUS ได้เพื่อให้มีไฟเลี้ยงในสถานีฯค่ายบางระจัน และช่วงเช้าก่อนที่จะปฏิบัติงานให้ปลดออก							

สำหรับศูนย์ฯ ฝปบ.น.3

เตรียมการสวิตชิงโดย.....นายธนาพร คำแดง.....ลงชื่อ.....วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสวิตชิงโดย.....นายภาณุพงศ์ วงษ์ตา.....ลงชื่อ.....วันที่ 14 ธันวาคม 2565

อนุมัติสวิตชิงโดย.....นายโสภณ แสงทอง.....ลงชื่อ.....วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กปบ.(คฟ.)-02/64 วันที่เริ่มใช้ 1 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ไฟทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ด้วย								
ที่	แผนดำเนินการ			ดำเนินการจริง				หมายเหตุ
	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	
	ขั้นตอนนำโหลด KBG04 คืบจาก DBA08							
1	OFF AUTO	DBA08VB-01	ก.3					
2	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
3	สับ	KBG04S-01	รถ คบจ.					RISERPOLE
4	ปลดป้ายห้ามสับ KBG04VB-01	สถานีฯคจ.						
5	สับ TRUCK	KBG04VB-01	สถานีฯคจ.					
6	สับ	KBG04VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
8	ปลด	KBG04S-14	รถ คจ.					วัดกาบบัว
9	เช็คโหลด KBG04=_____MW.,DBA08=_____MW.							
10	ON AUTO	KBG04VB-01	SCADA UP					
11	ON AUTO	DBA08VB-01	ก.3					
	ขั้นตอนนำโหลด KBG03 คืบจาก SBA06							
1	NON	SBA06R-01	SCADA UP					
2	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
3	สับ	KBG03S-01	รถ คจ.					RISERPOLE
4	ปลดป้ายห้ามสับ KBG03VB-01	สถานีฯคจ.						
5	สับ TRUCK	KBG03VB-01	สถานีฯคจ.					
6	สับ	KBG03VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
8	ปลด	KBG03S-08	รถ บจ.					ไปรษณีย์
9	เช็คโหลด KBG03=_____MW.,SBA06=_____MW.							
10	ON AUTO	KBG03VB-01	SCADA UP					
11	NORMAL	SBA06R-01	SCADA UP					

สำหรับศูนย์ฯ ฟปบ.น.3

เตรียมการสวิตชิงโดย...นายธนาพร คำแถลง...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสวิตชิงโดย...นายภาณุพงศ์ วงษ์ตา...ลงชื่อ...วันที่ 14 ธันวาคม 2565

อนุมัติสวิตชิงโดย...นายโสภณ แสงทอง...ลงชื่อ...วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบในการดับไฟ/ถ่ายเทโหลดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ด้วย								
ที่	แผนดำเนินการ			ดำเนินการจริง				หมายเหตุ
	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	เวลา	ปลด/สับ	รหัสอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ	
	ขั้นตอนนำโหลด KBG02 คืบจาก SBA02							
1	OFF AUTO	SBA02VB-01	SCADA UP					
2	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
3	สับ	KBG02S-01	รถ คบจ.					RISERPOLE
4	ปลดป้ายห้ามสับ KBG02VB-01	สถานีฯคบจ.						
5	สับ TRUCK	KBG02VB-01	สถานีฯคบจ.					
6	สับ	KBG02VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
8	ปลด	SBA02S-07	SCADA UP					ตรงข้าม อสมท.
9	เช็คโหลด KBG02=_____MW.,SBA02=_____MW.							
10	ON AUTO	KBG02VB-01	SCADA UP					
11	ON AUTO	SBA02VB-01	SCADA UP					
	ขั้นตอนนำโหลด KBG01 คืบจาก SBA10							
1	OFF AUTO	SBA10VB-01	SCADA UP					
2	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
3	สับ	KBG01S-01	รถ.คบจ.					RISERPOLE
4	ปลดป้ายห้ามสับ KBG01VB-01	สถานีฯคบจ.						
5	สับ TRUCK	KBG01VB-01	สถานีฯคบจ.					
6	สับ	KBG01VB-01	SCADA UP					
7	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
8	ปลด	SBA10S-08	SCADA UP					อสมท.
9	เช็คโหลด KBG01=_____MW.,SBA10=_____MW.							
10	ON AUTO	KBG01VB-01	SCADA UP					
11	ON AUTO	SBA10VB-01	SCADA UP					

สำหรับศูนย์ฯ ฝปบ.น.3

เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนาพร คำแถลง ลงชื่อ _____ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสวิตชิงโดย นายภาณุพงศ์ วงษ์ตา ลงชื่อ _____ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

อนุมัติสวิตชิงโดย นายโสภณ แสงทอง ลงชื่อ _____ วันที่ 15 ธันวาคม 2565
