



14 ก.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๖๓๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน.....เปลี่ยนจุดเชื่อมสายเข้าวงจรใหม่รองรับการจ่ายไฟ สค.๑๐  
จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๐ SMV	๑๕ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงาน กฟอ.กทบ. และ ชุดฮอตไลน์กระเช้า กฟอ.กทบ. ติดตั้ง SF๖ ใหม่ รองรับการจ่ายไฟ สถานีฯ สค.๑๐ ถาวร	จุดเชื่อมสาย DDE.๑ ฝั่งตรงข้าม DIS KTE ๕S-๑๓	จุดเชื่อมสาย DDE.๒ หลัง DIS KTE ๕S-๑๓	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ หม.ปบ.กฟอ.กทบ. ๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสมชาย มาบัณฑิตย์.....ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายอารุณ จรดล )

ตำแหน่งรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KTE10 จาก DDE. ๑ ถึง DDE. 2  
ในวันที่ 15 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1092/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

( นายสิริภัทร โพธิ์พันธ์ )

อก.๔ 11คน นผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจพ. (สถานีฯ) -

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล (KTE10)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1092/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์				วันที่	14 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
4	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
5	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTE05						
7	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE	-	ขนานบัส
8	SMJ10S-04	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ย้ายชอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล(บ่อขยะ)
9	SMJ05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ย้ายชอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล(คลองแนว)
10	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	แจ้ง HotLine ปลดสายบริเวณ DDE.1 (ตามผังแนบ) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
13	เมื่อ HotLine ปลดสายบริเวณ DDE.1 (ตามผังแนบ) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้ง HotLine ปลดสายบริเวณ DDE.2 (ตามผังแนบ) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
15	เมื่อ HotLine ปลดสายบริเวณ DDE.2 (ตามผังแนบ) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
21	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
22	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
23	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
24	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE			
28	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
29	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G1							
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G2							
32	แจ้ง กฟอ.กทบ. ตรวจสอบ SF6 (ติดตั้งใหม่)บริเวณปากซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล(ริมคลองแนว) รหัส SMJ05S-05 อยู่ตำแหน่ง OPEN+LOCK							
33	แจ้ง HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE.2 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส							
34	เมื่อ HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE.2 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
35	แจ้ง HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE.1 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส							
36	เมื่อ HotLine เชื่อมสายบริเวณ DDE.1 (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
37	ย้ายโหนด KTE10 บางส่วน คีนจาก KTE05							
38	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		-	ขนานบัส
39	SMJ05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6	ย้ายขอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล(คลองแนว)
40	SMJ10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ย้ายขอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล(บ่อขยะ)
41	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		-	ขนานบัส
42	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
43	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
44	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
45	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณปากซอยที่ดินจัดสรรนาย สุรพล (ริมคลองแนว)  
เพื่อให้ชุดงาน กฟอ.กทบ. และชุดขอทไล่น้กระเข้า กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน DIS

รองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ถาวร  
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

F.5 KTE

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

DIS  
KTE 05S-12 (เก่า)  
SMJ 10S-04 (ใหม่)  
ปลด

ท้ายซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล (บ่อขยะ)

DIS  
KTE 05S-13 (เก่า)  
SMJ 05S-05 (ใหม่)  
ดับ


ปากซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล (ริมคลองแนว)

F.10 KTE

F.10 KTE

แผนผังปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณปากซอยที่ดินจัดสรรนาย สุรพล (ริมคลองแนว)  
เพื่อให้ชุดงาน กฟอ.กทบ. และชุดออกทีไลน์กระเช้า กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน DIS

รองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ตาราง  
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

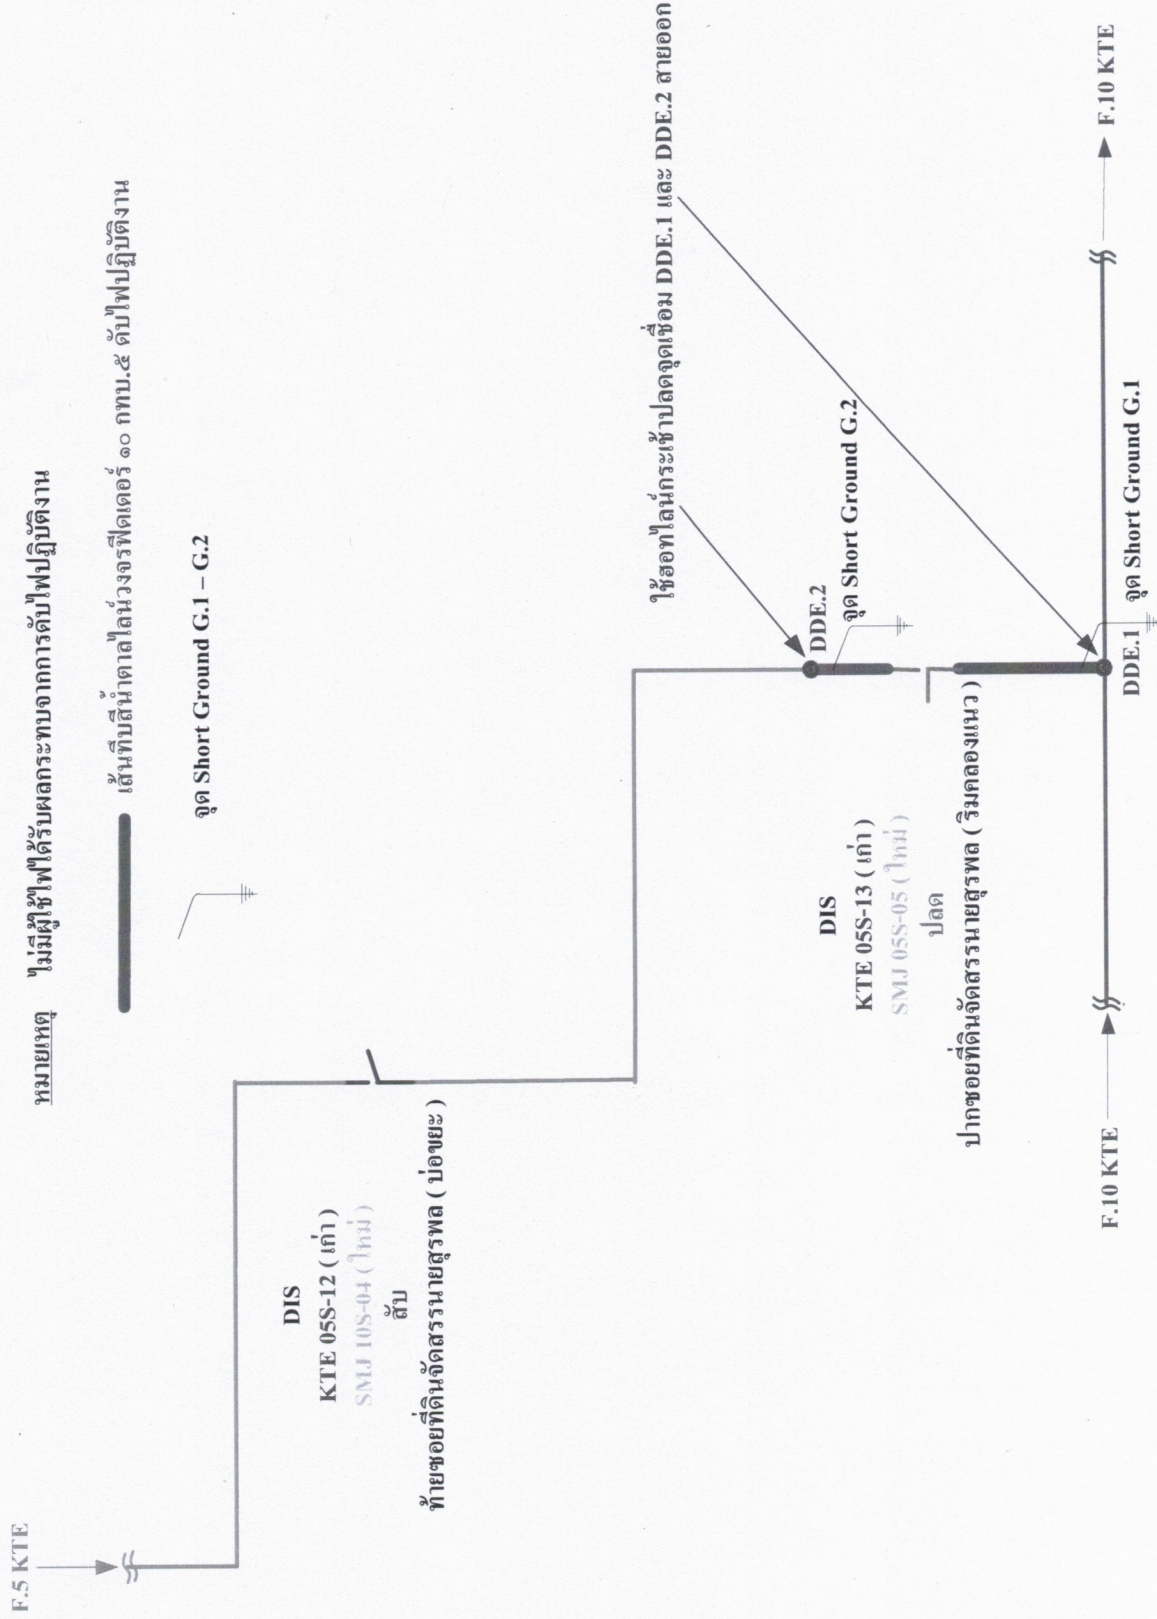

หมายเหตุ ไม่มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

เส้นทึบสีน้ำตาล ไลน์วงจรที่ตัดเตอร์ ๑๐ กทบ.๕ ดับไฟปฏิบัติงาน

แผนผังปัจจุบัน หลังจ่ายไฟคืนระบบปกติ บริเวณปากซอยที่ดินจัดสรรนาย สุรพล (ริมคลองแนว)

เพื่อให้ชุดงาน กฟอ.กทบ. และชุดหอทดัดกระแสเข้า กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน DIS

รองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ถาวร

วันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

F.5 KTE



DIS  
KTE 05S-12 (เก่า)  
SMJ 10S-04 (ใหม่)  
ปลด

ท้ายซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล (บ่อขยะ)

SF6  
KTE 05S-13 (เก่า)  
SMJ 05S-05 (ใหม่)  
ON



ปากซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล (ริมคลองแนว)

F.10 KTE



F.10 KTE
