



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๘๗๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ควรประกอบกิจ

Switching Deadline

8 ส.ค. 66

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาหมอ ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวบริเวณบ้านบางแม่หม้าย ที่ DIS ชั่วคราว จุด A ถึง DIS ชั่วคราวจุด B วงจร BAM07R-01 รีโอสเซอร์วัดขุนไกร สถานีไฟฟ้าบางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๗	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว บริเวณบ้านบางแม่หม้าย	DIS ชั่วคราว จุด A	DIS ชั่วคราว จุด B	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านบางแม่หม้าย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐-๘๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาสวัต ควรประกอบกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM07 จาก Dis ชั่ว. จุด A ถึง Dis ชั่ว. จุด B
ในวันที่ 11 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1166/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ พชรสุวรรณชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

(นายศาสวัต ควรประกอบกิจ)
จุดก.๔ 1 กษ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. บปม., กฟส. สบพ., กฟช. บลว
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านบางแม่หม้าย (BAM07)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	14.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1166/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์				วันที่	30 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	30 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
3	BAM7R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		
4	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		
6	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		
7	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN10						
8	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
9	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคนโพธิ์
10	DIS ชค. BAM07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS จุด B
11	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 โคนโพธิ์
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น. (พื้นที่ดับไฟ ไม่มีผู้ใช้ไฟ)						
13	DIS ชค. BAM07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS จุด A
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
19	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
20	BAM7R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		
21	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
22	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		
23	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟอ.บปม. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
26	BAM7R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
28	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.			
29	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.			
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G1							
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G2							
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
33	DIS ชค. BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS	จุด A
34	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN10							
35	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
36	DIS ชค. BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS	จุด B
37	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
38	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
39	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM			
40	BAM7R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
41	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
42	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.			
43	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.			
	<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงช่วงบริเวณบ้านบางแม่หม้าย ที่ DIS ชั่วคราวจุด A ถึง DIS ชั่วคราวจุด B งบร BAM07R-01 วิศวกรผู้ควบคุมการ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

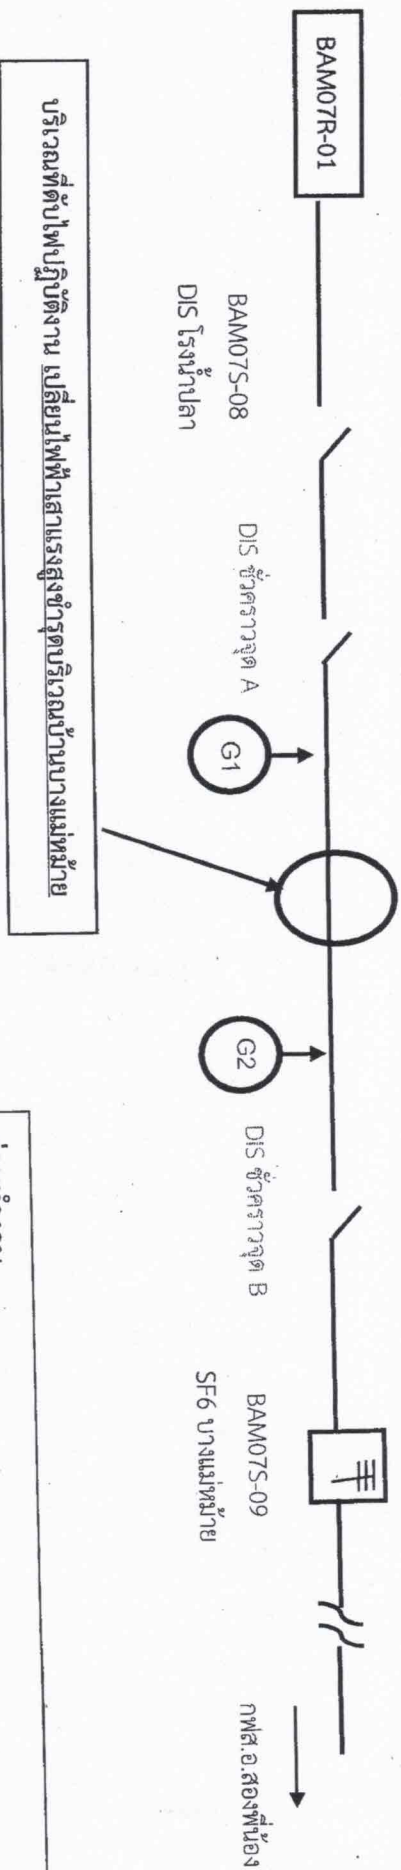

- ก่อนทำงาน**
1. สับ BAM07S-09
 2. ปิด DIS ชั่วคราวจุด A
 3. ปิด DIS ชั่วคราวจุด B
 4. ช้อตกราวด์ แรงสูง จุด G1,G2
 5. เปลี่ยนเสาแรงสูงช่วงบริเวณบ้านบางแม่หม้าย
- หลังทำงานแล้วเสร็จ**
1. ปิด ช้อตกราวด์ แรงสูง จุด G1,G2
 2. สับ DIS ชั่วคราวจุด A
 3. สับ DIS ชั่วคราวจุด B
 4. ปิด BAM07S-09

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
