



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๕๗๖ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง ๒๒ kv และอุปกรณ์หัวเสา บริเวณ
ตลาดบางหลวง ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV(BEA4Y)	23 ก.ค.65	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง ๒๒ kv.และอุปกรณ์หัวเสา	สถานีบางเลน	BEA4YS-05 BEA4YS-10	นายบสุรชัย ไทรเมือง พงช.6 ผกส.
2.	SPN4	23 ก.ค.65	08.00 น.	17.00 น.		DIS ชั่วคราวตรง ตรงข้ามวัดบาง น้อยโน	SPN4S-05 BEA4S-07	
3.	SPN9	23 ก.ค.65	08.00 น.	17.00 น.		DISชั่วคราว สะพานบางน้อย โน	SPN9S-05 SPN9S-07 SPN4S-10	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) -ตลาดบางหลวงฝั่งตะวันตก วัดบางหลวง อบต.บางหลวง ไทรอวลวย

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ขณ.ปบ. โทร ๐๘๑-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

BEA4YS-06, BEA4YS-09

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 จาก BEA4YS-01 ถึง BEA4YS-05, BEA4YS-10

ในวันที่ 23.07.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1183/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPN04 จาก DIS ชั่วคราว ถึง SPN4S-05, SPN4S-07

ในวันที่ 23.07.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SPN04 DIS ชั่วคราว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SPN09 จาก DIS ชั่วคราว ถึง SPN9S-05, SPN9S-07,

ในวันที่ 23.07.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ SPN09 DIS ชั่วคราว

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิทย์ ธีระประศาสน์ ประสานงานขอตัดไฟกับ วัฒนวิทย์ ธีระประศาสน์ ๐๐๖๖๖๖๖๖๖๖

16.9.65

วัฒนวิทย์ ธีระประศาสน์
0๘๑-๖๓๒๒๖๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), ๐๑-๖๖.(๑๑)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี ๒๐๑๒๔๗)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดบางหลวง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 65	เวลา	08.00 น. ถึง	23 ก.ค. 65	เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา 22 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1183/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีชนะ				วันที่	19 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SPN04 ไปรับไฟจากวงจร SPN05						
3	SPN04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 1.3 MW
4	SPN05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 3.3 MW
5	SPN04S-12	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บลง.		SF6 ป้อมตำรวจ
6	SPN04S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ปากทาง ม.4 บางหลวง
7	SPN05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
8	ย้ายโหลด วงจร SPN09 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร BEA03						
9	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- 11.7 MW
10	SPN09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 1.3 MW
11	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- 6.9 MW
12	BEA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- 1.3 MW (-7.7 MW)
13	BEA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- 4.8 MW
14	BEA03S-11	ปลด	ล๊ับ		บลง.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
15	BEA04S-07	ปลด	ล๊ับ		บล.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
16	SPN09S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สะพานคลองบางหลวง
17	BEA04S-07	ล๊ับ	ปลด		บล.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
18	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
19	BEA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- -
20	BEA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- -
21	ย้ายโหลด วงจร SPN09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KSA09						
22	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- 20 MW
23	SPO02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- 0.6 MW
24	SPN02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 0.7 MW
25	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- 25.9 MW
26	KSA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- 4 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R(REC) บ้านท่าเสา
28	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพท.		SF6(RCS) โรงสีสุรชัย
29	SPO02VB-01	สับ	ปลด		SPO		- -
30	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.		SF6(RCS) บ้านท่าเสา (ล่าง)
31	KSA09S-14	ปลด	สับ		กพส.		SF6(RCS) ไม้คอกเนื้อ
32	SPN09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลจ.		DIS หลัง CJ
33	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.		SF6(RCS) บ้านท่าเสา (ล่าง)
34	SPO02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPO		- -
35	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพท.		SF6(RCS) โรงสีสุรชัย
36	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
37	SPO02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
38	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
39	SPN02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
40	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	KSA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
42	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R(REC) บ้านท่าเสา
43	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
44	แจ้ง กพท.บางหลวง ประสาน VSPP 115 เควี บริษัท ยันฮีโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการไพรณลอย) ให้ทำการปลดขนานจากระบบ กพท.						
45	ตรวจสอบระบบ 115 เควี (สถานีฯ ไทรน้อย - บางเลน - ไทรนอย - ไทรหลวง - สองพี่น้อง 1 - ไทรเขี้ยว - ลาดบัวหลวง) จ่ายไฟ Closed Loop						
46	BEA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	2SCL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	2SLU01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	2SLU02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	2SCL02YB-01	สับ	ปลด		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	2SCL02YS-01	สับ	ปลด		2SCL		- ไขมิด 115 เควี
52	2SCL02YS-02	สับ	ปลด		2SCL		- ไขมิด 115 เควี
53	2SLU02YB-01	สับ	ปลด		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	2SLU01YB-01	สับ	ปลด		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	2SLU01YS-01	สับ	ปลด		2SLU		- ไขมิด 115 เควี
56	2SLU01YS-02	สับ	ปลด		2SLU		- ไขมิด 115 เควี
57	2SLU02YS-01	สับ	ปลด		2SLU		- ไขมิด 115 เควี
58	2SLU02YS-02	สับ	ปลด		2SLU		- ไขมิด 115 เควี
59	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ไขมิด 115 เควี
61	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ไขมิด 115 เควี
62	BEA04YS-07	สับ ฝึกอบรม	ปลด ฝึกอบรม		บลจ.		ABS หน้าบ.ไพรณลอย
63	BEA04YS-08	สับ ฝึกอบรม	ปลด ฝึกอบรม		บลจ.		ABS หน้าบ.ไพรณลอย
64	BEA04YS-06	สับ ฝึกอบรม	ปลด ฝึกอบรม		บลจ.		ปากทางไพรณลอย


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	BEA04YS-09	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS ข้าง CJ
66	BEA04YS-10	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS หน้าบ.ไทรหลวง
67	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-05 โครงการไทรหลวง อยู่สถานะปลดพร้อมล็อคกุญแจ						
68	ดิสชั่วคราว วงจร SPN04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดบางน้อยใน
69	ดิสชั่วคราว วงจร SPN09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สะพานบางน้อยใน
70	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.บล. ทราบ						
71	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
72	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
73	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G5						
74	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G6						
75	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
76	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
77	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
78	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
79	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
80	แจ้ง กฟอ.บล. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
81	SPN04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
82	SPN09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
83	เมื่อ กฟอ.บล. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
84	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
85	SPN04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- -
86	SPN09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- -
87	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G1						
88	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G2						
89	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
90	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G3						
91	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G4						
92	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G5						
93	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G6						
94	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
95	เมื่อ กฟอ.บล. ทำการลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
96	ดิสชั่วคราว วงจร SPN04	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดบางน้อยใน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	ดีสชั่วคราว วงจร SPN09	ปลด	สับ		บลง.		DIS สะพานบางน้อยใน
98	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
99	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
100	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	BEA04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS ปากทางไทรผลวย
102	BEA04YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS ช้าง CJ
103	BEA04YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS หน้าบ.ไทรผลวย
104	BEA04YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS หน้าบ.ไทรผลวย
105	2SLU01YS-01	ปลด	สับ		2SLU		- ไบมีด 115 เควี
106	2SLU01YS-02	ปลด	สับ		2SLU		- ไบมีด 115 เควี
107	2SLU02YS-01	ปลด	สับ		2SLU		- ไบมีด 115 เควี
108	2SLU01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	2SLU02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	2SLU02YS-02	ปลด	สับ		2SLU		- ไบมีด 115 เควี
111	BEA04YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS หน้าบ.ไทรหลวง
112	2SCL02YS-01	ปลด	สับ		2SCL		- ไบมีด 115 เควี
113	2SCL02YS-02	ปลด	สับ		2SCL		- ไบมีด 115 เควี
114	2SCL02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
115	BEA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	2SCL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		2SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
117	2SLU01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
118	2SLU02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		2SLU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
119	แจ้ง กพย.บางหลวง ประสาน VSPP 115 เควี บริษัท ยันฮีโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการไทรผลวย) ให้ทำการขนาน เข้าระบบ กพภ. ได้						
120	ทำการปลดล็อคกุญแจ Load Break Switch 115 เควี รหัส BEA04YS-05 โครงการไทรหลวง						
121	ย้ายโหนด วงจร SPN09 กลับจากวงจร KSA09						
122	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- 8.2 MW
123	SPO02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- 9.9 MW
124	SPN02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- 9.9 MW
125	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
126	KSA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- -
127	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R(REC) บ้านท่าเสา
128	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพท.		SF6(RCS) โรงสีสุรชัย
129	SPO02VB-01	สับ	ปลด		SPO		- -
130	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.		SF6(RCS) บ้านท่าเสา (ล่าง)
131	SPN09S-07	ปลด	สับ		บลง.		DIS หลัง CJ
132	KSA09S-14	สับ	ปลด		กพส.		SF6(RCS) ฝั่คอกเนื้อ
133	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.		SF6(RCS) บ้านท่าเสา (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
134	SPO02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPO		- -
135	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพท.		SF6(RCS) โรงสีสุราษฎร์
136	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
137	SPO02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
138	SPN02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
139	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
140	KSA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
141	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R(REC) บ้านท่าเสา
142	ย้ายโหลด วงจร SPN09 กลับจาก วงจร BEA03						
143	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
144	BEA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- -
145	BEA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BEA		- -
146	BEA04S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
147	SPN09S-05	ปลด	สับ		บลง.		DIS สะพานคลองบางหลวง
148	BEA04S-07	สับ	ปลด		บล.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
149	BEA03S-11	สับ	ปลด		บลง.		SF6(RCS) อนามัยหินมูล
150	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
151	SPN09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
152	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
153	BEA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- -
154	BEA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BEA		- -
155	ย้ายโหลด วงจร SPN04 ไปรับไฟจากวงจร SPN05						
156	SPN04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- -
157	SPN05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPN		- -
158	SPN04S-05	ปลด	สับ		บลง.		DIS ปากทาง ม.4 บางหลวง
159	SPN04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.		SF6 ป้อมตำรวจ
160	SPN04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
161	SPN05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPN		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

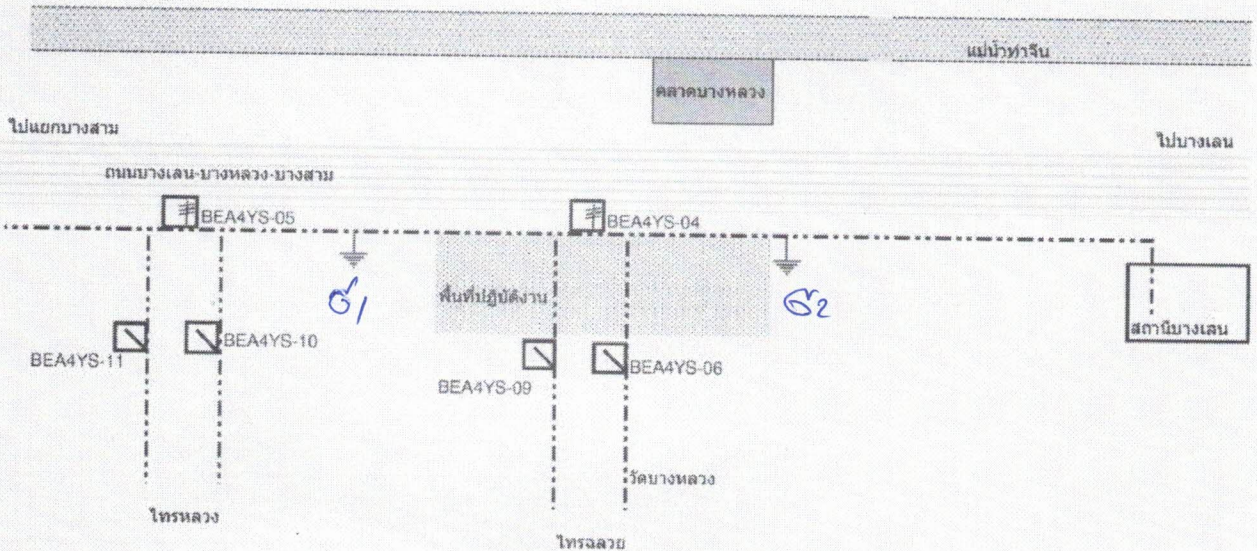

ผังดับไฟ ระบบ 115 kV. วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ตลาดบางหลวง

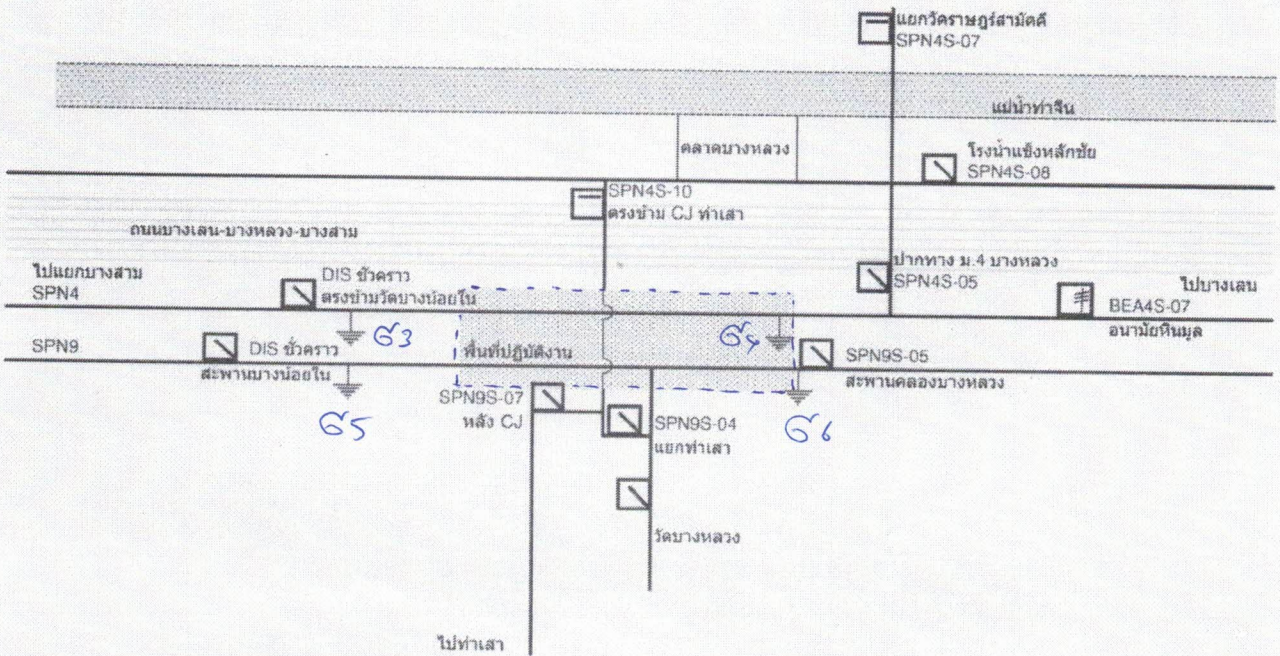

ผังดับไฟ 22 kV. วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ตลาดบางหลวง
