



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๓ .....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทิตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ค. 65

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สพ.	30/07/65	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง 185ค.ม.ม.	DDE ร.ร.ทรน อินน์	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ2	โทร.๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	8 สพ.	31/07/65	08.00	17.00	ย้ายเสาแรงสูงต้นDDEวัดกุฎี ทอง	DDEก่อนวัดกุฎี ทอง	Disชั่วคราววัด ราชา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พช.๒ (สช.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SP48 จาก DDE ก่อนวัดกุฎีทอง ถึง DU อิมบิลจิสราศ

ในวันที่ 31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1225/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

29 ๗ 65

อภ.ปบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.กฟ.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 ..... แผน

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผน



ผจก. (.....) (.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	DDE ก่อนวัดกุกฎทอง- Dis ชั่วคราววัดราชาฯ							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	31 ก.ค. 65	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูงต้น DDE			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1225/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทองย้อย					วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
3	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
4	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
5	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
6	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
7	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
8	*ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01*							
9	BAM01S-12	ปลด	ล๊ับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
10	BAM02S-12	ปลด	ล๊ับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
11	DIS ชั่วคราว SPA08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	วัดราชาฯ
12	BAM01S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
14	แจ้งกฟจ.สพ. โหลดโหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DDE ก่อนวัดกุกฎทอง- Dis ชั่วคราววัดราชาฯ ออก							
15	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณก่อนวัดกุกฎทอง วงจร SPA08 ได้ (ตามผังแนบ)							
16	หลังจาก ชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณก่อนวัดกุกฎทอง วงจร SPA08 (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ							
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
20	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
22	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
24	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
25	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
26	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
27	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
28	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหดกลับ							
29	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
30	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
31	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
32	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
33	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
34	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
37	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
38	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณก่อนวัดกฏิทอง วงจร SPA08 ได้ (ตามผังแนบ)							
39	หลังจาก ชุดขอทไลน์ทำการเชื่อมDDE บริเวณก่อนวัดกฏิทอง วงจร SPA08 (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ							
40	แจ้งกฟพ.สพ.นำโหดหม้อแปลง ตั้งแต่ DDE ก่อนวัดกฏิทอง- Dis ชั่วคราววัดราชาฯ กลับคืน							
41	*ย้ายโหด SPA08 บางส่วนกลับคืนจาก BAM01*							
42	BAM01S-12	ปลด	ลับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
43	DIS ชั่วคราว SPA08	ปลด	ลับ		สพ.		DIS	วัดราชาฯ
44	BAM02S-12	ลับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
45	BAM01S-12	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
46	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
47	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
48	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
49	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
50	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
51	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๓๑ ก.ค.๖๕ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... ก่อนประชุมประตูวัดกุฎีทอง-ดิสชั่วคราววัดราชาฯ เพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูงดันDDEวัดกุฎีทอง โดยมีรายละเอียดที่ติดเคอร์รี่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์รี่..๘..สถานี...สุพรรณบุรี...ตั้งแต่บริเวณ.. DDEก่อนประชุมประตูวัดกุฎีทอง-DISชั่วคราววัดราชาฯ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิกร ตำแหน่ง ผ.ก.ส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

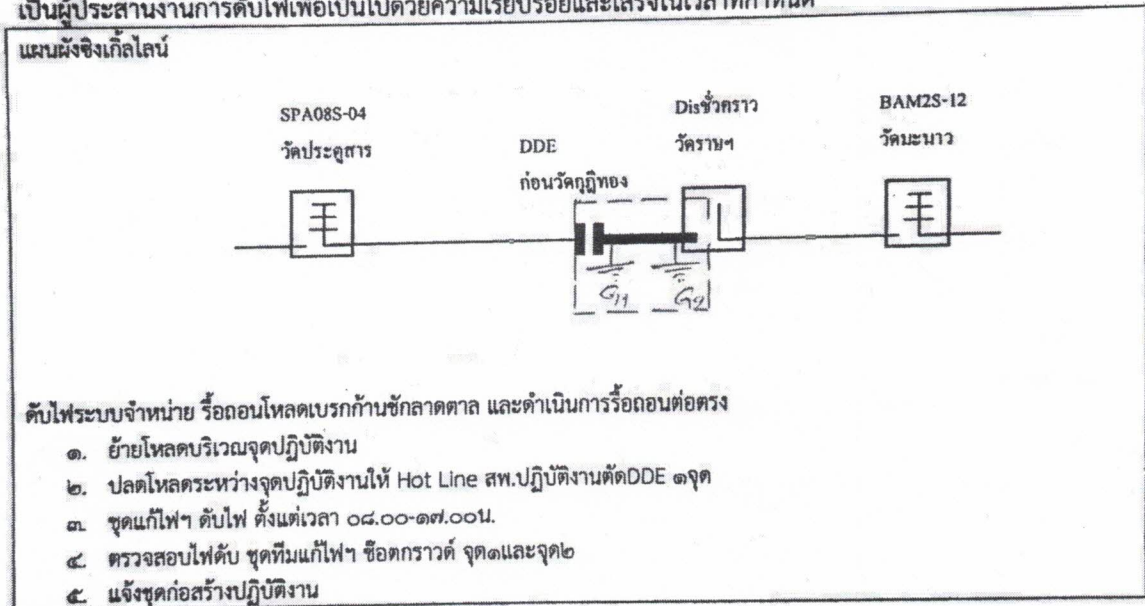

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พงง.บ(สข.)ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๕๘๕๕ , ๑๕๘๖๐
