

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ.๑๗๓๖ ๑๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กาญจนบุรี

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF ๖ แทน DIS...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี
๑.๓... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๗ / กจ.๑	๑๖ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๗S-๐๔ กาญจนบุรีวิลล่า	-	นายไชยยศ ไม้ล้อม โทร ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘
๒.	F๙ / กจ.๓	๑๖ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCC ๙S-๐๓ ร้านปาล์มทางรถไฟ	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไม้ล้อม.....ตำแหน่ง..... พงษ.๖.....โทร.....๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย...)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.เมืองกาญจนบุรี.....

๑๐ กย ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KCA 7 จาก KCA 7 S - 04 ถึง
ในวันที่ 16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1331/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KCC 9 จาก KCC 9 S - 03 ถึง
ในวันที่ 16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กิ่งประสูติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ
11 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายไชยยศ ไม้ล้อม)
๑๐.๙.๖๗

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KCA07S-04 กาญจนบุรีวิลล่า , SF6 KCC09S-03 ร้านปาล์มทางรถไฟ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1331/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม			วันที่	12 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิววัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ :: เปลี่ยน DIS เป็น SF6 KCA07S-04 กาญจนบุรีวิลล่า						
3	:: เปลี่ยน DIS เป็น SF6 KCC09S-03 ร้านปาล์มทางรถไฟ						
4	* เปลี่ยนที่ DIS KCA07S-04 กาญจนบุรีวิลล่า *						
5	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- LOAD 3.9 MW
6	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- LOAD 4.1 MW
7	- ย้ายโหลด KCA 7 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 6						
8	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
9	KCA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS กาญจนบุรีวิลล่า
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	ขณะปฏิบัติงาน ให้ "OFF" Auto Reclose KCA6VB-01 และ KCA7VB-01 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบสถานะ SF6 KCA 7S-04 สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
15	- ย้ายโหลด KCA 7 บางส่วน กลับจาก KCA 6						
16	KCA07S-04	ปลด	สับ		กจ.		SF6 กาญจนบุรีวิลล่า
17	KCA06S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
18	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
19	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
20	* เปลี่ยนที่ DIS KCC09S-03 ร้านปาล์มทางรถไฟ *						
21	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- LOAD 3.9 MW
22	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- LOAD 2.4 MW
23	- ย้ายโหลด KCC9 บางส่วนไปจ่ายจาก KCC 7						
24	KCC07S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS หลังโรงแรมเฟลิกซ์
25	KCC09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ร้านปาล์มทางรถไฟ
26	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
27	ขณะปฏิบัติงาน ให้ "OFF" Auto Reclose KCC7VB-01 และ KCC9VB-01 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						

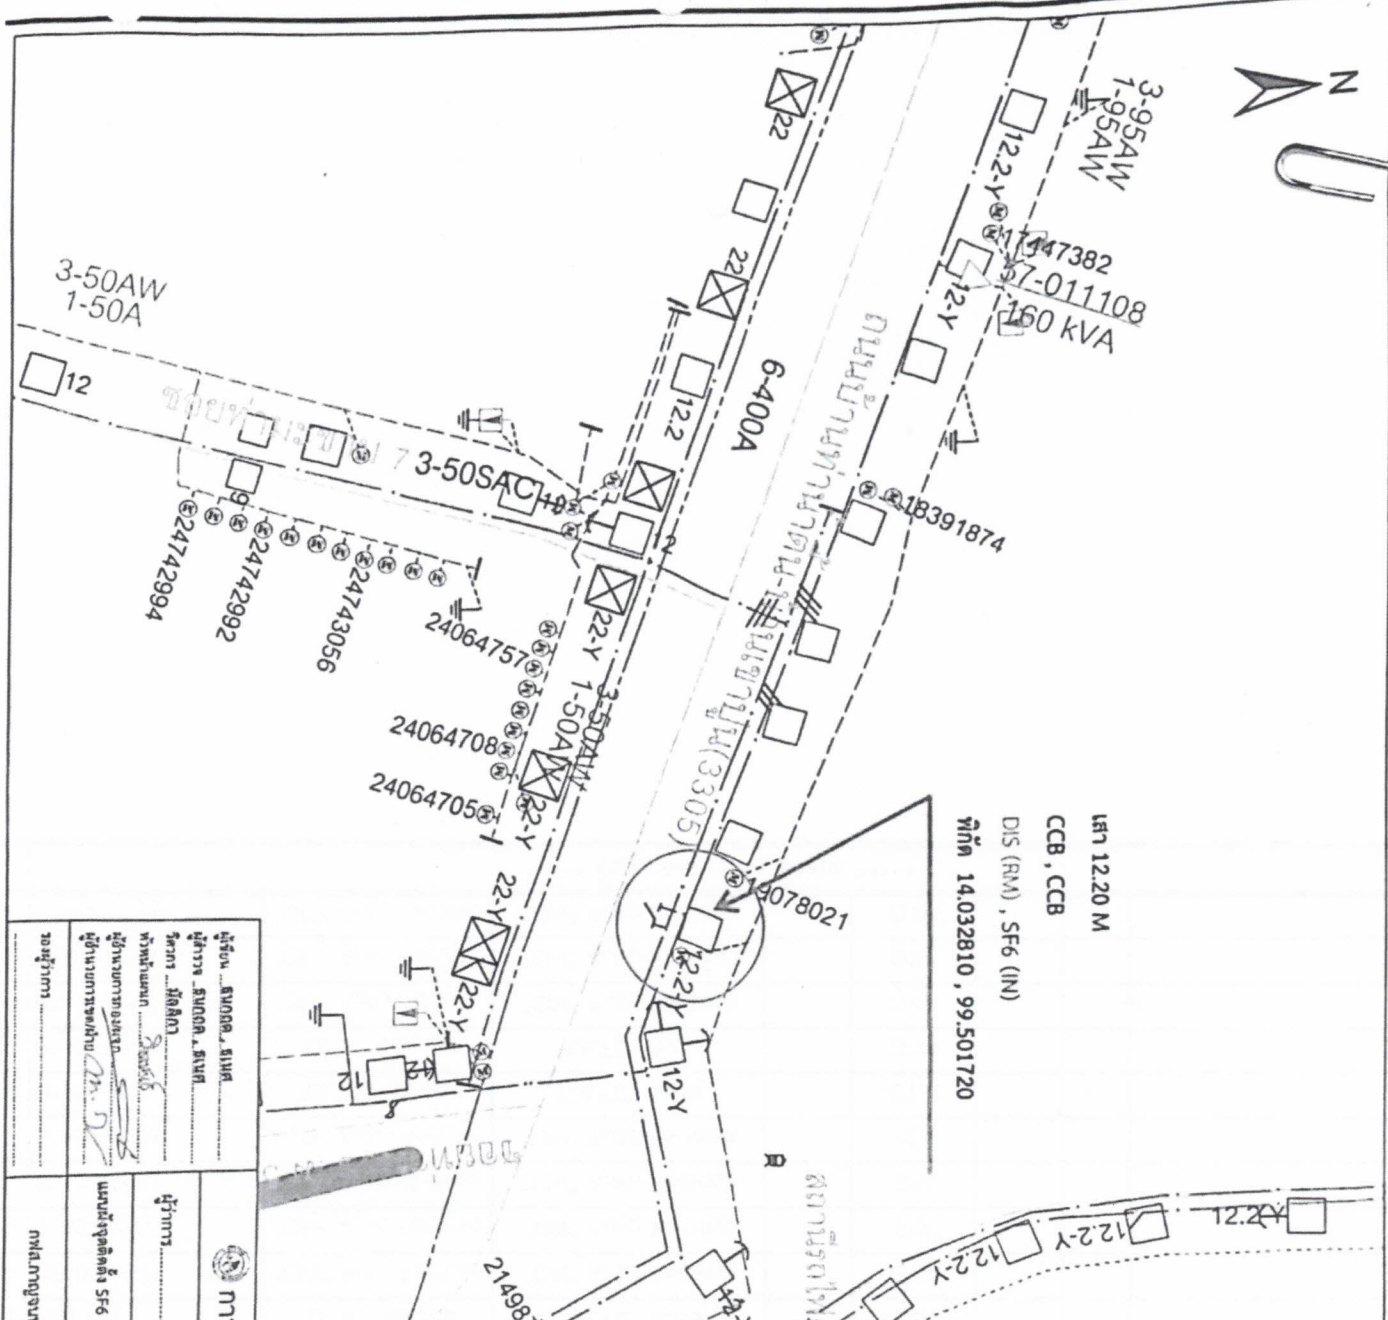

14.032810, 99.501720
 DIS (RM), SF6 (IN)
 CCB, CCB
 12.20 M

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็ม	อัน
□	เสาเข็มคอนกรีต	อัน
□	เสาเข็มเหล็ก	อัน
□	เสาเข็ม 119 KV	อัน
□	เสาเข็ม 22.11 KV	อัน
□	เสาเข็ม 50 S.A.C.	อัน
□	เสาเข็ม 135 S.A.C.	อัน
□	เสาเข็ม 25M	อัน
□	เสาเข็ม	อัน
□	เสาเข็ม 20 - 21 KV, 10 KV	อัน
□	เสาเข็ม 60-60.5 mm, 2 m LONG	อัน
□	Disconnecting Switch	อัน
□	Load Break SF6 22 KV, 600 A	อัน
□	Load Break	อัน
□	Dropout Fuse	อัน
□	หม้อแปลง	อัน
□	Capacitor	อัน
□	Rectifier	อัน

ผู้รับ... สหกรณ์... สหกรณ์...
 ผู้รับ... สหกรณ์... สหกรณ์...
 ผู้รับ... สหกรณ์... สหกรณ์...
 ผู้รับ... สหกรณ์... สหกรณ์...
 ผู้รับ... สหกรณ์... สหกรณ์...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ผู้ทำการ
 แผนกผู้ดูแลระบบ SF6 Loopline KCC09 แผน DIS (KCC09S-03)
 แผนกช่างเทคนิค - บริเวณช่างเทคนิค (ดู จ)

หน่วยงาน
 37, ถนนพหลโยธิน 2587
 1.1990
 1103-015/670080
 1 1 1

