



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๙๗๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน... ปรับปรังระบบจำหน่าย ๒๒ เควี จำนวน ๒ วงจร.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTA ๐๔	๘ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงานฮอตไลน์ และชุดงานซ่อมย่อย ผบ.กทบ. ปฏิบัติงานติดตั้ง SF๖ ทดแทน Dis รหัส KTA ๐๔S-๐๖	จุดปลด DDE	Dis KTA ๐๔S-๐๖	นายพรจจ กระจ่มทอง พชง.๗ ผบ. โทร.๐๔๘-๓๖๒๒๔๙๒
๒	SMV๐๑	๘ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลด DDE	Dis KTA ๐๔S-๐๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๔ กันยายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTA 04 จาก จุดปลด DDE ถึง Dis KTA 4S-06.
ในวันที่ 8 กย 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1338/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SMV 01 จาก จุดปลด DDE ถึง Dis KTA 4S-06.
ในวันที่ 8 กย 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ จิตรมานะศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์
5 ก.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

(นาย สิทธิพงษ์ แก้วฉวี)
0๙๓.๕ .๖๖๗๗๗ ๗๕๗.๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. รฟอ.กชช.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. _____ (สถานีฯ _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบส่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KTA04S-06 (ก่อนถึง บ.สยามเมธิ์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 ทดแทน DIS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1338/66	
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	5 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย				วันที่	5 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย				วันที่	5 กันยายน 2566	
7. ส่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, น.ส. พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง (ปัจจุบันสถานีฯ SMJ ยังไม่สามารถจ่ายไฟได้)							
แจ้ง กฟอ.กทบ.ทำการตรวจสอบ DIS KTA04S-06 อยู่ตำแหน่ง OPEN							
กฟอ.กทบ.แจ้งบริเวณตั้งแต่จุดตัด DDE ทั้ง 2 จุด ถึง DIS KTA04S-06 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ							
1	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
2	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 2 จุดได้						
5	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กทบ.ทราบ						
7	แจ้ง กฟอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟอ.กทบ.Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟอ.กทบ.Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
11	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R
12	แจ้ง กฟอ.กทบ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟอ.กทบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ KTA04S-06 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN) และ กฟอ.กทบ.						
14	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
15	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
16	แจ้ง กฟอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟอ.กทบ.ปลด Short Ground จุด G2						
18	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 2 จุดได้						
19	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
20	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
21	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณสามแยกก่อนถึงบริษัท สยามเมทรี จำกัด (ตำบลคลองมะเดื่อ) เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภทบ. และชุดออกไลน์กระเช้าปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 ทดแทน DIS รหัส KTA 04S-06 วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (งานตัดจ่ายไฟรองรับสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ถาวร)

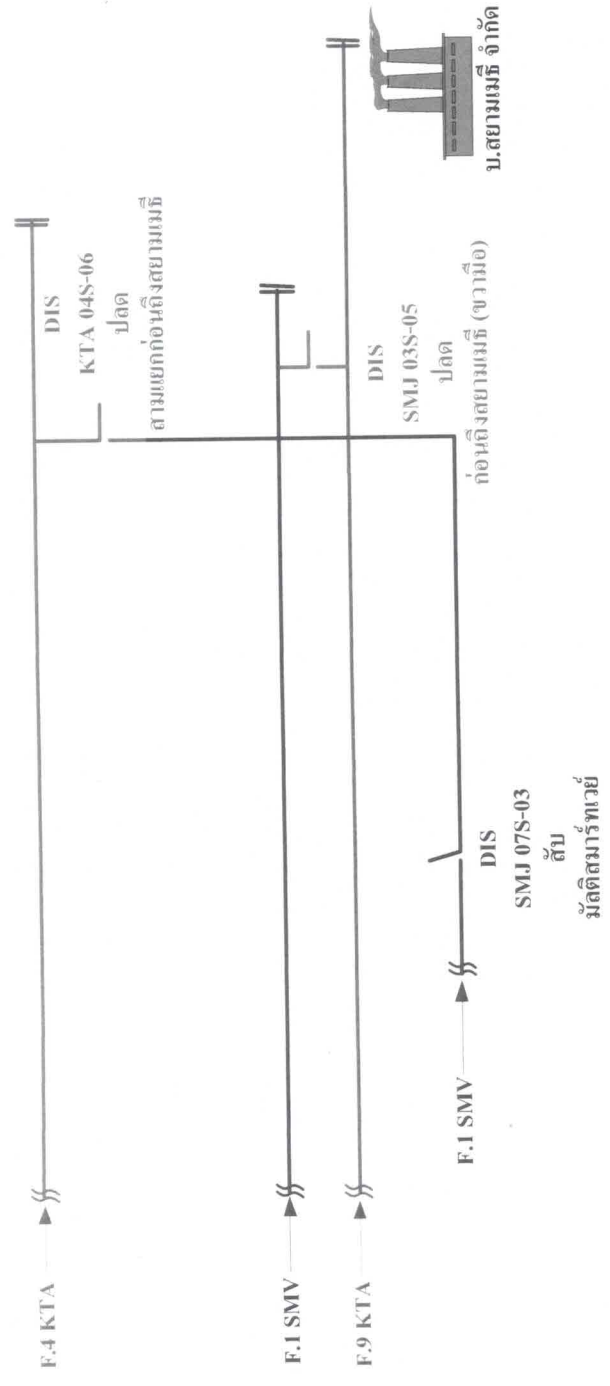

หมายเหตุ
 ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

แผนผังปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณสามแยกก่อนถึงบริษัท สยามเมรี่ จำกัด (ตำบลคลองมะเดื่อ)
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภทบ. และชุดขอโทษกระแสเข้าปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 ทดแทน DIS รหัส KTA 04S-06
 วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 (งานตัดจ่ายไฟรองรับสถานีไฟฟ้ายานุกาฬ ๑๐ ถาวร)

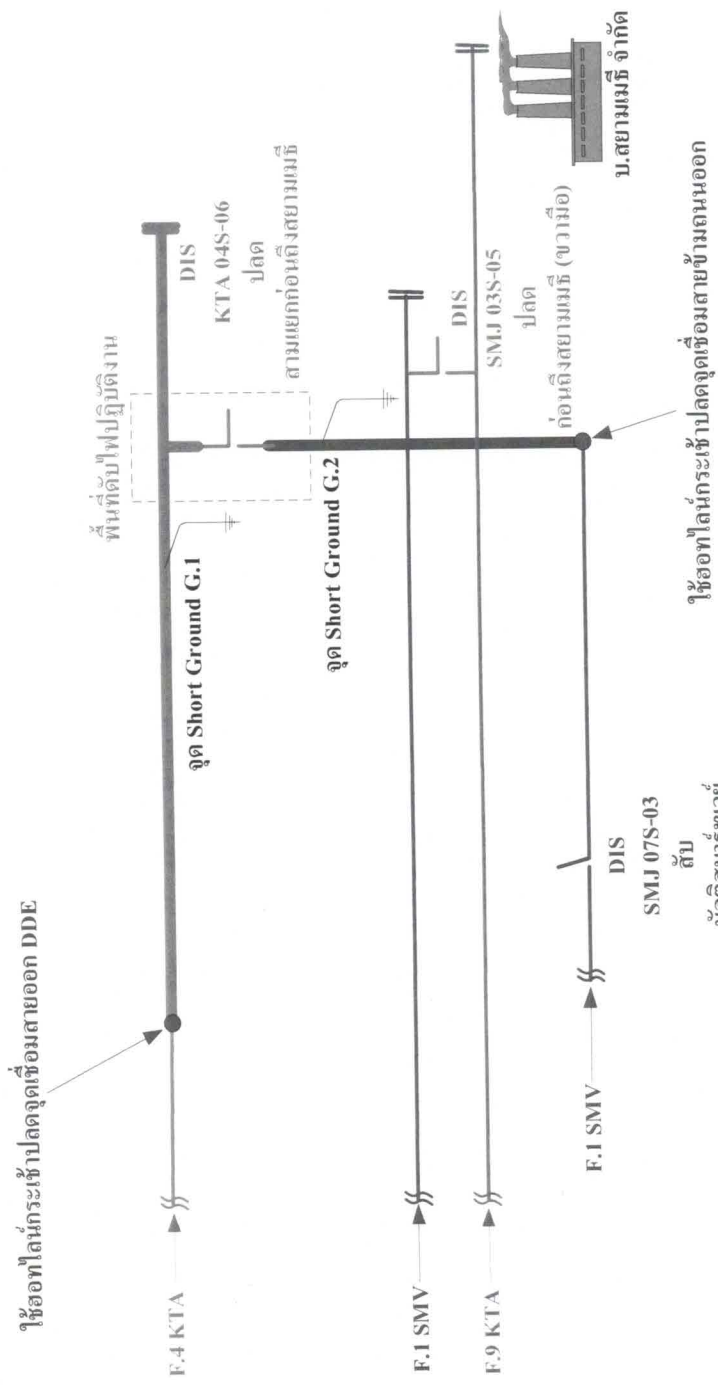

หมายเหตุ
 ไม่มีผู้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน
 เส้นทึบสีเขียว เส้น F.4 KTA ดับไฟปฏิบัติงาน
 เส้นทึบสีแดง เส้น F.1 SMV ดับไฟปฏิบัติงาน

