



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

9 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓.ทยค.- 590 /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายทวีข จันจันดี

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทยค.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๑	๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น.	๐๙.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปรับเสาเอน บริเวณช่องเขาขาด กรป.	Recloser ๑R-๐๑ หน้าโรงแรมรีเวอร์ แคววิลเลจ	จุดตัด DDE หลัง กรป.กลาง	นายกอบชัย ศรีชะคำ โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๑๒๔๒๓๒
๒	SYA๐๑	๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น.	๐๙.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.	ปลด DIS ๑S-๑๐ หน้า บลิวคาวล์ และ จ่าย SF๖ ๑S-๐๙ บ้านแก่งประลอม	DIS ๑S-๑๐ หน้าบลิวคาวล์ที่ ๕	SF๖ ๑S-๐๙ บ้านแก่งประลอม	


ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านพุตะเคียน,บ้านพุมณี,บ้านพุเตย,ทวนสัญญาณวังเขมร ,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง หน.กป โทร ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายทวีข จันจันดี)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทยค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1, 2 ฟีดเดอร์ SYA01 จาก จุดตัด DDE หน้า กมร. ถึง SYA1S-10
ในวันที่ 10 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1479/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.ทยค., อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นาย อนันต์ วิจิตรทองดี)
จก. 6 1กน. หน.คฟ.



ขั้นตอนสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE หลัง กรป. กลาง - SYA01S-10 บล็อกควาล์วที่ 5				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับเสอาเอน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1479/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โนช ทอภัย			วันที่	7 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสรรัตน์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โนช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
3	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
4	ดับไฟย้ายโหลด เนื่องจากใช้โหลดบัสเตอร์ปลด SYA01S-10 ลำบาก						
5	SYA01R-01	สับ	ปลด		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
6	แจ้ง กฟส.ทยค. ดำเนินการปลดสวิตซีไบมีดด้าน Load ของSYA01R-01 ออกทั้งสามเฟส						
7	SYA01S-10	สับ	ปลด		ทยค.		- บล็อกควาล์วที่5 ของ ปตท.
8	SYA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 บ้านแก่งประหลอม
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
13	หลังจากควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
14	แจ้ง กฟส.ทยค. ดำเนินการปลด DDE บริเวณ กรป. กลาง ออกทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ)						
15	หลังจาก กฟส.ทยค. ดำเนินการปลด DDE บริเวณ กรป. กลาง ออกทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
17	SYA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
18	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
20	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน ดับไฟเพื่อจ้ม DDE						
21	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
22	SYA01R-01	สับ	ปลด		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
23	แจ้ง กฟส.ทยค. ดำเนินการปลดสวิตซีไบมีดด้าน Load ของ SYA01R-01 ออกทั้งสามเฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
25	แจ้ง กฟส.ทยค. ดำเนินการจี้ม DDE บริเวณ กรป. กลาง เข้าทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ)						
26	หลังจาก กฟส.ทยค. ดำเนินการจี้ม DDE บริเวณ กรป. กลาง เข้าทั้งสาม เฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
30	หลังจากควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
31	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
32	SYA01S-10	ปลด	สับ		ทยค.		- บล็อกควาส์ที่5 ของ ปตท.
33	ย้ายโหลด SYA01 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA02						
34	แจ้ง กฟส.ทยค. ดำเนินการสับสวิตซ์ไบมัดด้าน Load ของSYA01R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
35	SYA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
36	SYA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6 บ้านแก่งประหลอม
37	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
38	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานปรับเสถียรบริเวณช่องเขาขาด

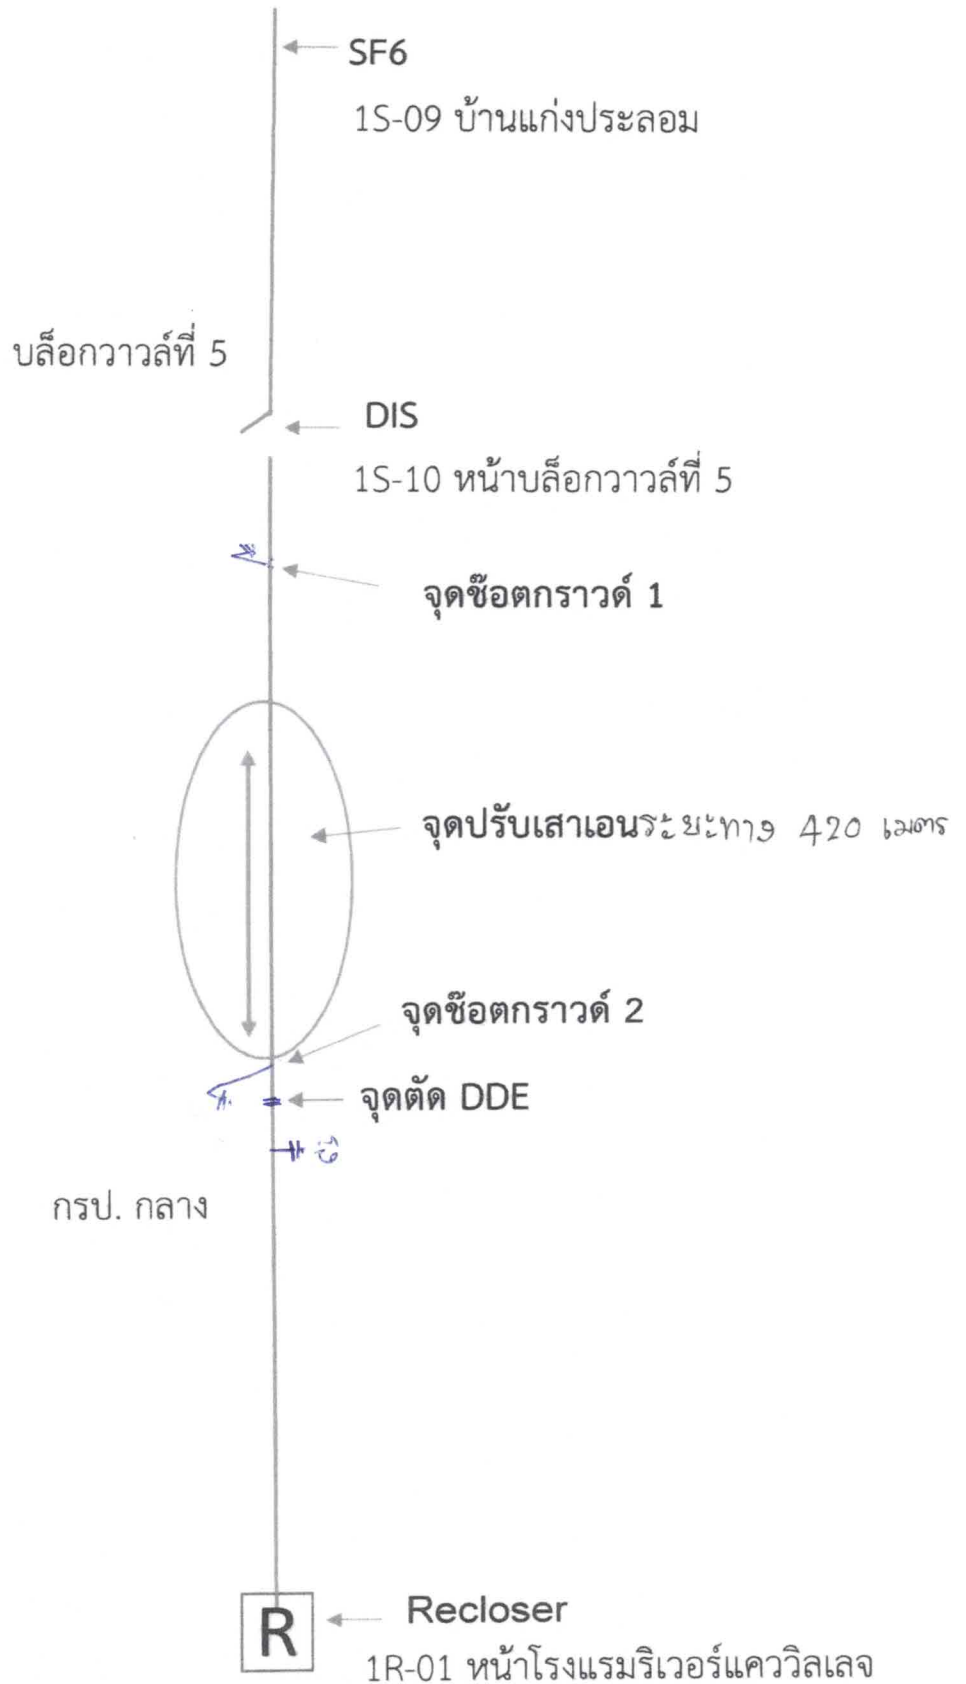

— ฟีดเดอร์ SYA01

↔ จุดปรับเสถียร
