



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 64

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ..ภต.คกช.(ป.น.) ๑๕๕๗ /๒๕๖๔.....  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง.....  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยตหยวด.....

วันที่.....๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....  
ตำแหน่ง ..อภ.ป.น.(ก.๓).....  
ตำแหน่ง ...ผจก.กฟฟ.โคกขาม.....

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สาครว... ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF9	๑๘ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งรีโคลสเซอร์	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่เลย วันนาแพคตอรี	SMF๔S-๑๕	นายนิติพงศ์ กลั่นยิ่ง โทร ๐๙๗-๑๗๕๕๘๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี


ผู้ประสานงาน การดับไฟ ชื่อ ..นาย.สร.ศ.ว.ส.ต.ร. ..สงวน พันธุ์ ..ตำแหน่ง ..ท.ผ.ป.น.....โทร .....๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ.....  
(.....นายคำรน ทยตหยวด.....)  
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟฟ.โคกขาม



ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ประตูน้ำวัดบ้านโคก					
กำหนดวันที่ทำงาน	18/11/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	18/11/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ติดตั้งรีโคลสเซอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1497/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	8 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 พฤศจิกายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 พฤศจิกายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายภุชณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMF							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	SMF09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
2	DIS.ชั่วคราว SMF09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คกข		DIS เลย์วัฒนาแพคตอรี
3	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				คกข		
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				คกข		
5	SMF09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	SMF09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
7	ตรวจสอบ SW.source, SW.load และ ตัวรีโคลสเซอร์ติดตั้งใหม่ เปิดวงจร ส่วน Sw.bypass ปิดวงจร						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				คกข		
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				คกข		
10	DIS.ชั่วคราว SMF09	ปลด	สับ		คกข		DIS เลย์วัฒนาแพคตอรี
11	SMF09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

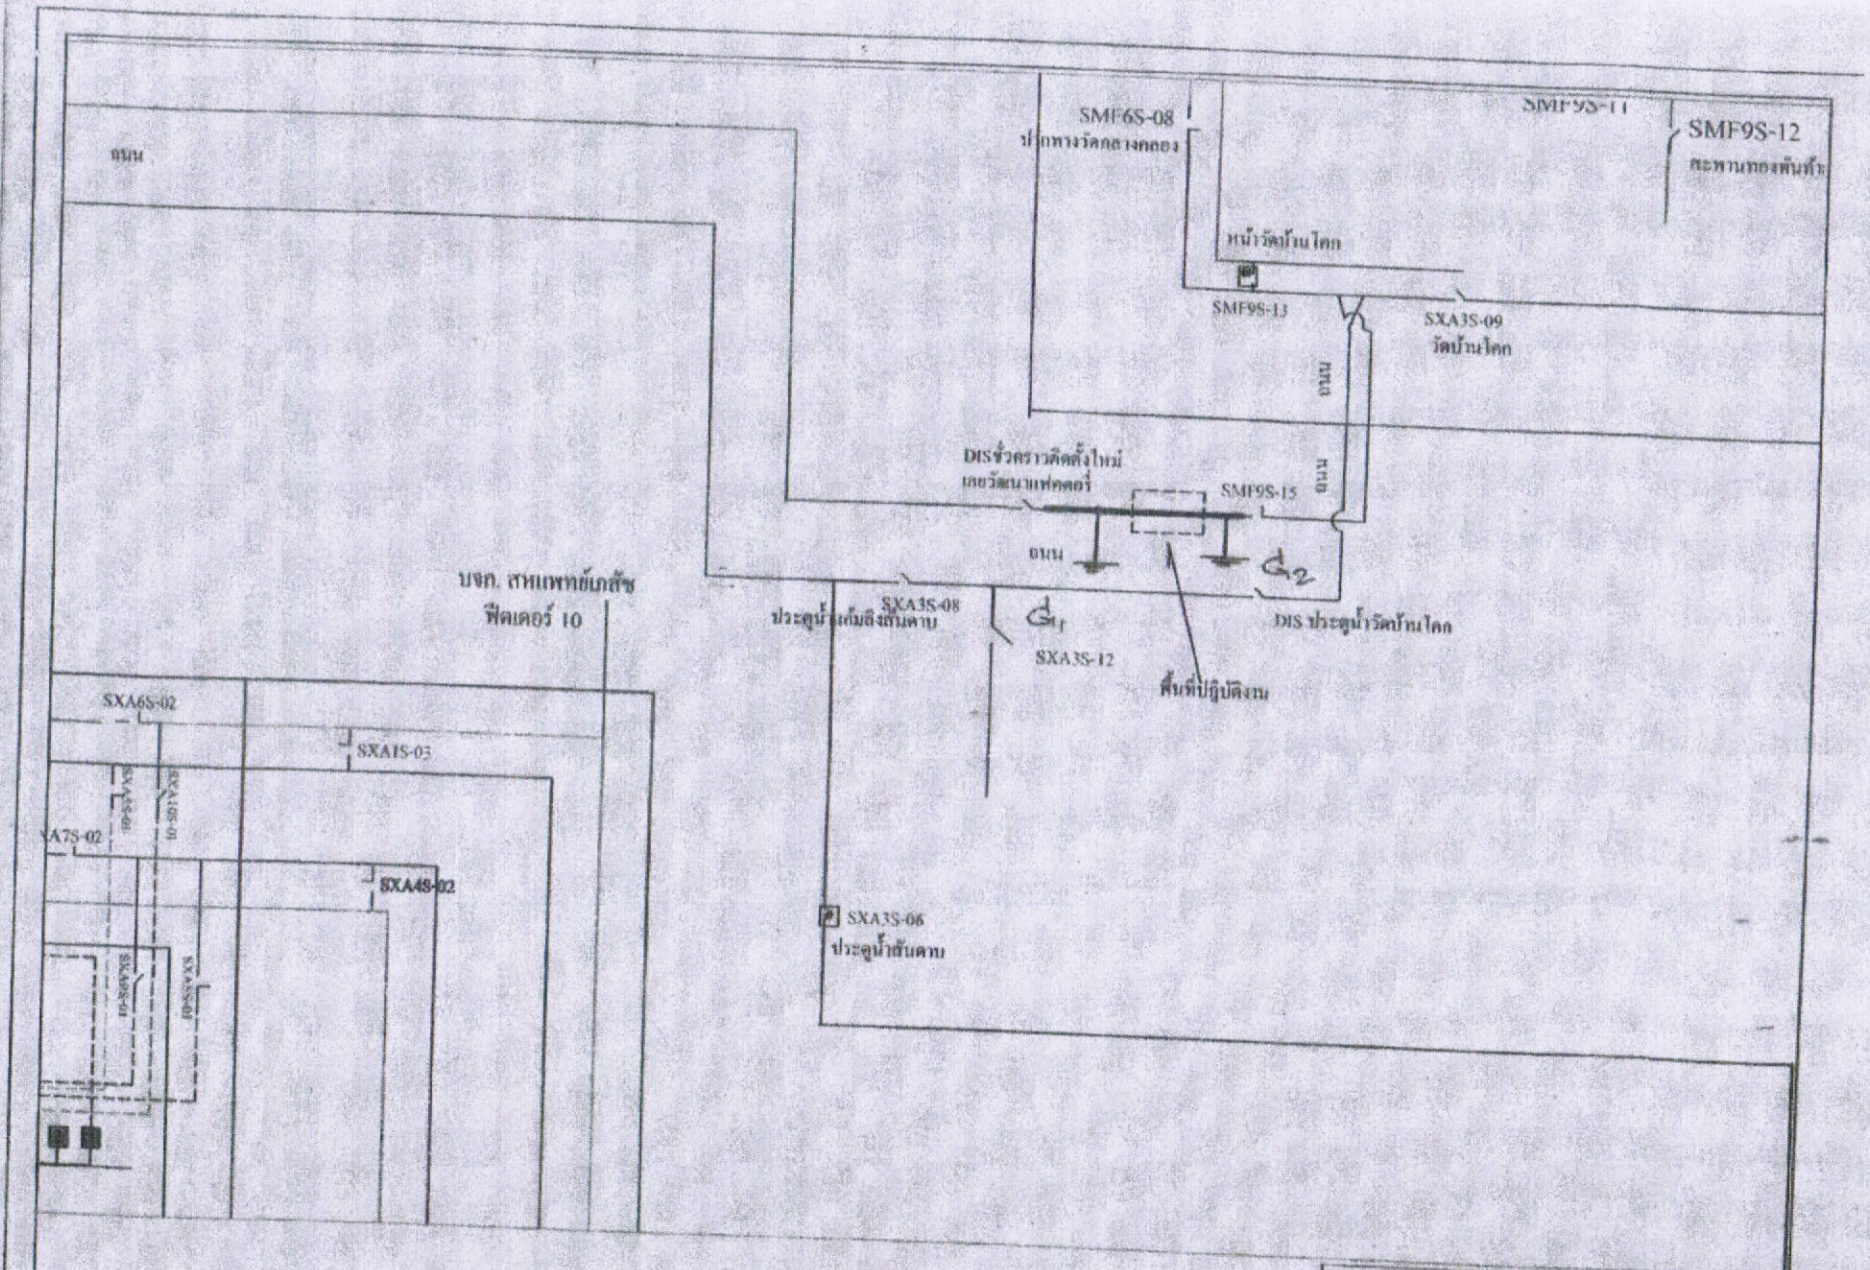

๑. ชื่อโครงการ ๒. สถานที่ ๓. วันที่ ๔. วิศวกร ๕. วิศวกร ๖. วิศวกร ๗. วิศวกร ๘. วิศวกร ๙. วิศวกร ๑๐. วิศวกร	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> วิศวกร นายนิช อิศรางกูร วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า (ก.บ. ๖)	11. วิศวกร 12. วิศวกร 13. วิศวกร 14. วิศวกร 15. วิศวกร 16. วิศวกร 17. วิศวกร 18. วิศวกร 19. วิศวกร 20. วิศวกร
---	--	--

MASTER
