



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) ๘13 /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

Switching Deadline

18 ธ.ค. 67

วันที่ - 3 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง หม.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ | จาก                         | ถึง                          | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ๑.  | XCA6     | 21 ธ.ค. 2567 | 08.30 น.    | 17.00 น. | ดับไฟปักเสา                    | ฝ.ช.ชั่วคราว<br>บ้านอุโมงค์ | DIS ชั่วคราว<br>บ้านทุ่งใหญ่ | นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร<br>085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 7 เครื่อง 350 เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 400 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.731097, 100.157497  
3.2 สิ้นสุด 14.732674, 100.146747  
(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

หม.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA6 จาก ส.ช.ชั่วคราว บ้านอุโมงค์ ถึง DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่

ในวันที่ ๒1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1847/2567.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

ออกเอกสาร

พนักงานศูนย์ฯ นาย ต.ก.ดี.ล.ก.จ. เป็นแผนก ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.อ.สามชุก

.....  
(นางสาวรุ้งกมล วัฒนคุณ)

อ.ก.บ. ๕ แทน หม.บ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... แผน  
แผนผังแนบ ..... แผน

ผจก. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....



..... อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... บริเวณบ้านอุโมงค์ - บ้านทุ่งใหญ่ (XCA06)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 21 ธ.ค. 67 ..... ระหว่าง 08.30 น. ..... ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟส.สช. ..... งานที่ทำ ..... ปรับปรุงระบบจำหน่าย XCA06 ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1847/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ..... วันที่ ..... 17 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 17 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 17 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. จิรวินน์, วัฒนา, พิษชา, วีรวัชร, ออมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นครินทร์, สาวพิชยา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ           | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง  |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 2  | ตรวจสอบ XCA01S-11 (SF6 บ้านอุโมงค์) อยู่สถานะ "ปลด, ล็อคคาน"                             |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 3  | XCA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose  |      | XCA          |            | CB               |
| 4  | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 5  | DIS ชค. XCA06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์) |      | สช.          |            | DIS บ้านทุ่งใหญ่ |
| 6  | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ  |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 7  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 8  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 9  | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe                     |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 10   | XCA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose   |      | XCA          |            | CB               |
| 11   | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 12   | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| <u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>                |  |                                      |                     |      |              |            |                  |
| เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ |  |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 13   | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 14   | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 15   | XCA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose  |      | XCA          |            | CB               |
| 16   | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                     |      |              |            |                  |
| 17   | DIS ชค. XCA06  | ปลด                                  | สับ                 |      | สช.          |            | DIS บ้านทุ่งใหญ่ |
| 18   | XCA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose   |      | XCA          |            | CB               |
| <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>                 |  |                                      |                     |      |              |            |                  |

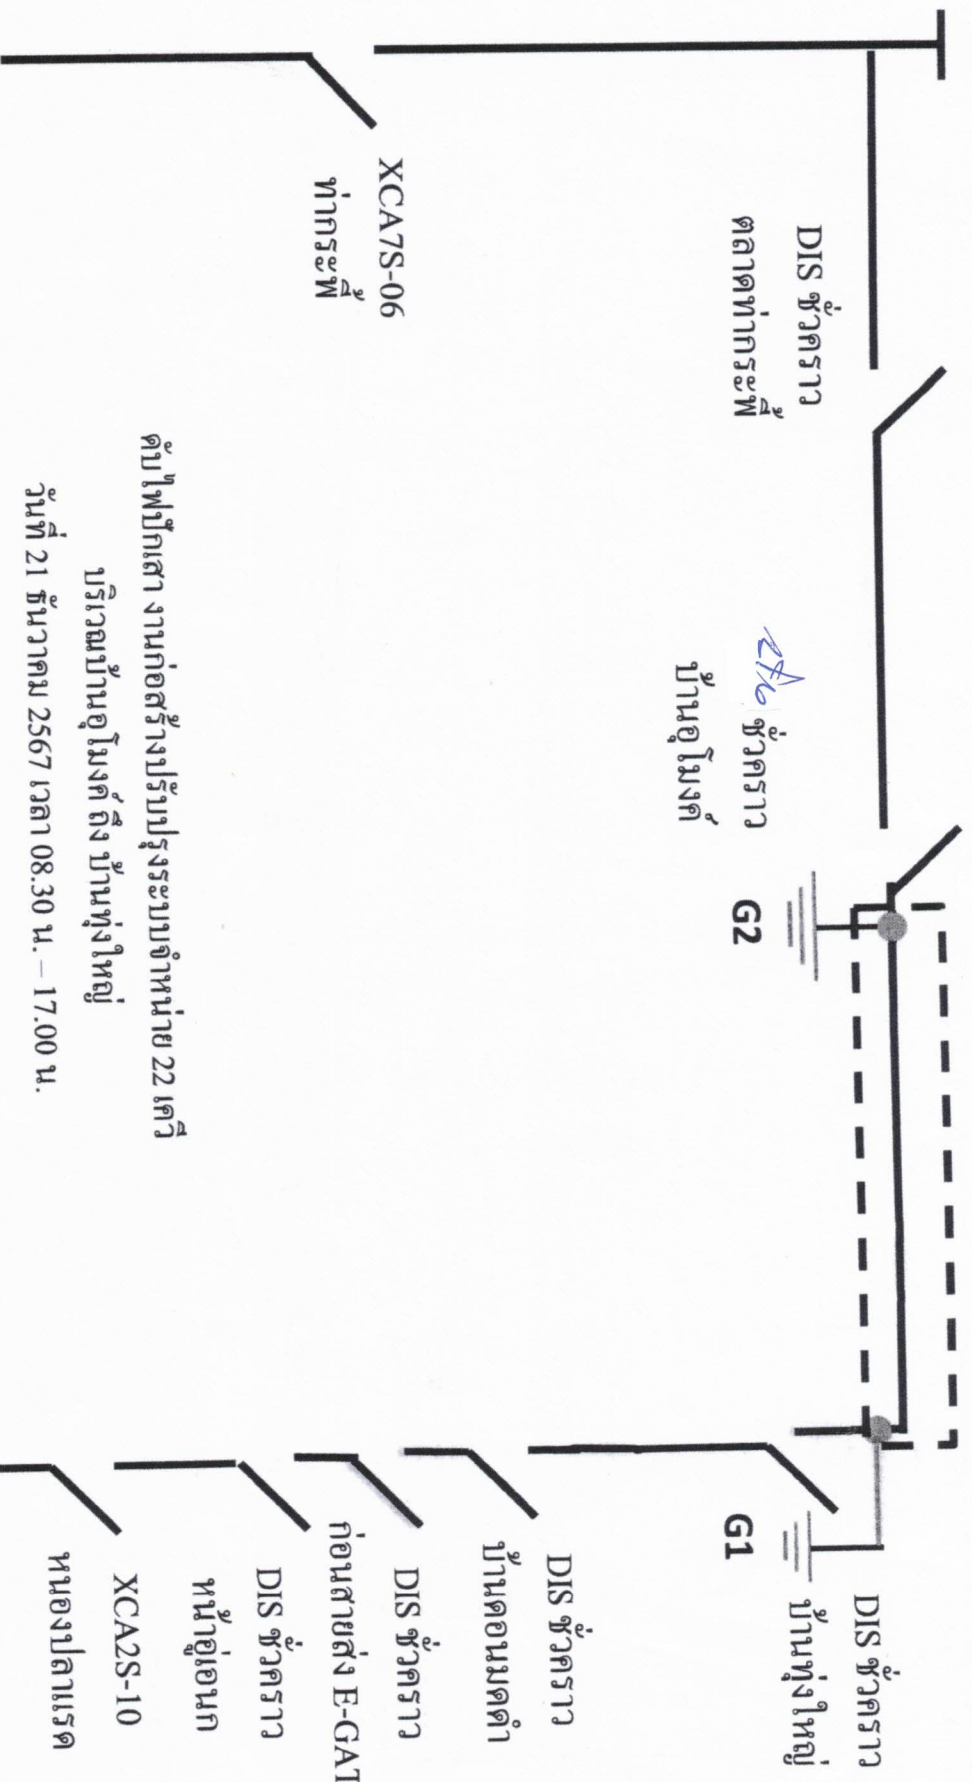

ดับไฟปกเสา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณบ้านอุโมงค์ ถึง บ้านทุ่งใหญ่

วันที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ติดต่อจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พรง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
ผู้ติดต่อจุด G2  
นาย บัณฑิต เทพบุตร พรง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

ไปวัดนางพิมพ์

ไปถนน 340

SF6 ข้างราชมงคล  
XCA2S-09
