



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง(บพ.) ๕๖๖๑/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTGob	๒๓ พ.ย.๒๕๖๕ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟ เพื่อดำเนินการ ย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณบ้านรางประทุน	SF๖ ชั่วคราว จุด A	DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง ๐๘๕-๒๖๖๘๔๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ บ้านรางประทุน ม.๗.ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๔๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ UTGob จาก SF๖ ตล. ๐๑ A ถึง DIS ตล. ฝั่งตรงข้าม อบต. หัวโพธิ์
ในวันที่ 23, 28. พ.ย. ๖5 ตั้งแต่เวลา 08-๐๐ น. ถึง 17-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1905/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสิทธกร พิจารณา:ตัดไฟ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
๖๖๖.๖ กทท. มท.๓

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง, กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ชค.จุด A - DIS ชค.ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,28/พ.ย/2565	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1905/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสุวิสต์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		อทง.	R	บ้านทางตลาด
4	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		สพน.	R	ตรงข้าม สนง.กฟอ.สพน.
5 ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO03							
6	SPO03S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
7	SF6 ชค.ไลน์ UTG06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	บ้านรางประทุน (จุด A)
8 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
9	DIS ชค.ไลน์ UTG06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
10 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.อทง.ทราบ							
11 แจ้งให้ กฟอ.อทง.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
12	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
13	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO	-	-
14	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		อทง.	R	บ้านทางตลาด
15	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		สพน.	R	ตรงข้าม สนง.กฟอ.สพน.
16 แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
17 เมื่อ กฟอ.อทง.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
18	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
19	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	-
20	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		อทง.		R	บ้านทางตลาด
21	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		สพน.		R	ตรงข้าม สนง.กฟอ.สพน.
22	DIS ชค.ไลน์ UTG06	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
23	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO03							
24	SF6 ชค.ไลน์ UTG06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อทง.		SF6	บ้านรางประทุน (จุด A)
25	SPO03S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
26	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
27	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
28	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		อทง.		R	บ้านทางตลาด
29	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		สพน.		R	ตรงข้าม สนง.กฟอ.สพน.
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

ungskungwa

วณแตงมิ่งขวา

จุดแบ่งเขต กฟอ.อุทอง-สุพรรณบุรี

กท.บ้านดอนแดง

TKK2

BAM 2

UTG08S-07
บ้านไผ่ม่วง

จุดแบ่งเขต กฟอ.อุทอง-สองพี่น้อง

TKK02S-05
บ้านรางประทุน

DIS ชั่วคราว ผังตรงข้าม
อบต.หัวโพธิ์

วัดยางไทย
UTG06S-06

น.โคกเขาเขต

SFb ชั่วคราว
จุด A

วัดซอกลม
UTG08VF-04


แยกท่าพระ
UTG03S-06

SK04VF-107
ขุนทะเล

วัดขุนทะเล

สม.ป.บ. กฟอ. อุทอง

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

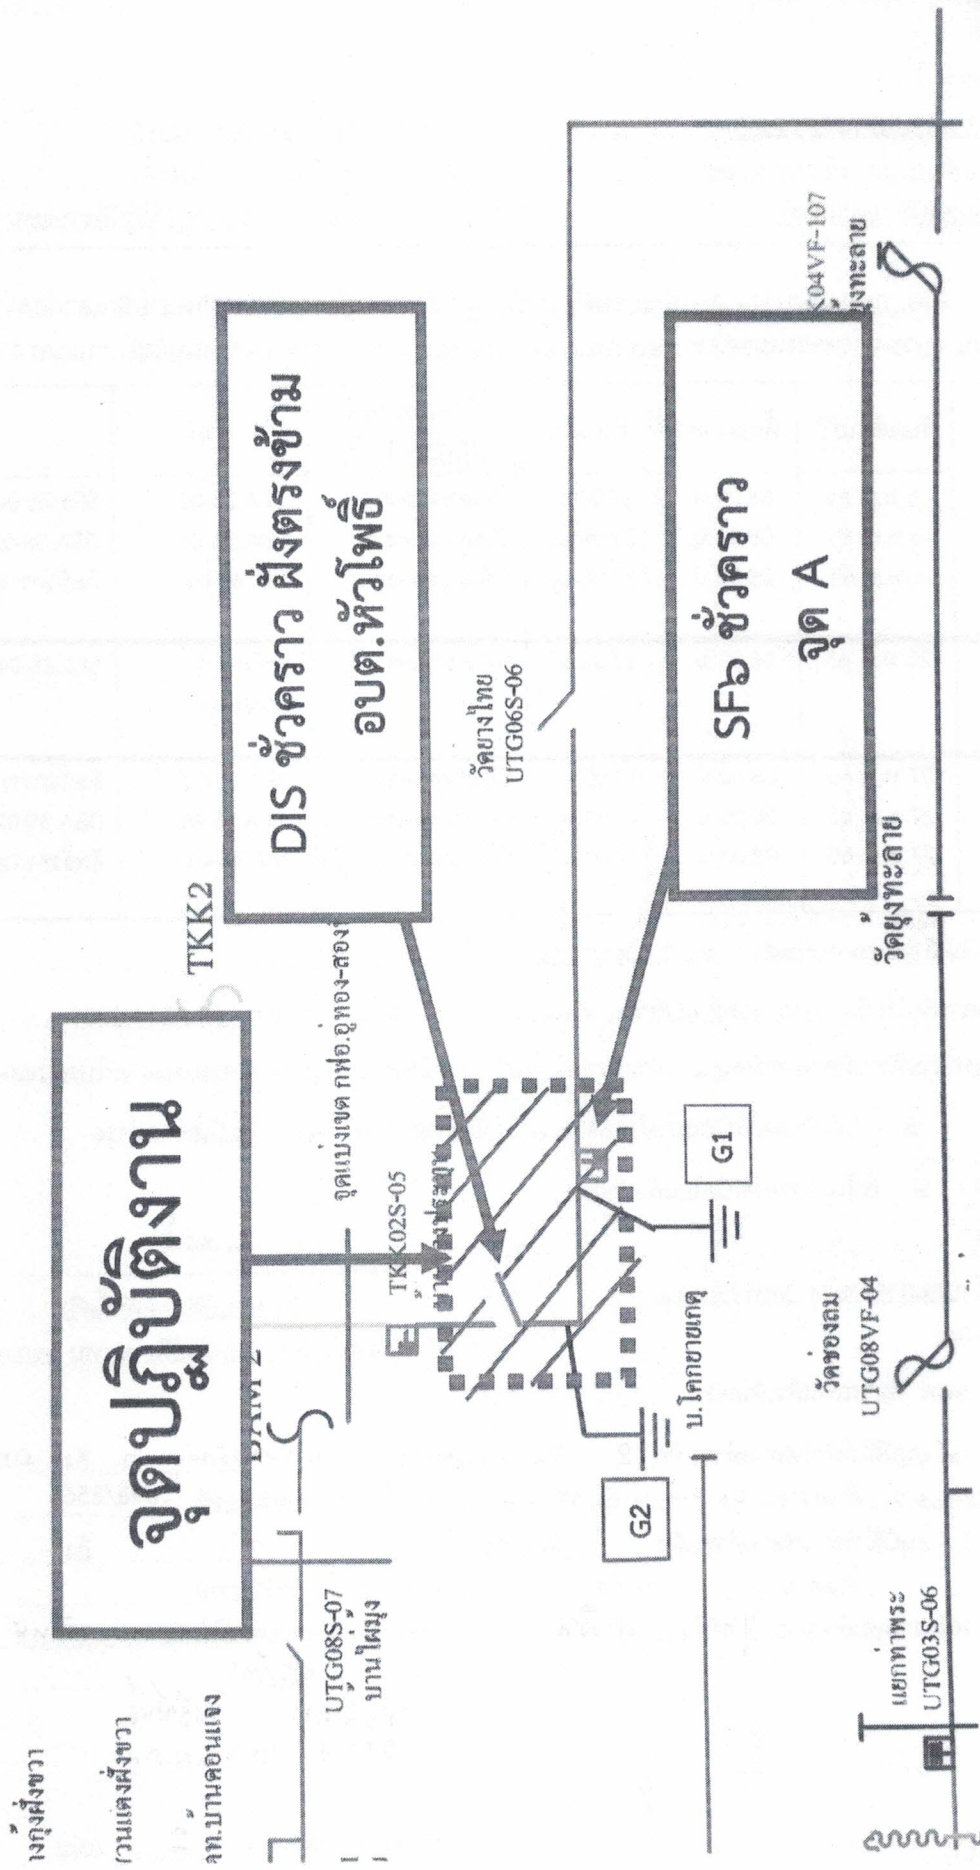

สว.ปบ. ก.พ.อ. ๕๓๐๖
