



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

กรุงเทพฯ (บข) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
(เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก)

เลขที่ ก.๓ ยทง.(บข) ๕๗๖๘ /๕๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นคั่ง
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทง ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแควเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	IVS	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTV06	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐	ย้ายโหนดเพื่อดำเนินการ นำรีโกลงเซอร์เข้าระบบ บริเวณบ้านคอนโท้ทอง **รองรับสถานีอุทง ๒(ชค)** (ค่วน)	DOE หน้ำโรงปลา	ชุดโหนดระบบ ๒๒ เหวี	นายจกต โพธิกุล ช.ปบ.กฟอ.อุทง ๐๕๕-๒๖๖๕๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ ม.๕.๕ ต.สวนนก ม.๑.๒.๓.๔.๕ ต.คอนโท้ทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกต โพธิกุล ตำแหน่ง ช.ปบ.กฟอ.อุทง โทร ๐๕๕-๒๖๖๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑๑ มีโอกาสชำรุด ๑๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศสพ.) กฟอ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก๓)

ศสพ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTV02 จาก DOE ๐๕๕-๒๖๖๕๕๕๕ ถึง
ในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๕ ตั้งแควเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1924/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแควเวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัตถ์สิทธิ์ ใยมะธาดา ๒๕ พ.ย. ๖๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟอ.๑๐๑๕ โพนสี ๑๕

รศพร สันติโกศลกรัง
ทพ.รศพร สันติโกศลกรัง
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน นศ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศพ.)

เวียน ผจก. สก.๕๕๖๕

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๕ แผน
แผนผังแบบ ๕ แผน

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแควเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (UTV01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการติดตั้งรีโคลสเซอร์			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1924/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	27 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	27 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	หมายเหตุ - รีโคลสเซอร์ บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (ติดตั้งใหม่) ย้ายมาจากบริเวณวัดโรงช้าง						
	- ไลน์แยกบ้านดอนโพธิ์ทองมี D/O ป้องกันไลน์แยก (ไม่ต้องตั้งอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง)						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
3	แจ้ง กพย.สตง. ทำการไล่นีโพลตบริเวณจุดตัด DDE หน้าโรงปลา						
4	เมื่อ กพย.สตง. แจ้งทำการไล่นีโพลตบริเวณจุดตัด DDE หน้าโรงปลา แล้วเสร็จ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ตัด DDE บริเวณหน้าโรงปลา โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ตัด DDE บริเวณหน้าโรงปลา โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ประกอบตู้รีโคลสเซอร์ บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (ติดตั้งใหม่) เชื่อมสายลิตเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด						
17	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ประกอบตู้รีโคลสเซอร์ บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (ติดตั้งใหม่) ปลดวางจระอยู่ที่หมด						
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE บริเวณหน้าโรงปลา โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE บริเวณหน้าโรงปลา โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
21	SW. By Pass	ปลด	สับ		สตง.		DIS R บ้านดอนโพธิ์ทอง
22	SW. ด้าน Source	ปลด	สับ		สตง.		DIS R บ้านดอนโพธิ์ทอง
23	ทำการจ่ายรีโคลสเซอร์ บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (ติดตั้งใหม่) เลี้ยงตัวเปล่า						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	รีโคลสเซอร์	ปกติ	สับ คง Nonreclosing		สดง.		R บ้านดอนโพธิ์ทอง
25	หมายเหตุ - รีโคลสเซอร์ บริเวณบ้านดอนโพธิ์ทอง (ติดตั้งใหม่) รอทาง กบข. (ผบอ.) มาตั้งค่าไลน์ Coordination ใหม่ และนำเข้าระบบ						
26	- D/O ป้องกันไลน์แยกบ้านดอนโพธิ์ทอง กพย.สดง. แจ้งจะมีแผนทำการรีถอนต่อตรงในภายหลัง						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

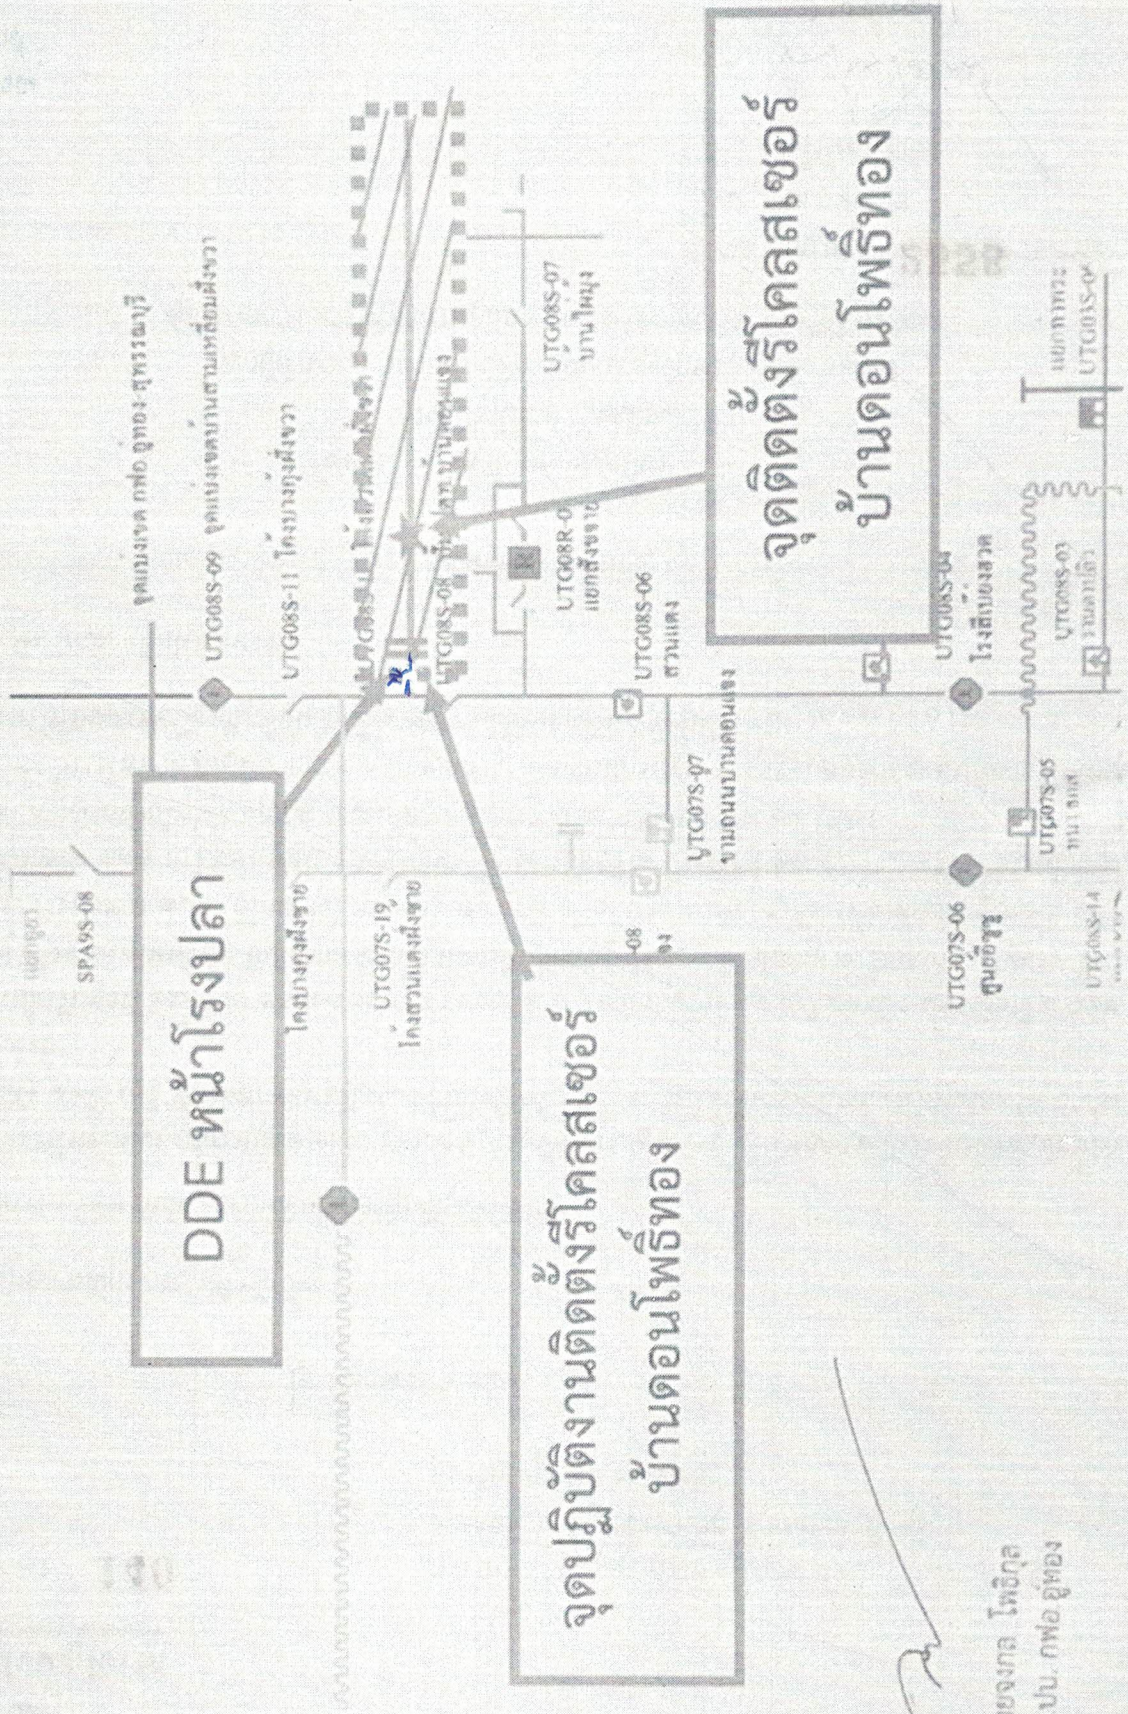

แผนภูมิระบบจ่ายไฟฟ้า (ระบบแรงดัน 10.5 kV)

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

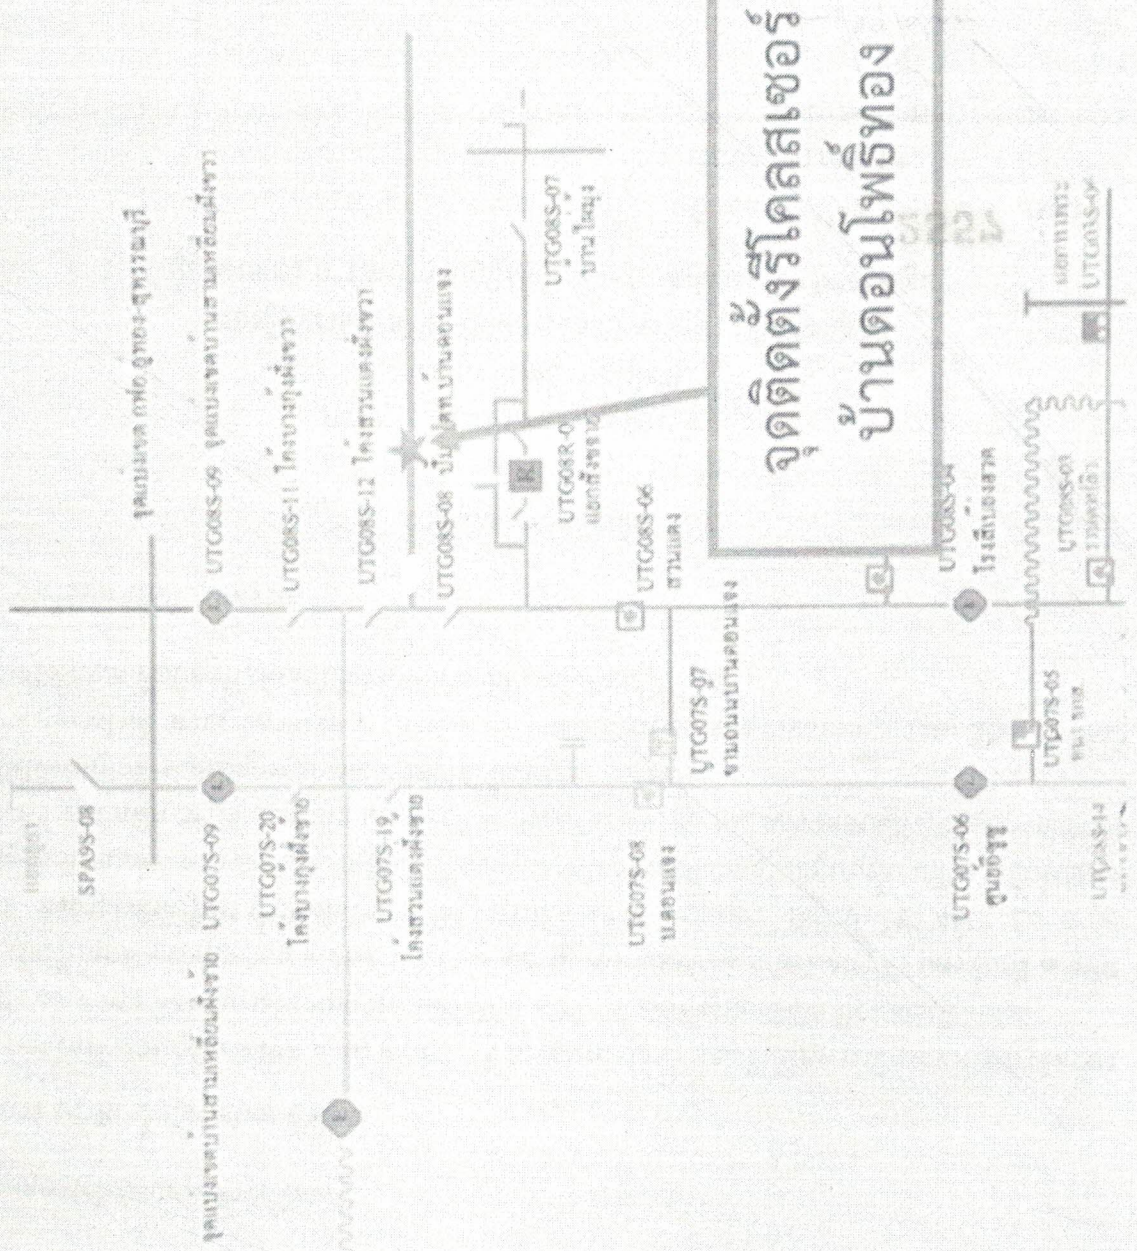

๒๕ ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕)
 (๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕))

นายองกล โพธิ์ทอง
 ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕) ๖๖ (๒๕)
