



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

28 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓.อพ.(บพ.) ๒๒๒๓ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ ทวีธาสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง. ตามแผนผังสั่งแบบ  
จำนวน...๓... แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก  | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                                       |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|--|--|--|
| ๑.  | UTGob    | ๕ ม.ค. ๒๕๖๖  | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการ<br>ถอนเสางานปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>บริเวณบ้านสะพาน | ครีบเอทพีวีเอส<br>โลนบ้านสะพาน<br>รหัส UTGobF-๒๐ | ครีบเอทพีวีเอส<br>กลางโลนบ้านสะพาน<br>รหัส UTGobF-๒๗ | นายจกกล ไพธิกุล<br>ชม.บ.บ.กฟอ.อุทอง<br>๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ...ม.๑๖,๗.๑๐. ต.สะพาน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจกกล ไพธิกุล ตำแหน่ง ชม.บ.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ UTGob จาก บัค UTGobF-20 ถึง UTGobF-27

ในวันที่ 4 ธค 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2031/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เรณกร จิตรมนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พลก ไพธิกุล  
23 ธ.ค. 65

(จางสาว ชีรณี วงษ์ศิริ)  
อด.๔ (กทง) จ.ฉ.ค.ง.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผอ.อุทอง, ผ.ร.สะพาน, ผ.บ.นท.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์จึง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


|                        |                             |          |   |
|------------------------|-----------------------------|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณบ้านสระพังลาน (UTG06) |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 4 ม.ค. 66                   | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | อทง.                        | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 2031/2565   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |                             |          | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2565   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                             |          | วันที่ 23 ธันวาคม 2565  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                             |          | วันที่ 23 ธันวาคม 2565  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                             |          | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพริภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์        | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                  |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------|
| <b>ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง</b>                                |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 1  | UTG06VB-01         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | UTG          | -          | -                         |
| 2  | SPO03R-01          | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | สพน.         | R          | บ้านหัวสะพาน              |
| <b>ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO03 (ดับไฟย้ายโหลด)</b>                                    |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 4  | UTG06F-27          | สับ                                  | ปลด                  |      | อทง.         |            | กลางไลน์บ้านสระพังลาน     |
| 5  | SF6 ชค. ไลน์ SPO03 | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | อทง.         | SF6        | คันคลองตอนมะเกลือ         |
| <b>เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.</b>  |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 7  | UTG06F-20          | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อทง.         |            | ไลน์บ้านสระพังลาน (ไปรับ) |
| <b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.อทง.ทราบ</b>  |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| <b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1</b>  |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| <b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2</b>  |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| <b>แจ้งให้ กพอ.อทง.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว</b> |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 12   | UTG06VB-01         | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | UTG          | -          | -                         |
| 13   | SPO03R-01          | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | สพน.         | R          | บ้านหัวสะพาน              |
| <b>แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้</b>   |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| <b>*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****</b>  |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 15   | UTG06VB-01         | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | UTG          | -          | -                         |
| 16   | SPO03R-01          | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | สพน.         | R          | บ้านหัวสะพาน              |
| <b>แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1</b>   |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| <b>แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2</b>   |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 19   | UTG06F-20          | ปลด                                  | สับ                  |      | อทง.         |            | ไลน์บ้านสระพังลาน (ไปรับ) |
| <b>ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO03 (ดับไฟย้ายโหลด)</b>                                       |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |
| 21   | SF6 ชค. ไลน์ SPO03 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | อทง.         | SF6        | คันคลองตอนมะเกลือ         |
| 22   | UTG06F-27          | ปลด                                  | สับ                  |      | อทง.         | D/O        | กลางไลน์บ้านสระพังลาน     |
| 23   | UTG06VB-01         | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | UTG          | -          | -                         |
| 24   | SPO03R-01          | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | สพน.         | R          | บ้านหัวสะพาน              |
| <b>*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****</b>   |                    |                                      |                      |      |              |            |                           |

# สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

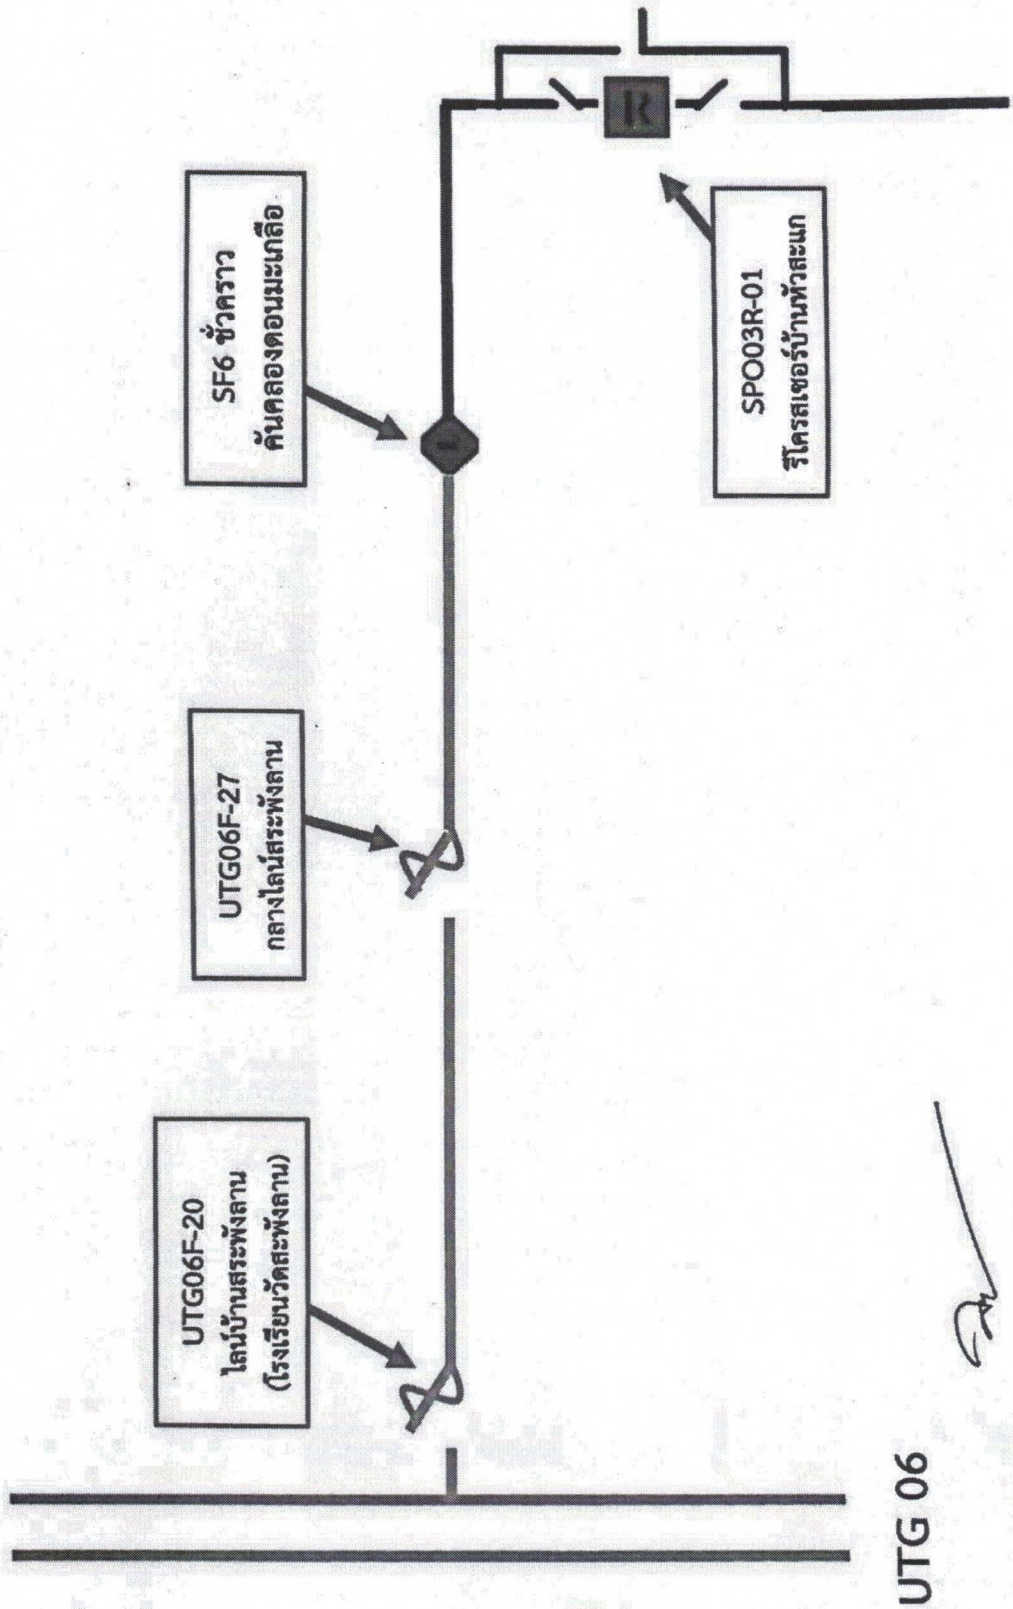


UTG 06

  
นายงกกล พิทักษ์กุล  
ชน.ปป. กฟอ.อุททอง

SPO 03

# สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

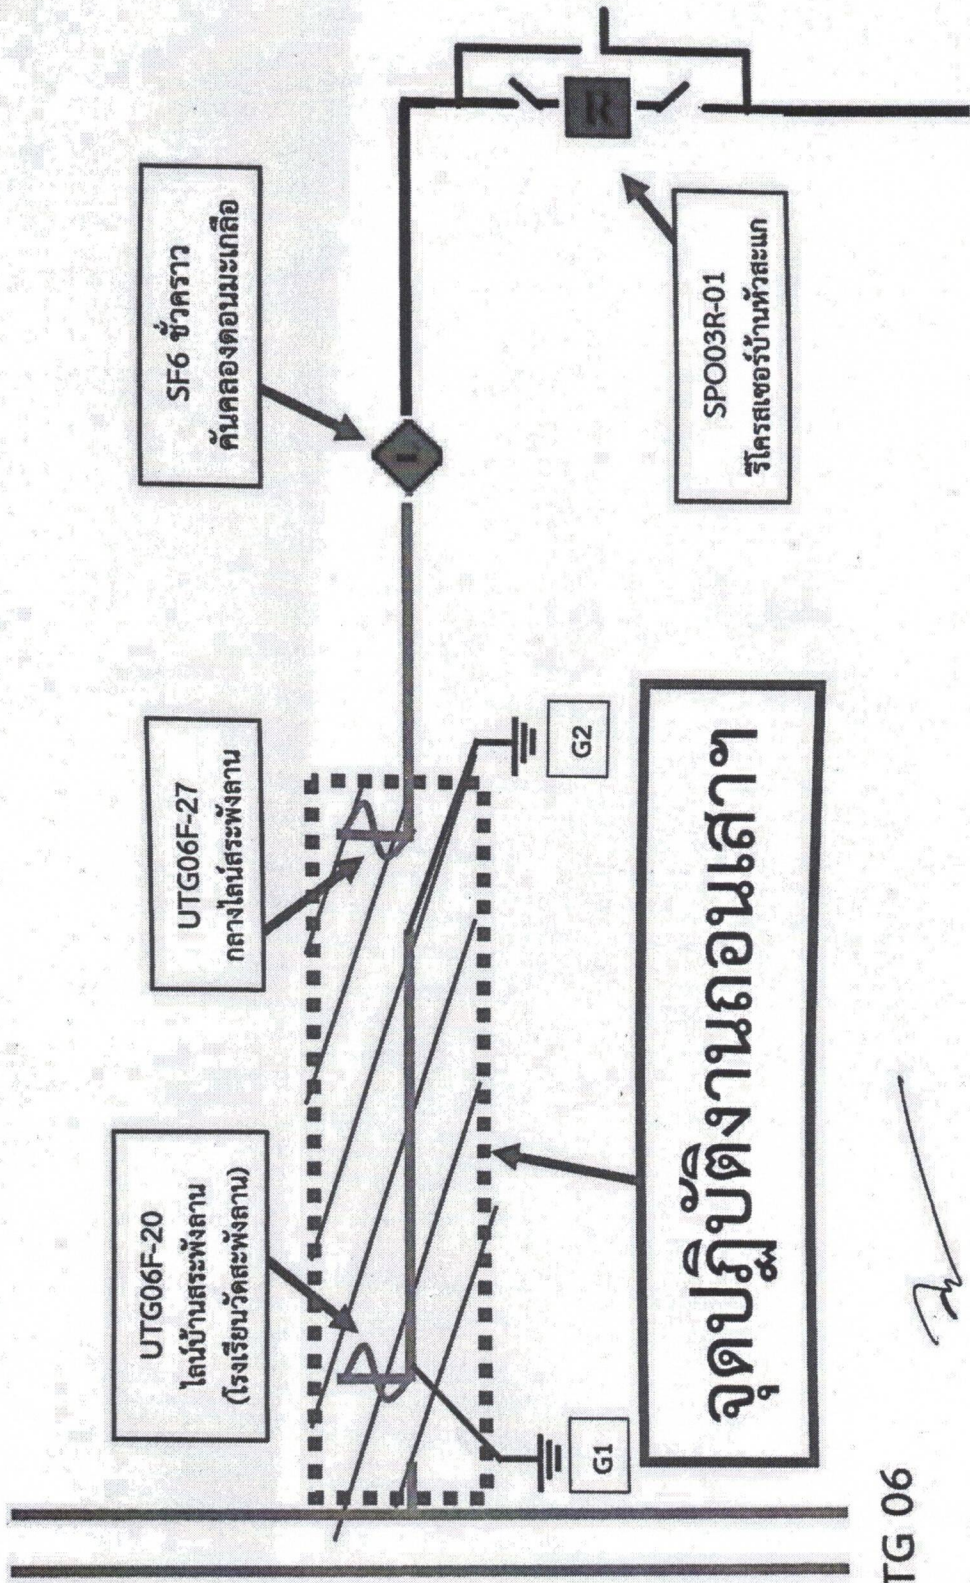

UTG 06

SPO 03

นายงกต โพธิกุล  
ชผ.ปบ. กฟอ.อุทอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน  
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี..... ๔ มกราคม ๒๕๖๖ .....

งานที่ปฏิบัติ..... ย้ายโหนดเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บริเวณบ้านสระพังลาน .....

สถานที่..... บริเวณบ้านสระพังลาน .....

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

| มี                                  | ไม่มี                    |                                      | เพียงพอ                             | ไม่เพียงพอ               | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Voltage Detector.....๒.....ตัว       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | กรวยยาง.....๔๐.....อัน               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ป้ายกันทางเตือนอันตราย.....๒.....ชุด | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ป้ายแขวนห้ามสับสวิตซ์.....๔.....อัน  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....    |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | อื่นๆ .....                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | .....    |

| อันตรายที่ตรวจสอบ                               | วิธีควบคุม / ป้องกัน   | หมายเหตุ |
|---|--|----------|
| ๑.จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง             | - ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน   |          |
| ๒.สายเคเบิลโทรศัพท์                             | - ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน  |          |
| ๓.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)              | - ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน  |          |
| ๔.ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี | - ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ด้วย Voltage Detector<br>- ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน |          |

เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง

เพื่อโปรดทราบและ

ดำเนินการต่อไป

นายจกกล โทธิกุล  
(ผู้ควบคุมงาน)

\*\*แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน\*\*
