


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ชค.จุด A - DIS ชค.ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ต.ค. 65	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1684/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	ศุภสวัสดิ์		วันที่ 21 ต.ค. 65
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ธนิศ		วันที่ 21 ต.ค. 65
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	-		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
2	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทอง.	SCADA R	R.บ้านทางตลาด
3	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
4	TKK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
5	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPO03						
6	TKK02S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA SF6	บ้านรางประทุน
7	SF6 ชค.ไลน์ UTG06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทอง.	SF6	บ้านรางประทุน(จุด A)
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
9	DIS ชค.ไลน์ UTG06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทอง.	DIS	ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งชุด กฟอ.อทอง.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
13	หลังจากชุด กฟอ.อทอง.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
15	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทอง.	SCADA R	R.บ้านทางตลาด
16	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
17	TKK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟอ.อทอง.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟอ.อทอง.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			-
21	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R	R.บ้านทางตลาด
22	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO			-
23	TKK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
24	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G1							
25	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G2							
26	DIS ชค.ไลน์ UTG06	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
27	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPO03							
28	SF6 ชค.ไลน์ UTG06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6	บ้านรางประทุน(จุด A)
29	TKK02S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
30	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			-
31	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	R.บ้านทางตลาด
32	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			-
33	TKK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

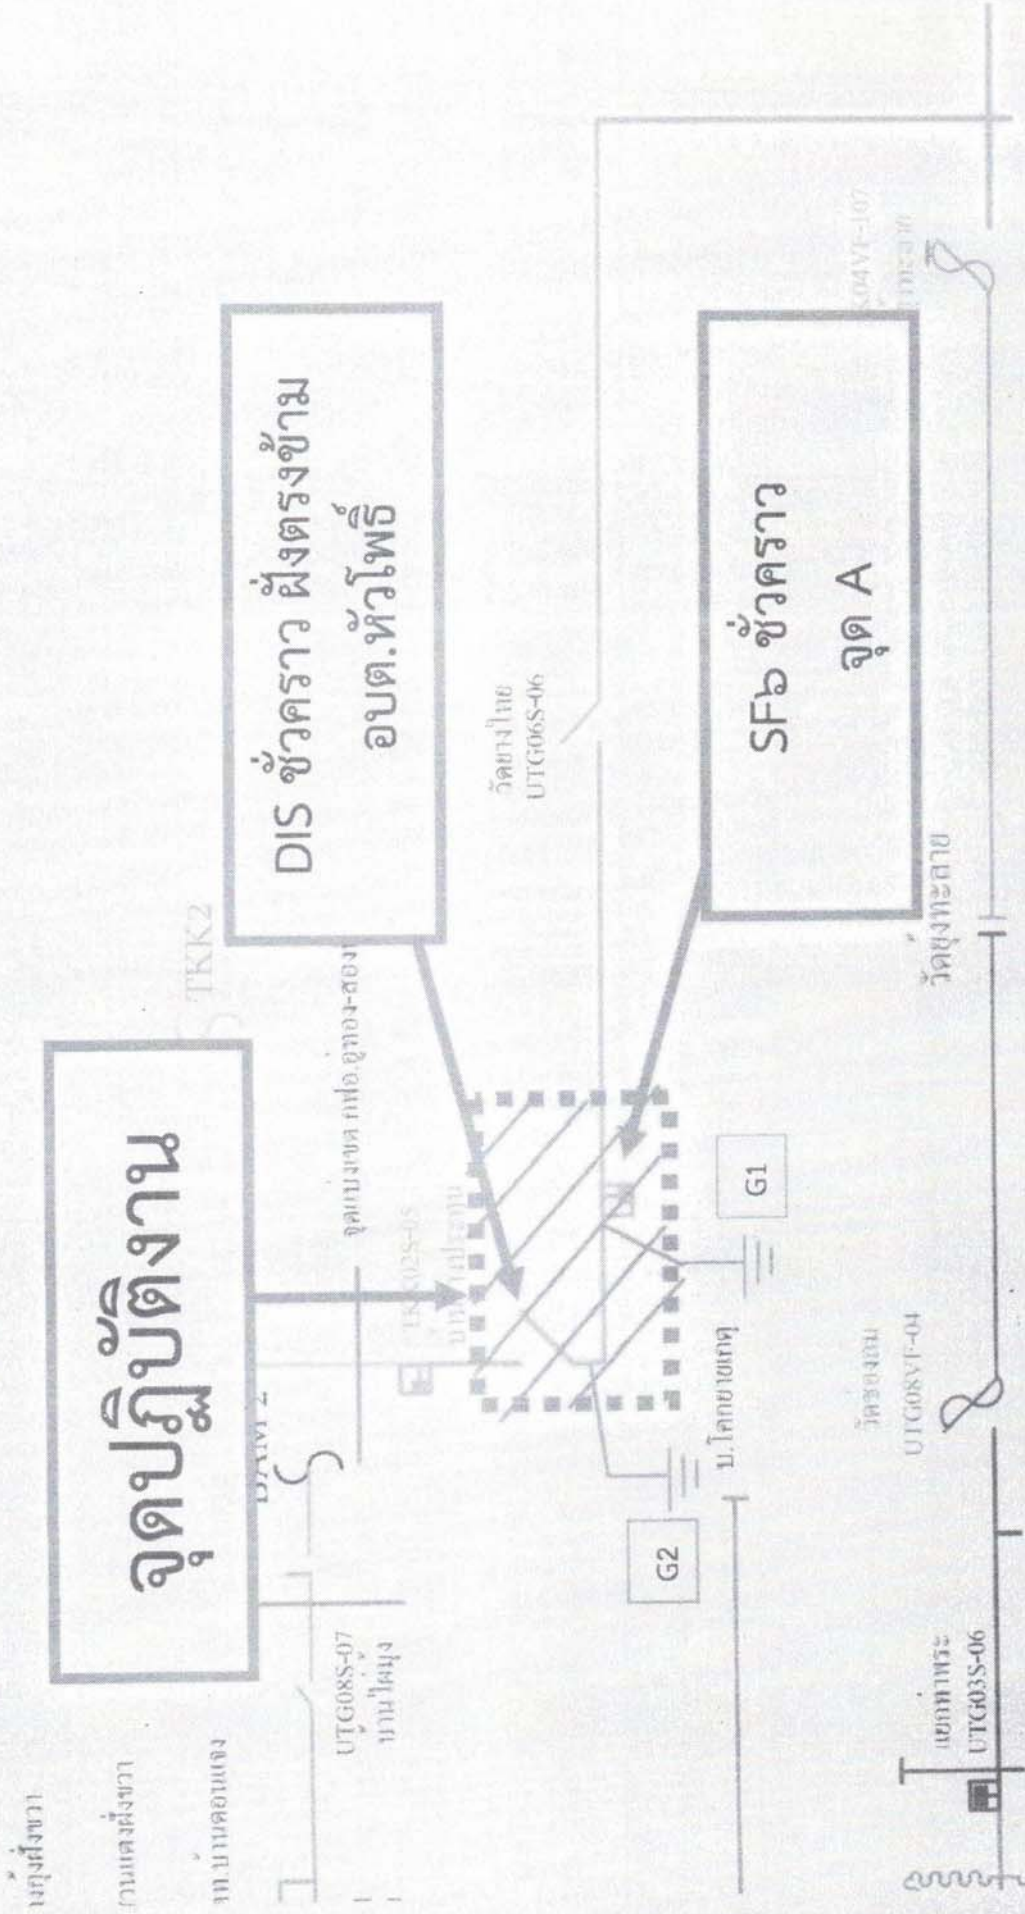

นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิเทศ
ชม.ปบ. กฟอ.อุททอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี..... ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานที่ปฏิบัติ..... ตัดไฟ เพื่อดำเนินการย้ายแนวระบับจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณบ้านรางประทุน

สถานที่..... บริเวณบ้านรางประทุน.

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๕๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกันทางเดือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิตช์.....๔.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑.จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒.สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔.ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ด้วย Voltage Detector - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการต่อไป

.....
นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิทรา
(ผู้ควบคุมงาน)

แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน
