



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ต.กสฟ.(ส.ก.).๖๐๓/๒๕๖๘.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์..พจิราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายเอกสิทธิ์..ศรีธนนันท์.....

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อภ.ปณ.(กต).....
ตำแหน่ง ..อภ.สฟ.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....นางปลว
เพื่อทำการ Overhaul GIS ๑๑๕ kV.. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๘ เม.ย. ๖๘ ถึง ๒ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	นายธนพล ศรีใหม่ ๐๙๒-๐๙๒๔๔๑๑ ผจก.กบส.
๒	๑YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๓	๔YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๕ พ.ค. ๖๘ ถึง ๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	
๔	๔YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๕	๒YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๒ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๖	๒YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๗	๓YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๙ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๘	๓YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๙	BYB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๖ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๔ วัน	
๑๐	BYB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	

ทพ.	หญิงอรุณี ๑ เม.ย. ๖๘
วศก.	นพดล ๔ เม.ย. ๖๘

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลา BUS 1 115 เควี และ TP2 (BAL4YB-01,BAL2BVB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 - 9 พ.ค.68	เวลา	08.00 น.	ถึง	18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	Overhaul GIS 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 124/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	24 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุกษชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- Load 25.60 MW
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- Load 25.06 MW
4	BAL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- Load 5.8 MW
5	BAL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- Load 5.4 MW
6	BAL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- Load 2.5 MW
7	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
8	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
9	SMA13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		- Load 2.8 MW
10	ย้าย BAL06 ไปจ่ายจาก SMA13						
11	BAL06S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
12	BAL06VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
13	ย้าย BAL09 บางส่วนไปจ่ายจาก BAL10						
14	BAL10S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS บ.เอเชียเวิลด์เทค
15	BAL09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ.เอเชียเวิลด์เทค
16	ย้าย BAL09 ไปจ่ายจาก SMA12						
17	SMA12VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		- -
18	BAL09VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
19	ย้าย BAL10 ไปจ่ายจาก SMA09						
20	SMA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		- -
21	BAL10VB-01	สับ	ปลด		BAL		- -
22	ย้าย BAL-TP2 ไปจ่ายจาก BAL-TP1						
23	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		- ขนานบัส
24	BAL02BVB-01	สับ	ปลด		BAL		- INCOMING 2
25	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
26	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี BAL01YS,02YS,03YS,04YS,BYS-01 สถานะ Open						
27	BAL04YB-01	สับ	ปลด		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BAL04YS-02	สับ	ปลด		BAL		- ใบมีด 115 เควี

[illegible]

Shut Down Plan on sigle line diagram

5 - 9 May 2025

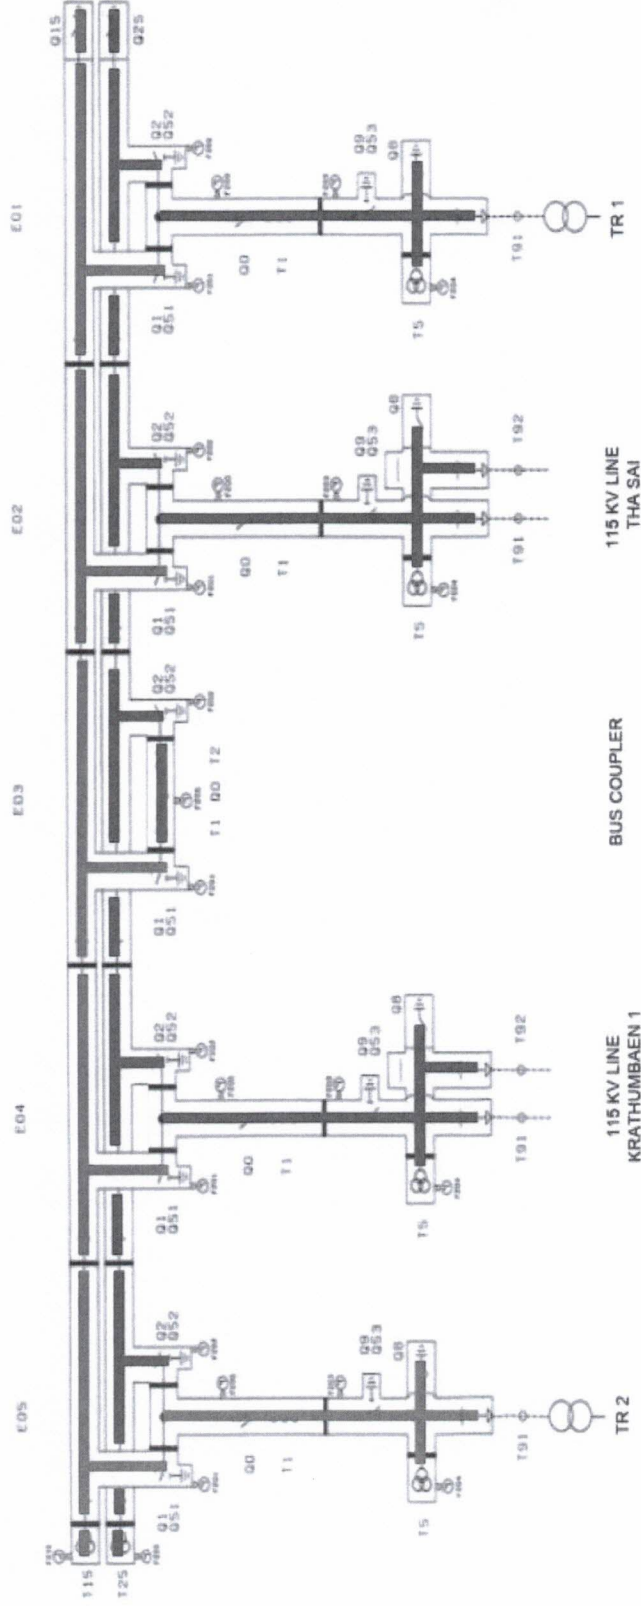

Bang Pla

Task Name	Start	Finish	Equipment Status									
			FES B1	BYG-01	BYG-02	4YS-01	4YS-02	4YS-03	4YS-04	4YS-05	4YS-06	4YS-07
Bang Pla	30-Apr-25	30-May-25	FES B1	BYG-01	BYG-02	4YS-01	4YS-02	4YS-03	4YS-04	4YS-05	4YS-06	4YS-07
4YB-01 // Bay Transformer 2	5-May-25	9-May-25	BYG-01	BYG-02	4YS-01	4YS-02	4YS-03	4YS-04	4YS-05	4YS-06	4YS-07	4YS-08
	10-May-25	10-May-25	BYG-01	BYG-02	4YS-01	4YS-02	4YS-03	4YS-04	4YS-05	4YS-06	4YS-07	4YS-08
