

02/04/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ.) ๗๔๙ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ ฆาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV  
บริเวณปากทางสวนส้ม รหัส SME๐๓YS-๐๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๓YB-๐๒ SME๐๓YB-๐๓	๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV	DDE ปากซอย สวนส้ม	DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม	นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร ตำแหน่ง ทพ.บอ.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๙๘๓๗๗๘๗๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ ฆาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ME๒๒ จาก TASECHANSAKORN ถึง TASECHANSAKORN  
ในวันที่ ๖ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 388/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดีสิทธิ์ เฒ่ามสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร

(นายนิวัฒน์ ฆาประจวบ)  
อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทพ.	มงคลชัย	๑๓ มี.ค. ๖๘
วศก.๗		

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้า 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางสวนส้ม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไข LBS 115 เควี SME03YS-08 (ปากทางสวนส้ม) ตามใบขอปฏิบัติงาน 388/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 30 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์,พีรภัทร,ขุนทอง,พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. สุภัชชา,พิชชา,ณัฐกาญจน์,ศักดิ์สิทธิ์,สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
<b>หมายเหตุ</b> มุ่งงานข้างเคียง 482							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ งานข้างเคียง 482 ดำเนินการสวิตชิงตามแผนแล้วเสร็จ						
3	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
6	ตรวจสอบ LBS 115 เควี SME03YS-08 (ปากทางสวนส้ม) อยู่สถานะ <b>ปลด.ล๊อคกุญแจ</b>						
7	แจ้งชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี ตัด DDE ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟได้						
8	เมื่อชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี แจ้งตัด DDE ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี ตัด DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟได้						
10	เมื่อชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี แจ้งตัด DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม แล้วเสร็จ						
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	ตรวจสอบ งานข้างเคียง 482 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และดำเนินการสวิตชิงตามแผนแล้วเสร็จ						
23	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ตรวจสอบ LBS 115 เควี SME03YS-08 (ปากทางสวนส้ม) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อกกุญแจ</u>						
27	แจ้งชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี เชื่อม DDE ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟได้						
28	เมื่อชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี แจ้งเชื่อม DDE ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
29	แจ้งชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี เชื่อม DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟได้						
30	เมื่อชุดฮอทไลน์ (ศราวุธ) 115 เควี แจ้งเชื่อม DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม แล้วเสร็จ						
31	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS						
32	SME03YS-08	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		สค.		LBS ปากทางสวนส้ม
33	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

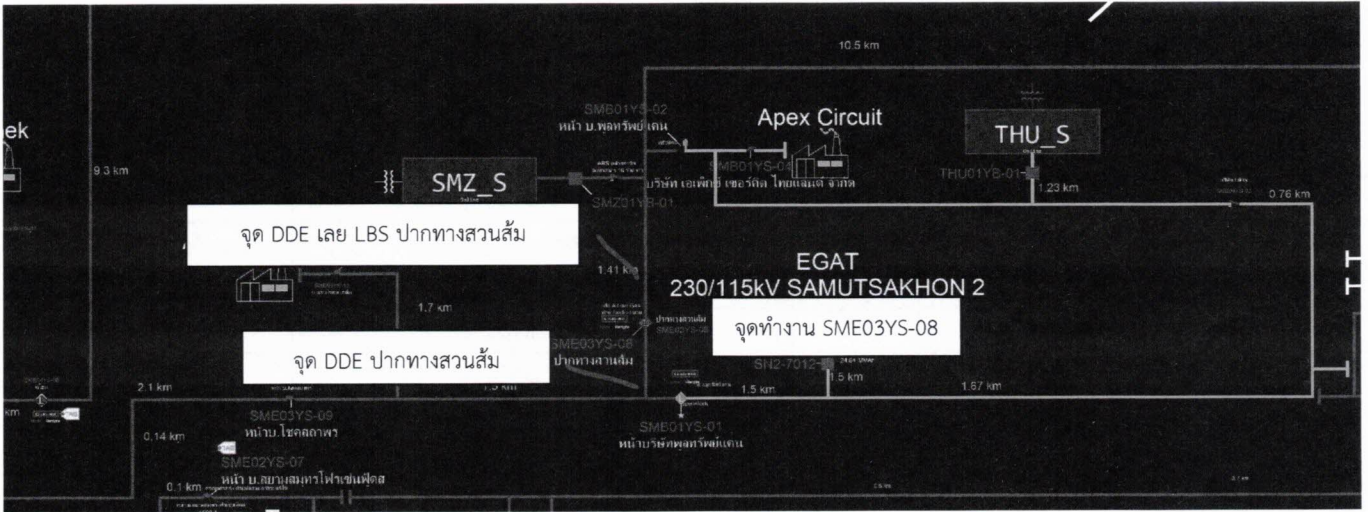

จุด DDE เลย LBS ปากทางสวนส้ม

จุด DDE ปากทางสวนส้ม

จุดทำงาน SME03YS-08
