



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

9 มี.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๑๙๕๕ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณพล

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.น.น.(กต)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี (เปลี่ยนลูกถ้วยแขวน ๑๑๕ เควี) บริเวณ ท้ายนิคมฯ สมุทรสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMZ๐๕	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี (เปลี่ยนลูก ถ้วยแขวน ๑๑๕ เควี) บริเวณ ท้ายนิคมฯ สมุทรสาคร	- SMZ๐๕S-๐๒ หลังนิคมฯ	SMZ๐๕S-๐๓ บ.เอเพ็กเซอร์กิจ	นายสรวิทย์ ชื่นจิตร พช.๗(ฮล) โทร ๐๖๑-๓๙๒๕๕๙๖
๒	SMZ๐๕	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๕S-๐๒ หลังนิคมฯ	SMZ๐๕S-๐๔ หลังนิคมฯ	
๓	SMZ๐๔	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๔S-๐๑ สถานีฯสค.๑๖	SMZ๐๒S-๐๒ หลังนิคมฯ	
๔	SMZ๐๔	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๔S-๐๑ สถานีฯสค.๑๖	SMZ๐๔S-๐๒ หลังนิคมฯ	
๕	SMZ๐๔	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๔S-๐๑ สถานีฯสค.๑๖	SMZ๐๔S-๐๓ บ.ลองเท็กซ์	
๖	SMZ๐๑	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๑S-๐๑ สถานีฯสค.๑๖	SMZ๐๑S-๐๒ ตรงข้าม บ. เจมมานิค	
๗	SMZ๐๑	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMZ๐๑S-๐๑ สถานีฯสค.๑๖	SMZ๐๑S-๐๓ บ.อยู่ยง	
๘	THU๐๔	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๔ ปากซอย ๑๕ (วงจรบน)	SMZ๐๕S-๐๓ บ.เอเพ็กเซอร์กิจ	
๙	THU๐๔	๑๓ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ชั่วคราวเลย ปากทางซอย ๑๕ (วงจรล่าง)	SMZ๐๔S-๐๓ บ.ลองเท็กซ์	
		ไม่ดับ						

๙	๑๑๕ KV	๑๓ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๑YS-๐๓ บ.ลัดก็	SMB๐๑YS-๐๒ หลังนิคมฯ	
๑๐	๑๑๕ KV	๑๓ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๑YS-๐๓ บ.ลัดก็	SMB๐๑YS-๐๔ บ.เอเพ็กเซอร์กิส	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณ นิคมฯสมุทรสาคร ตั้งแต่ ปากซอย ๑๕ ถึง หลังนิคมฯ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พช.จ.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ศค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SM205 จาก SM2055-02 ถึง SM2055-03
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 558/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SM205 จาก SM2055-02 ถึง SM2055-04
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SM204 จาก SM2045-01 ถึง SM2025-02
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ SM204 จาก SM2045-01 ถึง SM2045-02
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ SM204 จาก SM2045-01 ถึง SM2045-03
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พัดเตอร์ SM201 จาก SM2015-01 ถึง SM2015-02
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ SM201 จาก SM2015-01 ถึง SM2015-03
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พัดเตอร์ THC04 จาก THC045-04 ถึง SM2055-03
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 9 พัดเตอร์ 115KV จาก SM001T5-03 ถึง SM001T5-02
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 10 พัดเตอร์ 115KV จาก SM001T5-03 ถึง SM001T5-04
ในวันที่ 17 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรชัย เสนอ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.จิรวัฒน์ ขุนศรี
7 มิ.ย. 68

(
ผคฟ. 3 มิ.ย. 68
อก.๓ กฟภ.๓ น.กฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี THV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-70 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นิคมท่าทราย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 เม.ย. 68		เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศค.	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	558/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง				วันที่	7 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
5	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
6	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
7	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
8	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 kV
9	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load = 1.5 MW
10	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		Load = 3.8 MW
11	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		Load = 1.5 MW
12	SMZ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		Load = 3.9 MW
13	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		Load = 0.4 MW
14	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		Load = 3.6 MW
15	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		Load = 1.4 MW
16	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		Load = 3 MW
17	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		Load = 4 MW
18	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		Load = 2.55 MW
19	THUBR-03	Normal	Nonreclosing		THU		Load = 1.3 MW
20	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		Load = 2 MW
21	ย้ายโหลด SMZ ไปรับไฟจาก SMB12						
22	SMB12S-02	ปลด	สับ		สค.	Scada	SF6 รันกฏูญแฉจากทางสวนส้ม
23	SMZ04VB-01	สับ	ปลด		SMZ	CB	SMZ04
24	ย้ายโหลด SMZ01 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB05						
25	SMB05S-02	ปลด	สับ		สค.	Scada	SF6 ท้ายซอยข้างสถานีฯ สค.2
26	SMB01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	Scada	SF6 หน้า บ.เจมมานิต ซอย20


[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
65	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
66	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
67	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
68	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU			
69	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			เบรกเกอร์ 115 kV
70	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			เบรกเกอร์ 115 kV
71	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
72	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
73	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
74	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
75	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
76	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
77	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
78	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 22 kV จุด G1							
79	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 22 kV จุด G2							
80	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 22 kV จุด G3							
81	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 22 kV จุด G4							
82	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 115 kV จุด G1							
83	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อดกราวด์ 115 kV จุด G2							
84	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
85	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
86	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ			
87	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
88	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU			
89	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT			เบรกเกอร์ 115 kV
90	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
91	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB			
92	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ			
93	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
94	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
95	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
96	จ่ายไฟ 115kV							
97	SMB01YS-03	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สด.		ABS	บริษัท ลักกี้
98	SMB01YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สด.		ABS	หน้า บริษัท APEX Circuit
99	จ่ายไฟ 22kV							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
100	SMZ01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.1
101	SMZ04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS	POT HEAD F.4
102	SMZ01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMZ		CB	SMZ01
103	SMZ05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ประตูลังนิคม
104	SMZ04S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS	หลังนิคม
105	THU04S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS	ปากซอย15
106	ย้ายหม้อแปลงสถานี THU กลับจากรับไฟภายนอก							
107	SW.BYPASS	สับ	ปลด		THU		DIS	THUBR-04
108	THU04S-01/1	ปลด	สับ		THU		DIS	ภายใน THU
109	THU01YS-01	ปลด	สับ		THU			ใบมีด 115 Kv
110	THU01YB-01	ปลด	สับ		THU			เบรกเกอร์ 115 kV
111	ย้ายโหลด THU04 กลับจาก THS15							
112	THUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R	THU04
113	THS03S-06	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	ตรงข้าม บ.แมกซ์เพ้นท์
114	ย้ายโหลด THU03 กลับจาก THS15							
115	THUBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R	THU03
116	THS06S-03	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	ข้าง บ.ลักกี้
117	ย้ายโหลด THU02 กลับจาก THS11							
118	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R	THU02
119	THS08S-04	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	หน้า บ.ที อาร์ ซี
120	ย้ายโหลด THU01 กลับจาก THS13							
121	THUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R	THU01
122	THS10S-02	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	แบ่งเด็กน่ารัก
123	ย้ายโหลด SMZ01 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB05							
124	SMB01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	Scada	SF6	หน้า บ.เจมมานิต ซอย20
125	SMB05S-02	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	ท้ายซอยข้างสถานีฯ สค.2
126	ย้ายโหลด SMB12 กลับจาก SMZ04							
127	SMZ04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMZ		CB	SMZ04
128	SMB12S-02	สับ	ปลด		สค.	Scada	SF6	ร้านกัญแจปากทางสวนส้ม
129	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
130	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
131	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
132	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
133	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU			
134	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			
135	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
136	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
137	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
138	SMZ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
139	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
140	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
141	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
142	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
143	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU			
144	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU			
145	THUBR-03	Nonreclosing	Normal		THU			
146	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์การขาดแคลนพลังงาน

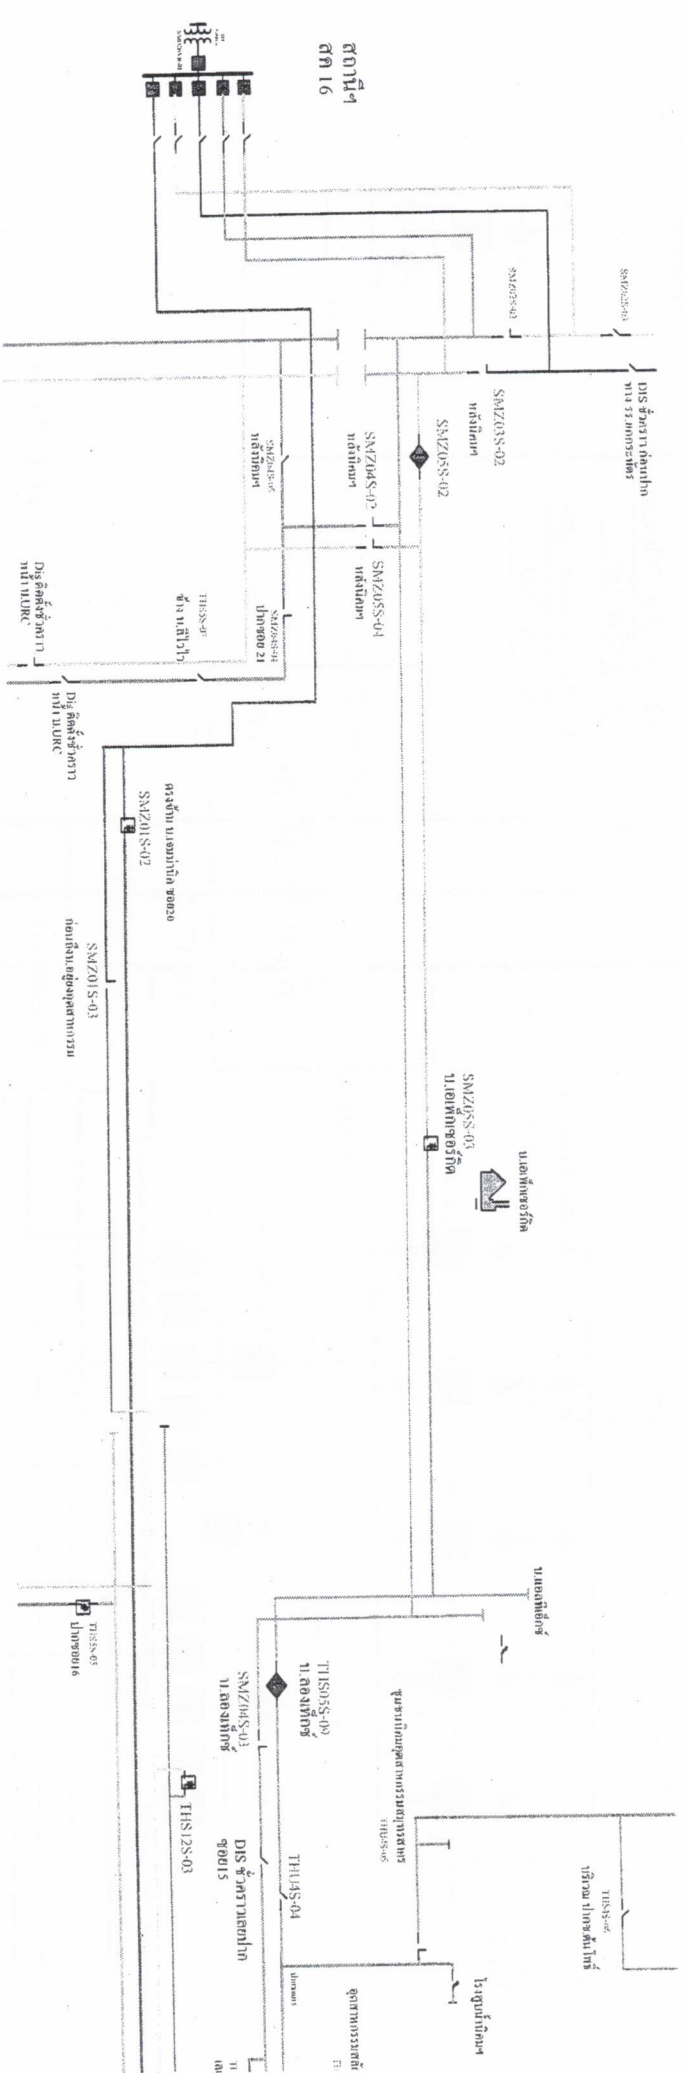

สถานการณ์จ่ายไฟฟ้าตอมปฏิบัตงาน

นางสาวสุภาวดี

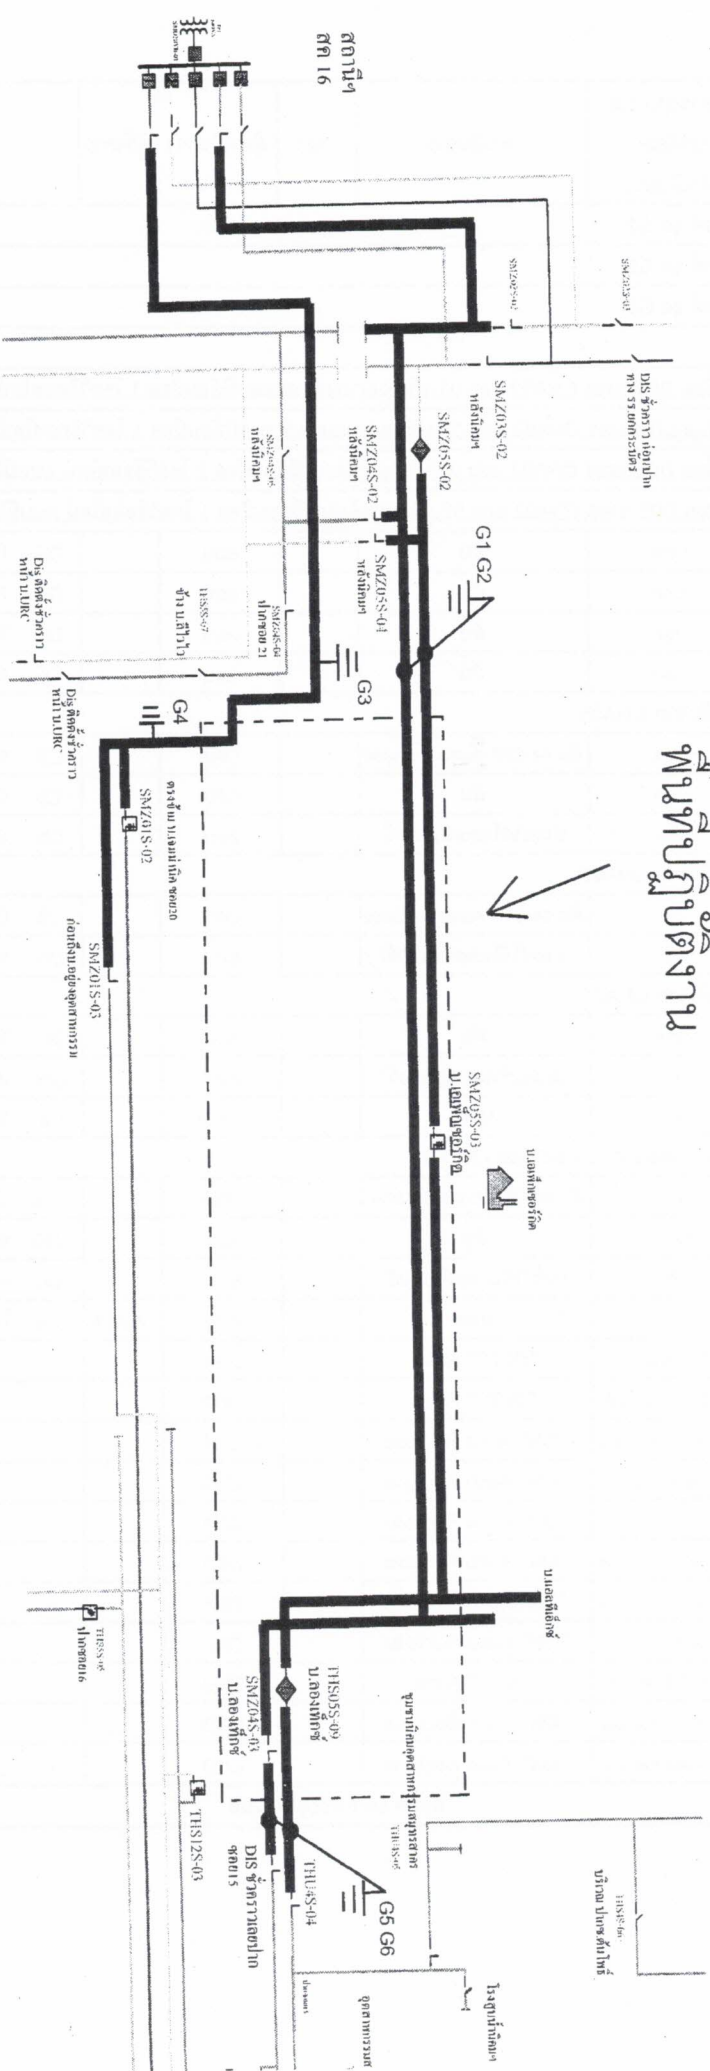

สถานะการจ่ายเฟกอนปฏิบัตงาน

115/22 kV
พาทราย 2

1x50 MVA
16.41 MW

11. A PEX

SMB1YS-02

หม้อแปลง

พิกัด 1,200 A

SMB1YS-04

CIRCUIT

15.87 MW

180 m

300 m

1.74 km

2*400 mm²

1.23 km

SMB1YS-03

11. ลัด

370 m

300 m

สถานะการจ่ายไฟฟ้าตอนปฏิบัติงาน

115/22 kV
ท่าทราย 2

SMB1YS-02

๑.๕ PEX 16.41 MW

หลังใบเคมฯ
พิกัด 1,200 A


SMB1YS-04

CIRCUIT

15.87 MW

SMB1YS-03

๑.๕๕๓

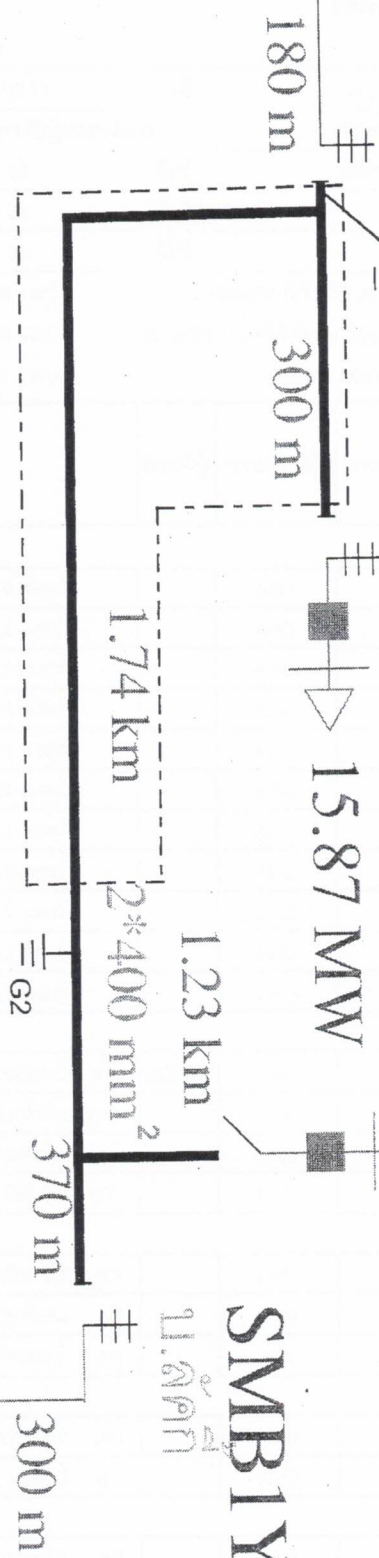

พื้นที่ปฏิบัติงาน
