



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) 3๓6 /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB3YB	24 - 26 เม.ย. 68	08.00	17.00	ติดตั้งลูกถ้วย Line Post UG 115 kV/ มอเตอร์เวย์สำโรง	- NCB3YB-01	- NCB3YS-05	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.5 ผบ.กฟส.นช. 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสรื้อ

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๓๙๓๓๒๕ Long ๑๐๐.๑๙๓๓๔๐๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๓๙๓๓๒๕ Long ๑๐๐.๑๙๓๓๔๐๓

(นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก NCB03YS-01 ถึง NCB03YS-05
ในวันที่ 24-26 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 625/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิร ไชยภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส.พัชรา พงษ์แผ้ว
23 เม.ย. 68

(นาย จิรวัฒน์ ไชยภักดิ์)
วต. 5 แผนก ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. คฟ๕-๔๕

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 10 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 09-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

บริเวณมอเตอร์เวย์สำโรง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

บริเวณมอเตอร์เวย์สำโรง

24-26 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
กฟส.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 625/68	
	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	23 เมษายน 2568	
				วันที่	23 เมษายน 2568	
				วันที่	23 เมษายน 2568	
1. น.ส.สุภัทษา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
3. นายพิรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	กฟส.นช. ทำการติดตั้งลูกถ้วย 115 เควี บริเวณมอเตอร์เวย์สำโรง วันที่ 24-26 เม.ย. 68 (ดับเข้า-จ่ายเย็น)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCB03YB-01 อยู่สถานะ "ปลด" และใบมีด NCB03YS-02 อยู่สถานะ "ปลด"						
7	NCB03YS-05	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		นช.	ABS	ปากทางวัดเสถียร
8	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
9	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G2						
13	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย, ปฏิบัติงานได้						
14	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุด G2						
19	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
22	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
23	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
24	NCB03YS-05	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		นช.	ABS	ปากทางวัดเสถียร
25	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ติดตั้งลูกถ้วย Line Post UG 115 kV			
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน มอเตอร์เวย์สำโรง			
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.			
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี			
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)			
ชื่อ นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี			
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๙๕๔๔-๓๕๓๙		ชื่อเรียกขานทางวิทยุ U-๒	
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า			
ตำแหน่ง วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี		เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๓๖-๑๔๒๐๓ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กฟภ.ผู้รับจ้าง			
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)			
๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑		ผู้รับผิดชอบ	
จุดที่ ๒	ผู้รับผิดชอบ	จุดที่ ๓	ผู้รับผิดชอบ
จุดที่ ๔	ผู้รับผิดชอบ	จุดที่ ๕	ผู้รับผิดชอบ
จุดที่ ๖	ผู้รับผิดชอบ	จุดที่ ๗	ผู้รับผิดชอบ
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching			
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....			
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....			
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่			
☒ ไม่มีข้อทักท้วง ☐ ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....			
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง			
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่			
☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....			
☒ จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น ๑			
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ชก.(ท) , ผบ.บ., กรย.(กท), จป. และ ผู้รับจ้าง			
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่			
☐ ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....			
☒ ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘			

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

(นายชลิต สีขาวขำ)

พ.บ.กฟส.นครชัยศรี


สถานการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

สถานีเ้านครชัยศรี 2

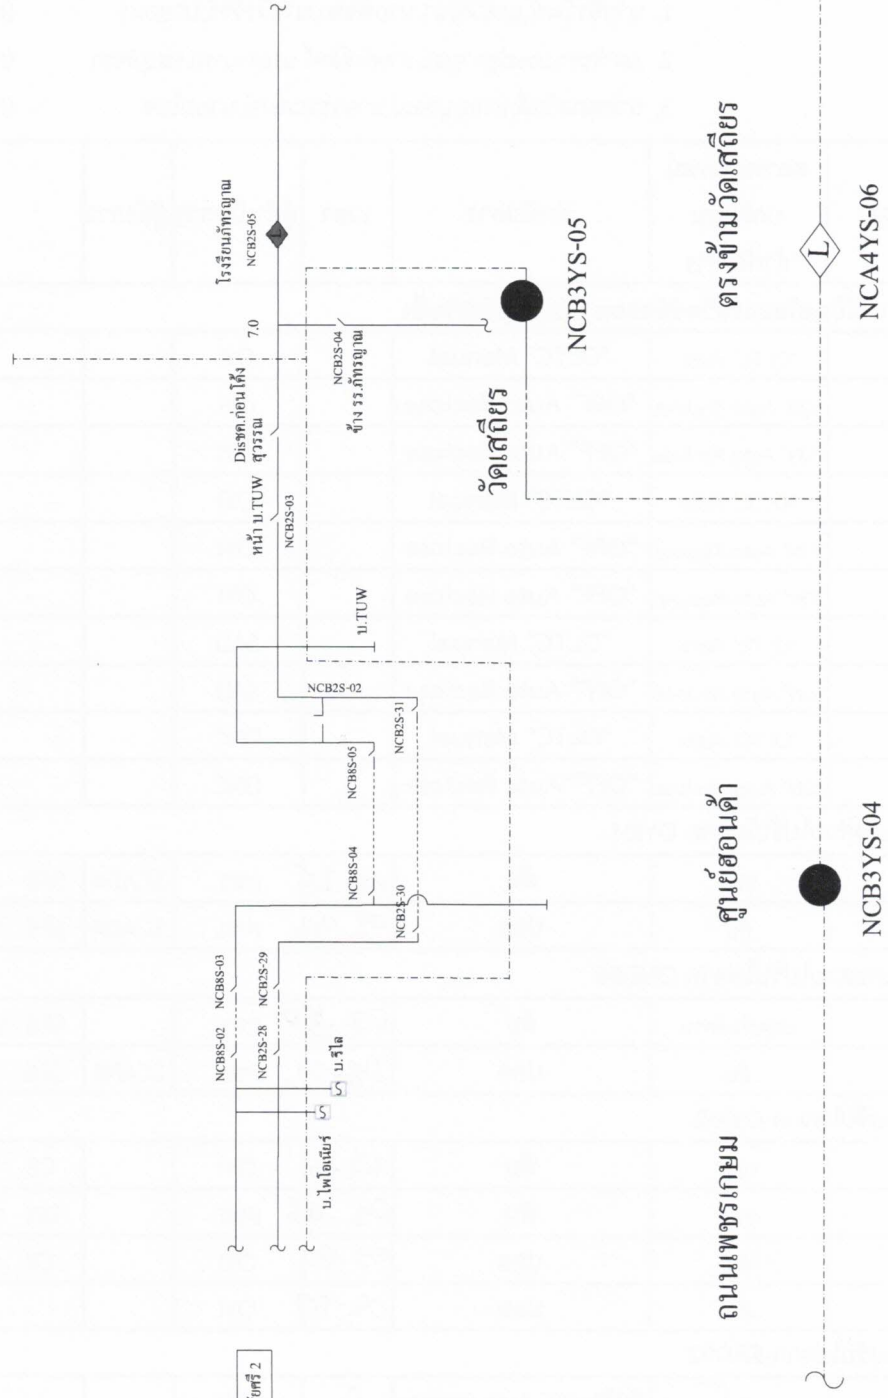

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

สถานีควบคุมรถไฟ 2

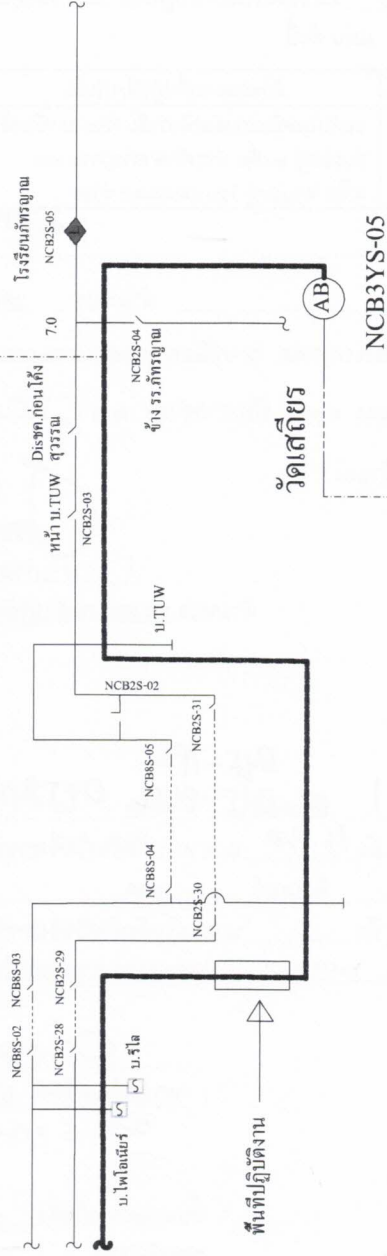

ถนนเพชรเกษม

ศูนย์สอนต้า

ตรงข้ามวัดเสถียร

NCB3YS-04

NCB3YS-05

NCA4YS-06



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(ก๓)

ถึง กปป.(ก๓)

เลขที่ ก.๓ กรย.(จส) ๑๐๐๕/๒๕๖๘

วันที่

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดับไฟเพื่อเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) งานจ้างเหมา
ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑.๕ kV ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข ๘๑ บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง
หมายเลข ๓๒๓๓ (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เรียน อ.ก.บ.(ก๓)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จก.๓ (ผกม) ๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีวเจอร์ เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑.๕ kV ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข ๘๑ บริเวณก่อสร้างทางเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๓ (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นั้น

ตามหนังสือที่ FPC-PEA-001/2568 ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างแจ้งขอดับไฟระบบ
๑๑.๕ เควี เพื่อดำเนินการเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน และมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน กรย.(ก๓) จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์จ่ายไฟ กปป.(ก๓) ดับไฟระบบ ๑๑.๕ เควี บริเวณ
จุดก่อสร้างงานดังกล่าว เพื่อเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖
เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. (ดับกระแสไฟฟ้าตอนเช้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าตอนเย็น) โดย
มอบหมายให้นายวัชร เวทีภิรมย์ พง.๖ ผจส.กรย.(ก๓) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๕๓๒-๓๓๓๖ เป็น
ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

อ.ก.รย.(ก๓)

ที่ ก.๓ กรย.(จส) ๑๐๐๕/๒๕๖๘

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.นครชัยศรี (M)

เพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)

อ.ก.รย.(ก๓)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘



กรณ.(กต)	19/6
เลขที่รับ	
วันที่	9 เม.ย. 68
เวลา	

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

เลขที่ FPC-PEA-001/2568

7 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งขอดับไฟเพื่อติดตั้งนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal)
ข้างหมากก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เรียน ผู้ควบคุมงาน (คุณจักรพันธ์ นรเหรียญ) ตำแหน่ง พชง.6 ผจส.กรย.(ก3)
อ้างถึง

- (1) สัญญาจ้างเลขที่ จก.3(ผกม) 51/2567 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567
- (2) แผนงานดับไฟเพื่อติดตั้งนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal)

ตามอ้างถึง (1) ทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้ง บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีรายละเอียดตามความเจ้านั้น

สืบเนื่องจากปัจจุบันหน้างานก่อสร้างได้ดำเนินการคั่นท่อลอดและขึ้นชุด Cable Riser เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตั้งชุดนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสารอ้างถึง (2) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อติดตั้งนั่งร้าน และดับไฟระบบ 115 เควี เพื่อดำเนินการเจาะรูเสาตามแผนงานที่ได้รับอนุญาตไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นาย วสันต์ ละหุ่ง)

ผู้จัดการภาคสนาม

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง


โทรศัพท์ 02-242-5800 ต่อ 5925 โทรสาร 02-243-4072

ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

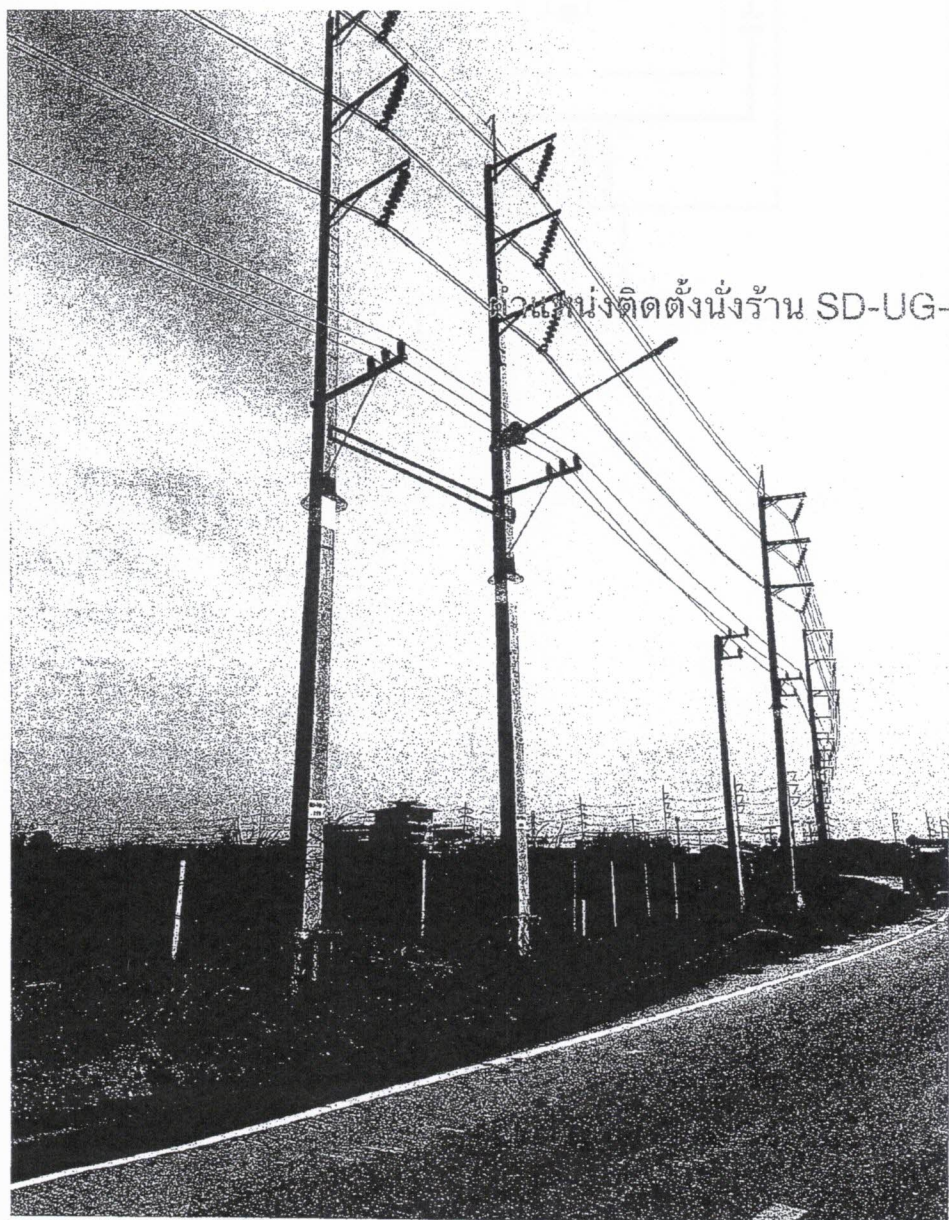

ตำแหน่งติดตั้งนักร้าน SD-UG-5


ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

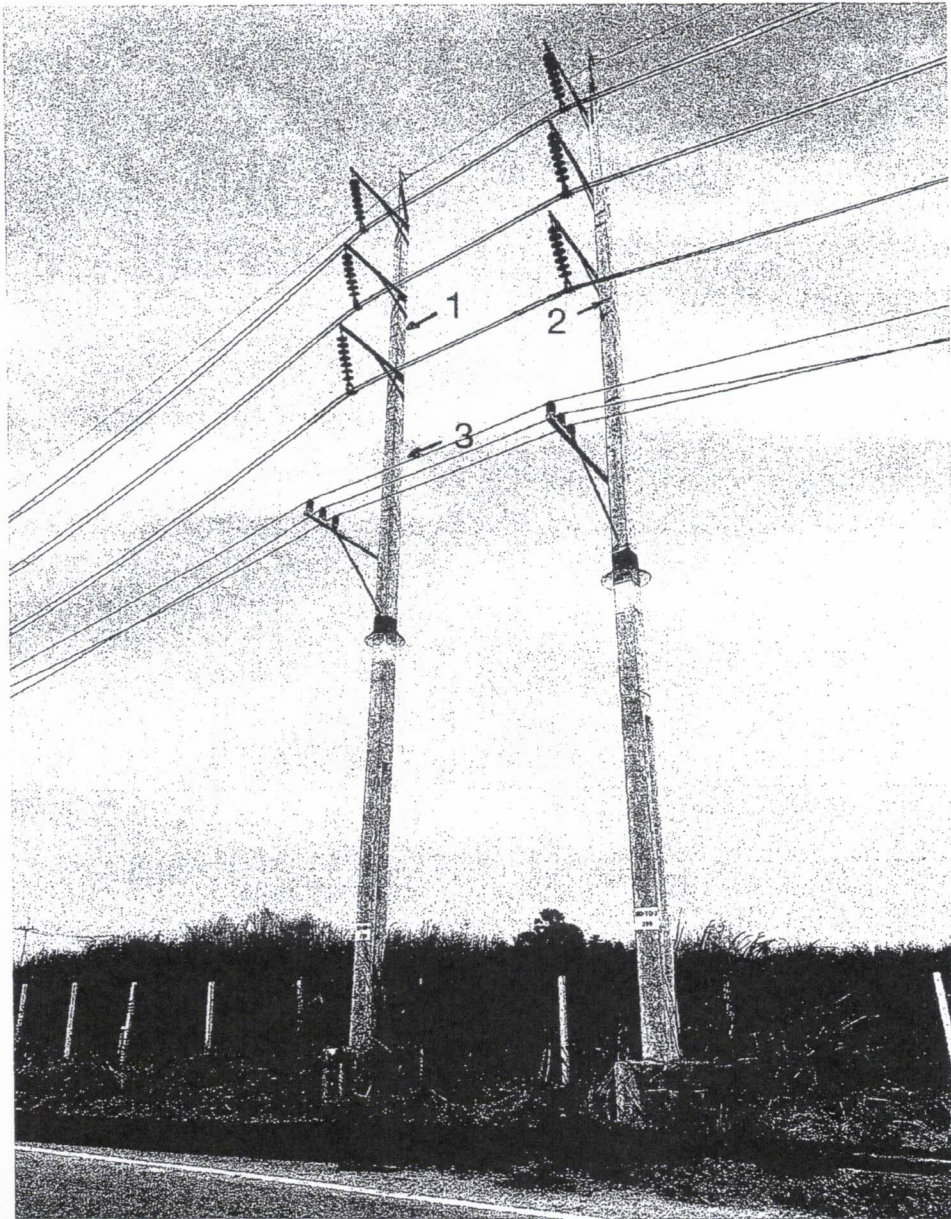

ตำแหน่งเจาะรูเสาสำหรับลูกถ้วย Line post

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

โทรศัพท์ 02-242-5800 ต่อ 5925 โทรสาร 02-243-4072


ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

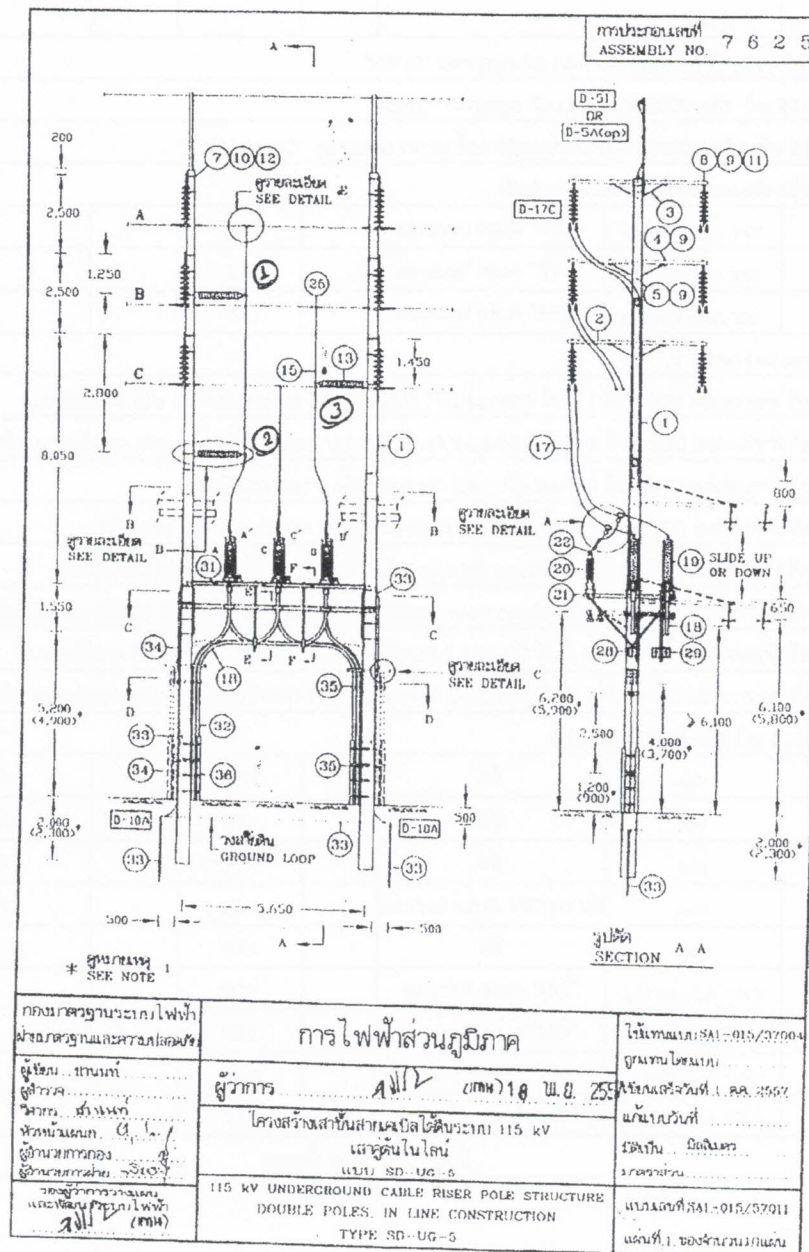

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

โทรศัพท์ 02-242-5800 ต่อ 5925 โทรสาร 02-243-4072



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PAGASA ELECTRICITY AUTHORITY

แผนงานก่อสร้างงานไฟฟ้า

จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ได้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี)

เตรียมหาไฟฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม



PUBLIC POWER
CONSTRUCTION

รายการ	เริ่มทำ	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เวลาดำเนินงาน		ม.ค.-68											หมายเหตุ		
				เริ่ม	จบ	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
งานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ได้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี)	21 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	6																
งานติดตั้งตู้แรงดัน SD-UG-5	21 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	3																
จุดรับแรง P1 (SD-UG-5)	21 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	1	08:00 น.	17:00 น.														จัดไฟ Line 22 kV
จุดรับแรง P2 (SD-UG-5)	22 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	2	08:00 น.	17:00 น.														
ติดตั้งตู้แรงดัน Line Post	24 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	3	08:00 น.	17:00 น.														จัดไฟ Line 115 kV
งานติดตั้งตู้แรงดัน Line Post (P1)	24 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	1	08:00 น.	17:00 น.														
งานติดตั้งตู้แรงดัน Line Post (P2)	25 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	2	08:00 น.	17:00 น.														

หมายเหตุ :

หน้า 1 (ต่อหน้า)
