

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย หอระตะ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก3)

ตำแหน่ง หจก.คพ.

ด้วย กปป. (ก3) จะดำเนินการตัดไฟสายส่ง 115 เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	18 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 115 เควี	KCB01YB-01,02	SYA02YB-01 KCB02YS-11

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภุชณะศักดิ์ รักเนตรสาคร ตำแหน่ง ขผ.คพ. โทร. -

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปป.(ก.3)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SYA02YB-01

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก KCB0145-01, 02 ถึง KCB0245-11

ในวันที่ 18 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสรีรซึ่งเลขที่ 628/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ ^{ข้อมูล} นาย ^{ผู้รับ} อดิษฐ์ อดิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ^{นาย} นามกฤษณะศักดิ์ โภคินทรสวัสดิ์

สุวิภา
(นางสาวสุวิภา วงศ์บุญกลาง)
วอน. 5 แทน พ.พ.ก.

สำหรับผู้สมัคร

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผอ. กพร. กอ , กพร. ทบด. , กพร. ตมท.

nnn. ann.

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแบบ 8 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KCB, KCC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 เควี KCB-KCC					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	628/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกษิชา วงศ์บุญมาก			วันที่	13 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,วรรณพงศ์,นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	แจ้ง กฟส.ทยค. แจ้งให้ ปตท. ทำการปลดโหลด ออกก่อนเวลา 08.00 น.						
	แจ้ง กฟส.ทยค. แจ้งให้ บ.คอนเซอร์เวชั่น (SYA02,06,09) ทำการหยุดขนานไฟเนื่องจากเกิด Unbalance						
	แจ้ง กฟส.กจ. แจ้งให้ บ.กาญจนบุรีไปโอ โครงการ 2 (KCC08) ทำการหยุดขนานไฟ						
	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
1	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
2	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 1.34 MW
3	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 7.15 MW
4	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 5.81 MW
5	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 3.99 MW
6	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.63 MW
7	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.8 MW
8	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 0.68 MW
9	KCC01CVB-01	Auto	Manual		KCC		- CAP1
10	KCC02CVB-01	Auto	Manual		KCC		- CAP2
11	KCC05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
12	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 0.33 MW
15	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.24 MW
16	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.23 MW
17	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.41 MW
18	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		-
19	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 1.84 MW
20	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 0.19 MW
21	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
22	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- โหลด 1.95 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.		R TTN01 (0.32 MW)
25	SYA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
26	KCC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
27	KCC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
28	KCB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		-
29	ย้ายโหลดวงจร KCC08 ไปรับไฟจากวงจร DMA05 และ ย้ายโหลดวงจร KCC09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร DMA05						
30	DMA05S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
31	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 วิทยาลัยการเกษตร
32	DMA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS แยกบ้านยาง
33	KCC08VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB
34	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KCA04						
35	KCC03S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ก.ม. 9
36	KCC03S-07	สับ	ปลด		ลญ.		SF6 NT ลาดหญ้า
37	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KCC05						
38	KCC03S-05	ปลด	สับ		ลญ.		DIS โรงน้ำแข็งลาดหญ้า
39	KCC03VB-01	สับ	ปลด		KCC		- -
40	ย้ายโหลดวงจร KCC05 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KCA10						
41	KCA10S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
42	KCC05S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ชุมประตูดวดหนองบัว
43	ย้ายโหลดวงจร KCC07 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KCC09						
44	ปัจจุบันวงจร KCC04 ทั้งหมด รับไฟจากวงจร KCC07						
45	KCC07S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS หลังโรงแรมเฟลิ็กซ์
46	KCC07VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB
47	ย้ายโหลดวงจร KCC09 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KCA06						
48	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
49	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
50	KCA06S-13	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
51	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
52	KCC09VB-01	สับ	ปลด		KCC		- -
53	ย้ายโหลดวงจร KCC01 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก KCC10						
54	KCC01S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าสถานี (F1-F10)
55	KCC01VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB -


[illegible]


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ประสานงาน รับทราบ						
92	แจ้งชุด HL 115 เควี ทำการปลด DDE จุดที่ 1 ดันที่ SD-AS-3-33 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีไฟ ตามผังแนบ						
93	เมื่อชุด HL 115 เควี ทำการปลด DDE จุดที่ 1 ดันที่ SD-AS-3-33 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
94	แจ้งชุด HL 115 เควี ทำการปลด DDE จุดที่ 2 ดันที่ SD-LA-2-88 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีไฟ ตามผังแนบ						
95	เมื่อชุด HL 115 เควี ทำการปลด DDE จุดที่ 2 ดันที่ SD-LA-2-88 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แบบไม่มีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
96	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		-
97	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
98	แจ้งชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 3 ดันที่ SD-LA-2-145 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
99	เมื่อชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 3 ดันที่ SD-LA-2-145 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
100	เมื่อผู้ประสานงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ (พร้อมรับไฟเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ)						
101	แจ้งชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 ดันที่ SD-LA-2-88 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
102	เมื่อชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 ดันที่ SD-LA-2-88 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
103	แจ้งชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 ดันที่ SD-AS-3-33 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
104	เมื่อชุด HL 115 เควี ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 ดันที่ SD-AS-3-33 เข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
105	จ่ายไฟสายส่ง KCB-KCC จากนั้นปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB02YB-01,02						
106	KCB02YS-10	ปลด, ล็อกกุญแจ	ล๊ับ		กจ.		ABS ตรงข้ามบ้านลาดทอง
107	KCB01YS-02	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
108	KCB01YS-03	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
109	KCB01YS-07	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ใบมีด 115 เควี
110	KCB01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	KCB01YB-02	ปลด	ล๊ับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	KCB02YB-01	ล๊ับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
113	KCB02YB-02	ล๊ับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	KCB02YS-02	ล๊ับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
115	KCB02YS-03	ล๊ับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
116	KCB02YS-07	ล๊ับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
117	เมื่อพร้อมย้ายโหลดสถานี กากูจนบุรี 3 และสถานี ไทรโยค กลับสภาพปกติ						
118	KCC01YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		- ใบมีด 115 เควี
119	KCC01YS-02	ปลด	ล๊ับ		KCC		- ใบมีด 115 เควี
120	KCC04YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		- ใบมีด 115 เควี
121	KCC03YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		- ใบมีด 115 เควี
122	KCC03YS-02	ปลด	ล๊ับ		KCC		- ใบมีด 115 เควี
123	KCC03YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	KCC01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCC		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
125	แจ้ง กฟส.ทยค. แจ้ง ปตท.ว่าจะดำเนินการจ่ายไฟ						
126	เมื่อ ปตท. ยืนยันพร้อมรับการจ่ายไฟ						
127	KCB02YS-11	ปลด,ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		ทยค.		LBS วัดสิงห์
128	ย้ายโหลดสถานีฯ ไทรโยค กลับตามสภาพปกติ						
129	SYA02YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SYA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
130	SYA01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SYA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
131	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดัน SYA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
132	ย้ายโหลดวงจร SYA01,02,03,05 ทั้งหมด กลับจากวงจร TTN01						
133	SYA1BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SYA		CB INCOMING 1
134	SYA01S-05	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.		SF6 แยกทัพติลา
135	ย้ายโหลดวงจร SYA06,07,09,10 ทั้งหมด กลับจากวงจร KCA03						
136	SYA0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SYA		CB ขนานบัส
137	KCC01S-07	ล๊ับ	ปลด		ทยค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหน้าวัดสันติธรรม
138	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 3 กลับตามสภาพปกติ						
139	KCC04YB-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดัน KCC-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
141	ย้ายโหลดวงจร KCC06 ทั้งหมด กลับจากวงจร KCA03						
142	KCC2BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		CB INCOMING 2
143	KCC02CVB-01	Manual	Auto		KCC		- CAP2
144	ย้ายโหลดวงจร KCC02 ทั้งหมด กลับจากวงจร KCA05						
145	KCC0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KCC		CB ขนานบัส
146	KCA05S-08	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง
147	KCC01GVB-01	Manual	Auto		KCC		- CAP1
148	ย้ายโหลดวงจร KCC01 ทั้งหมด กลับไฟจาก KCC10						
149	KCC01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCC		CB -
150	KCC01S-02	ล๊ับ	ปลด		กจ.		DIS หน้าสถานีฯ (F1-F10)
151	ย้ายโหลดวงจร KCC09 ทั้งหมด กลับจากวงจร KCA06						
152	KCC09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCC		- -
153	KCABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KCA		- ขนานบัส
154	KCA06S-13	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
155	KCABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
156	KCA03S-06	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
157	ย้ายโหลดวงจร KCC07 ทั้งหมด กลับจากวงจร KCC09						
158	KCC07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCC		CB
159	KCC07S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หลังโรงแรมเฟลิกซ์


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
160	ย้ายโหมตวงจร KCC05 บางส่วน กลับจากวงจร KCA10						
161	KCC05S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ชุ่มประตูดัดหนองบัว
162	KCA10S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามวัดท่าพะเนียด
163	ย้ายโหมตวงจร KCC03 บางส่วน กลับจากวงจร KCC05						
164	KCC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCC		-
165	KCC03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหมตบัสเตอร์)		ลญ.		DIS โรงน้ำแข็งลาดหญ้า
166	ย้ายโหมตวงจร KCC03 บางส่วน กลับจากวงจร KCA04						
167	KCC03S-07	ปลด	สับ		ลญ.	SCADA	SF6 NT ลาดหญ้า
168	KCC03S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ก.ม. 9
169	ย้ายโหมตวงจร KCC08 กลับจากวงจร DMA05 และ ย้ายโหมตวงจร KCC09 บางส่วน กลับจากวงจร DMA05						
170	KCC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCC		CB
171	DMA09S-08	ปลด	สับ		กจ.		DIS แยกบ้านยาง
172	DMA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 วิทยาลัยการเกษตร
173	DMA05S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
174	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
175	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
176	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
177	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
178	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
179	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
180	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
181	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
182	KCC05R-02	Normal ,ALT	Normal		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
183	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
184	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
185	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
186	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
187	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
188	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
189	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-
190	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
191	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
192	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
193	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-


[illegible]



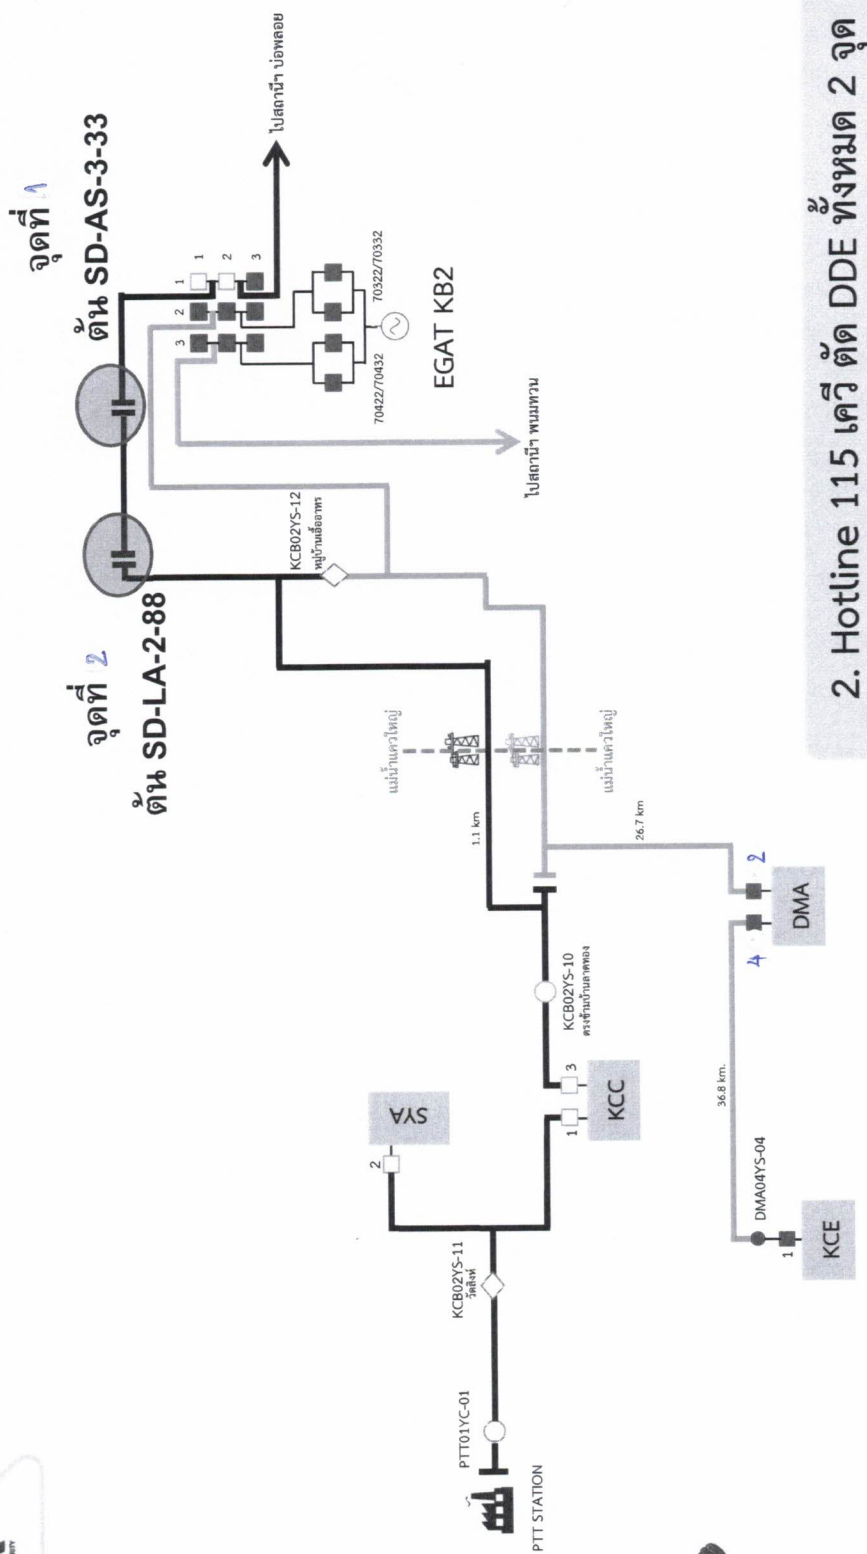



2. Hotline 115 เควี ดีดี DDE ทั้งหมด 2 จุด



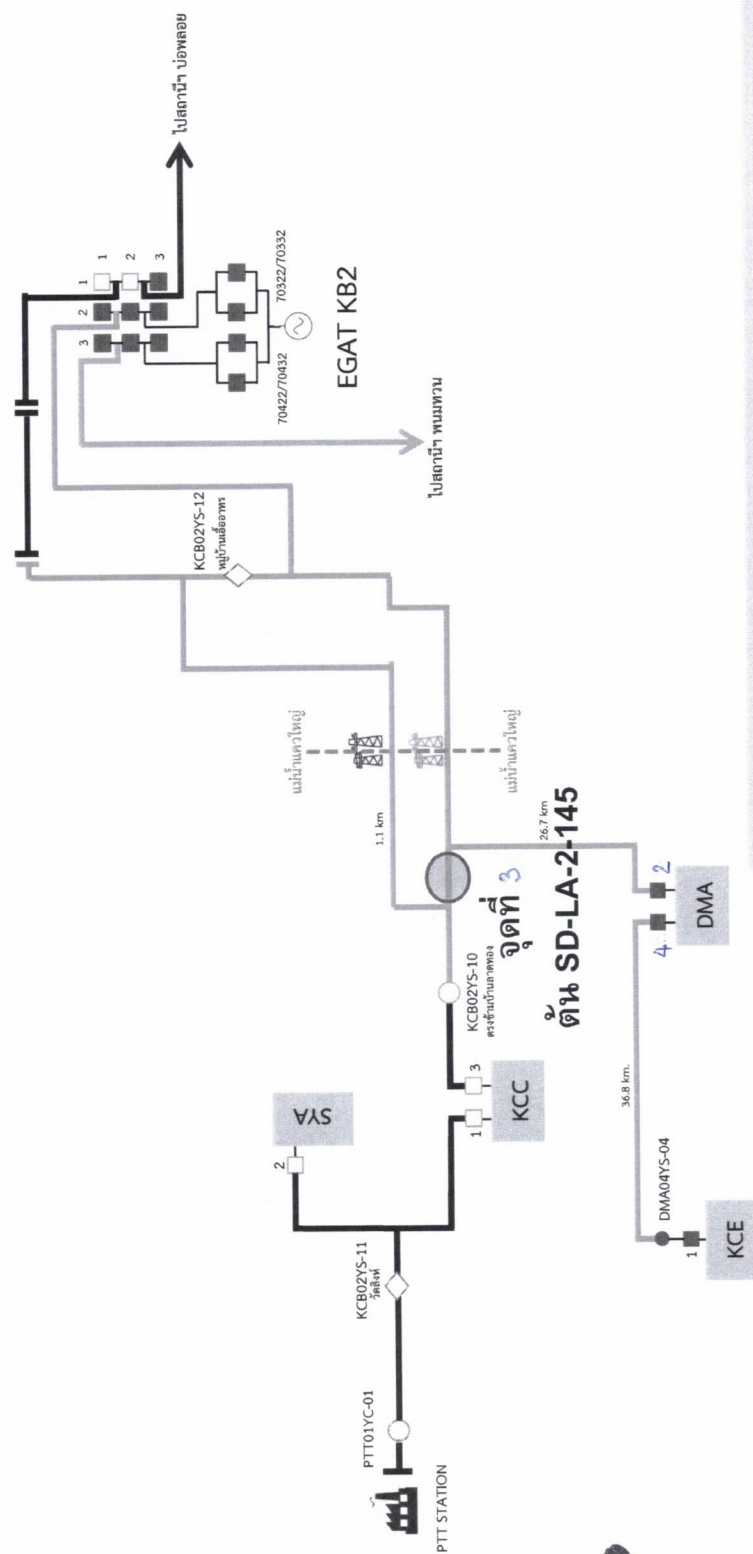


3. Hotline 115 เครือ เชื่อม DDE จุดที่ 3 แบบมีไฟ




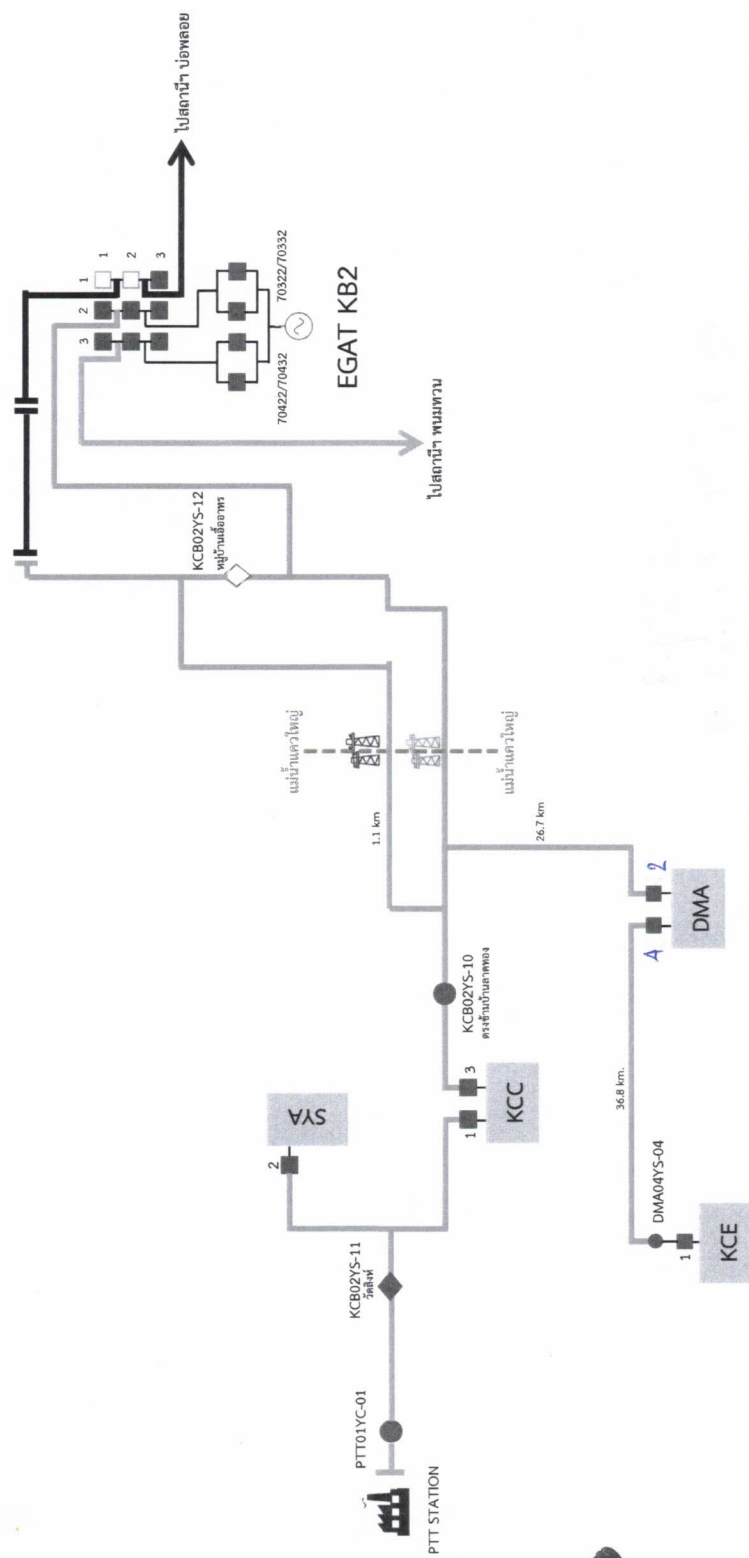


4. ย้ายโหลดจ่ายไฟ สฟ.กาญจนบุรี 3, สฟ.ไทรโยค และ ปตท.

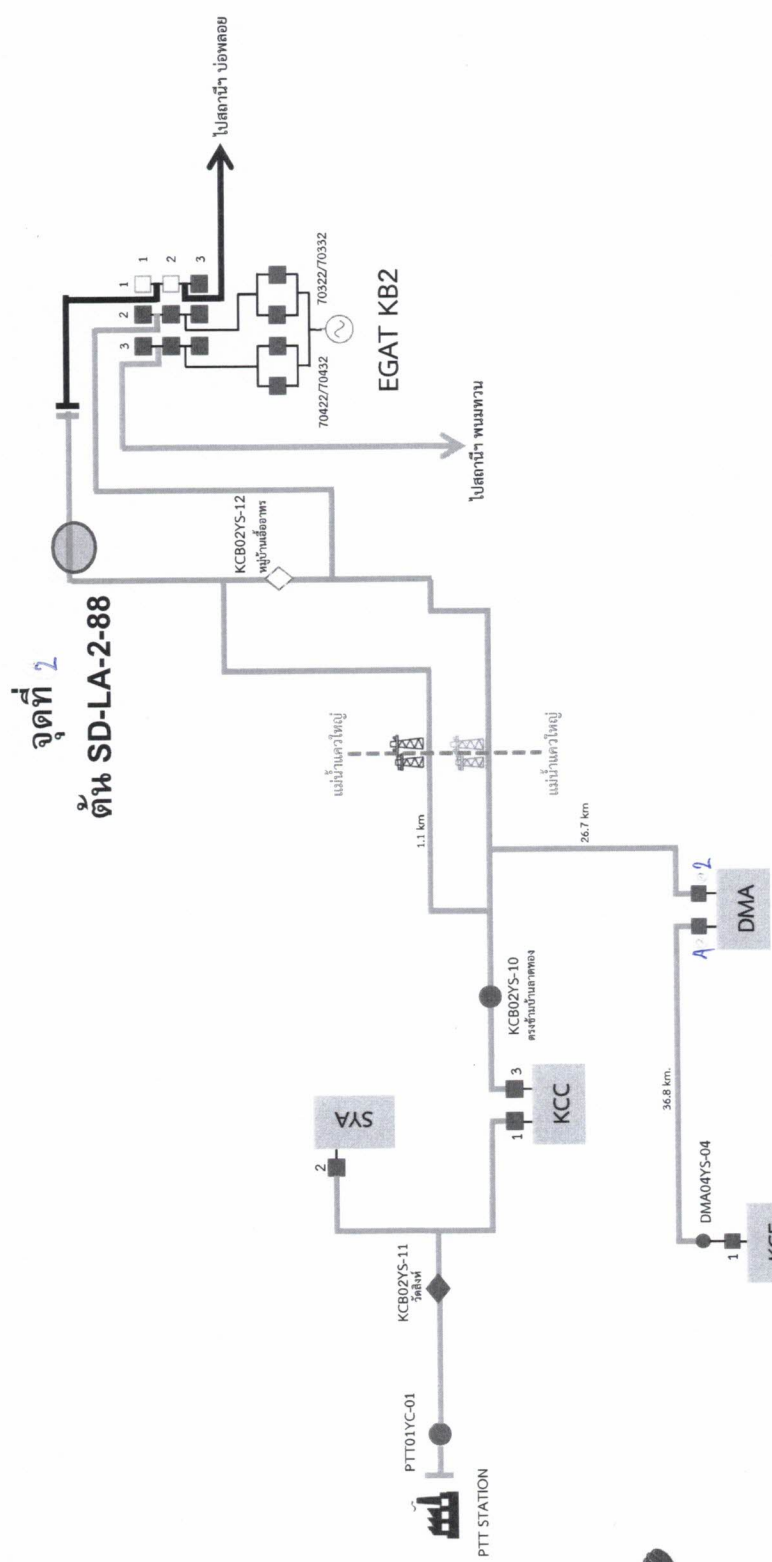



5. Hotline 115 เควี เชื่อม DDE จุดที่ 1 แบบมีไฟ



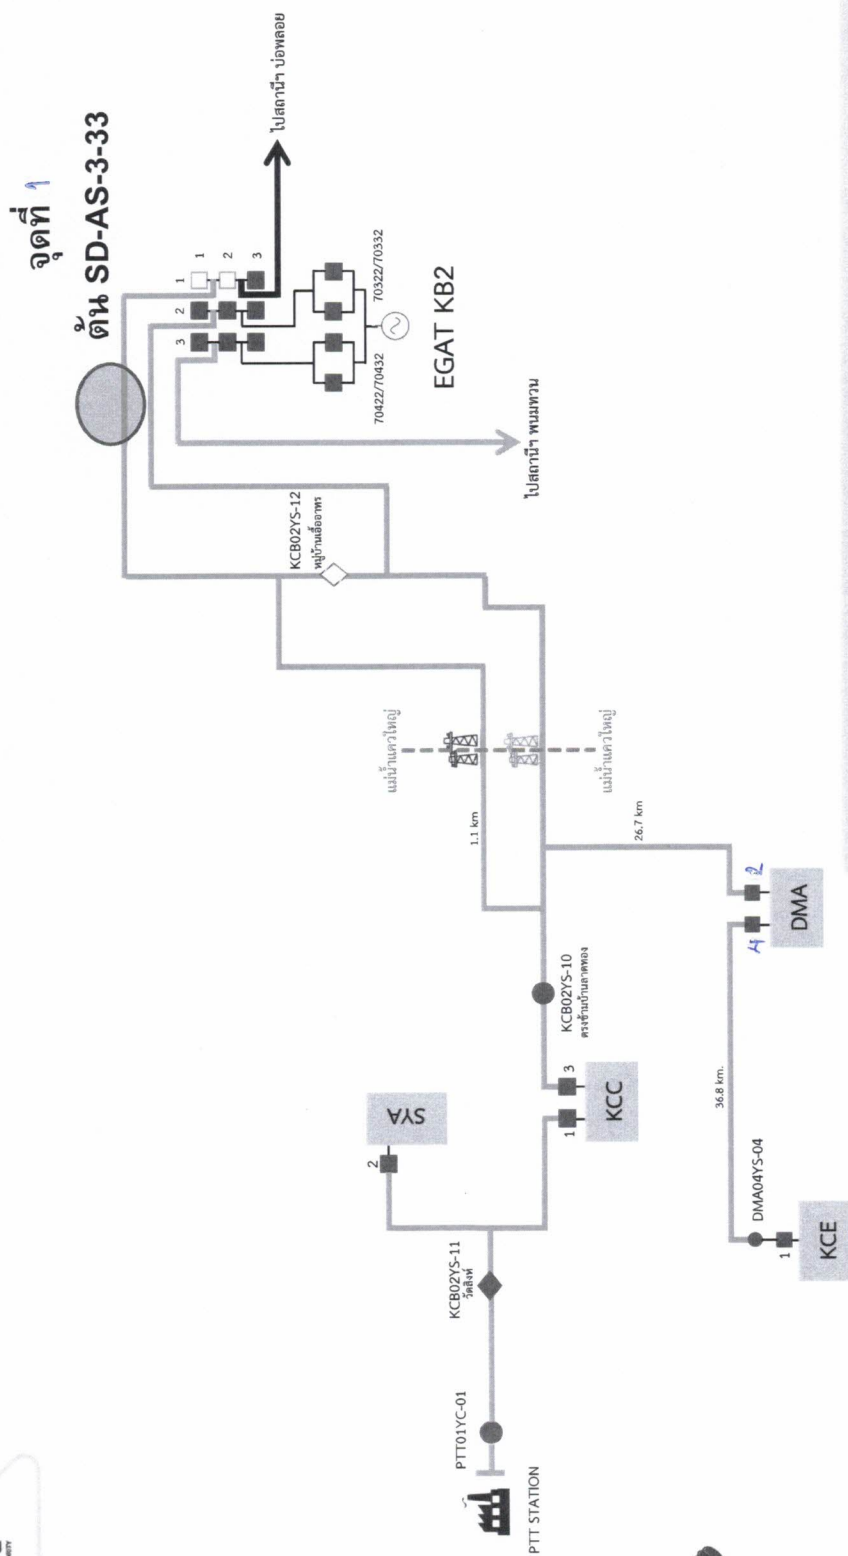



6. Hotline 115 เควี เชื่อม DDE จุดที่ 1 แบบมีไฟ



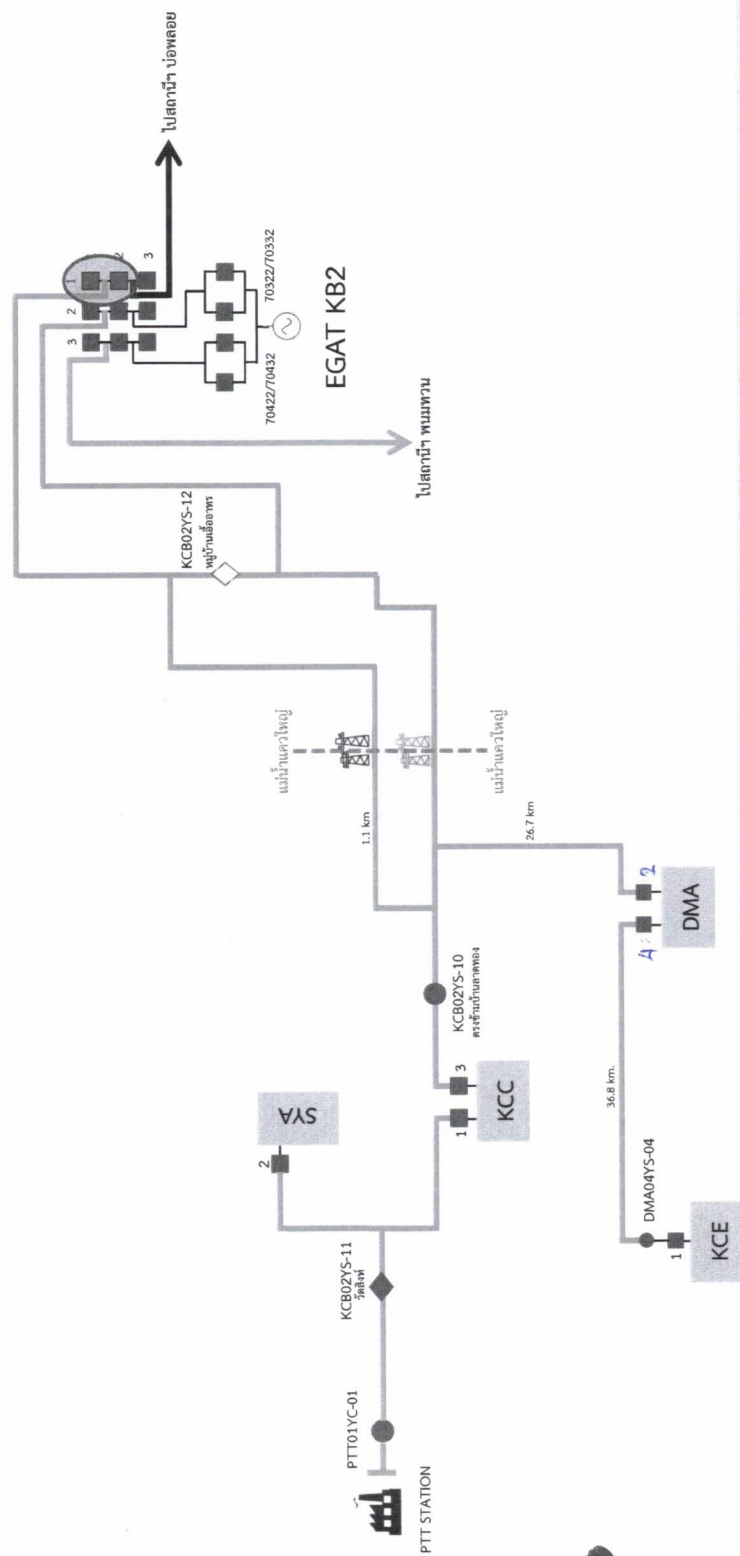

7. จ่ายเบรกเกอร์ สฟ.กาญจนบุรี 2 ไล่นังจร สฟ.กาญจนบุรี 3



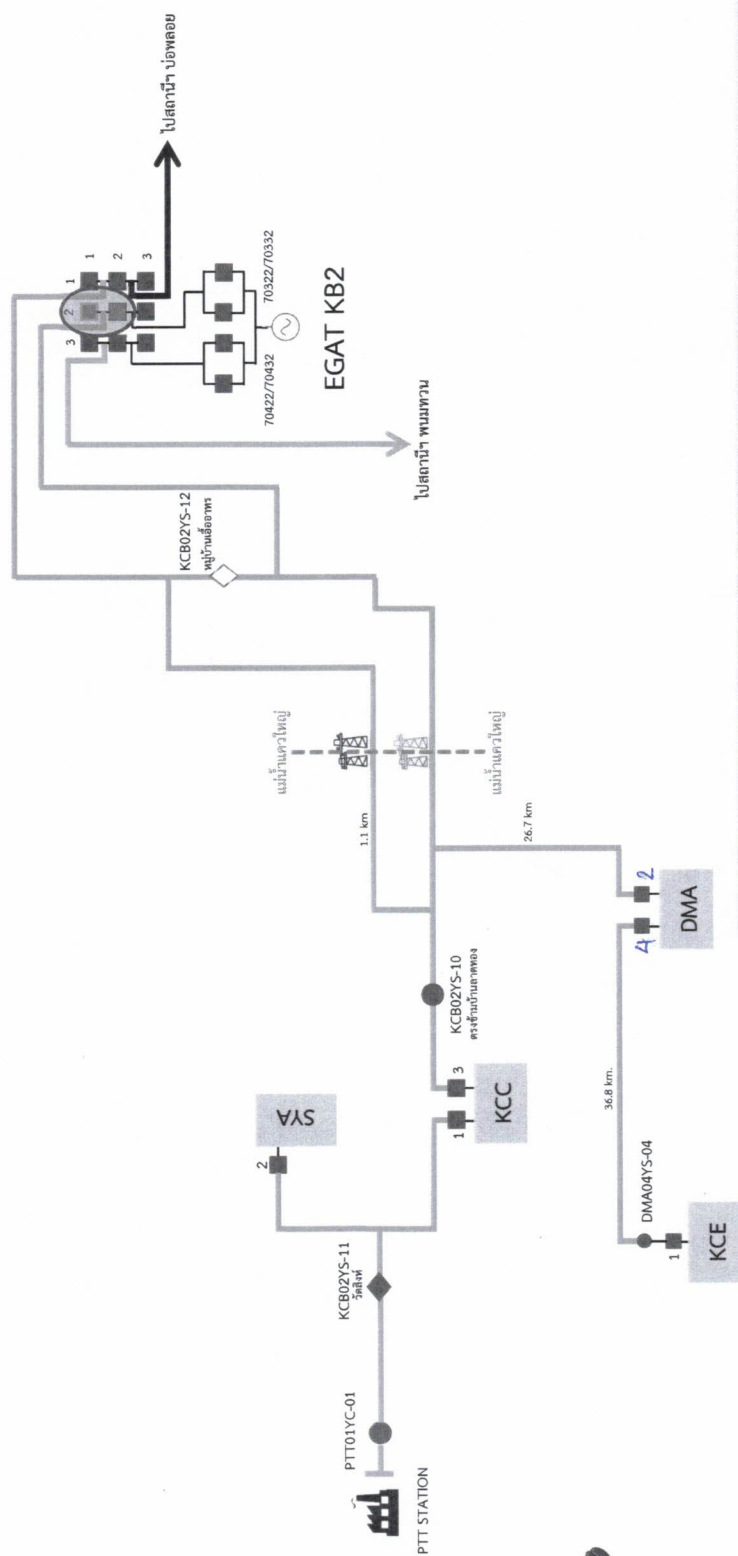

8. ปลดเบรกเกอร์ สฟ.กาญจนบุรี 2 ไม่นำวงจร สฟ.ด่านมะขามเตี้ย
