



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

16 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๐๗๑/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสกร

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.ก.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบ
จำหน่าย 22 เควี. ฟังตรงข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6 ,สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน 2. กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน 5 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง ONE - ONU - KTU - KTB	20 เม.ย. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบ จำหน่าย 22 เควี. ฟังตรง ข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6	- อุปกรณ์ ONE4YB-01 - อุปกรณ์ ONU1YB-01 DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU03)	- อุปกรณ์ ONB2YS-06 - อุปกรณ์ ONB2YS-04 - อุปกรณ์รหัส KTA10S - 14 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE คอนแทค ขึ้นบน (วงจรนอก) โดยชุด งานออนไลน์	นายปรีชา แก้วสีม่วง ผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. 081 - 2515281
2.	KTU 03					DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU05)	- อุปกรณ์รหัส KTA05S - 12 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE คอนแทค ขึ้นบน (วงจรใน) โดยชุด งานออนไลน์	
3.	KTU 05					DIS.ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTB01)	- อุปกรณ์รหัส KTB01S - 09 - อุปกรณ์รหัส KTB01S - 07 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรบน) โดยชุดงานออนไลน์	
4.	KTB 01					DIS.ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTB05)	- DIS.ชั่วคราว ด้านข้าง รร.บ้านแครายเกษตรพันธุ์ - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 10 - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 08	
5.	KTB 05							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ 29 ราย บริเวณ หน้า สฟฟ.กทบ.6 จนถึง โรงพยานาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแควน้อย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หน.บ.บ. กฟส.กทบ. โทร 087 - 6715626

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.646135, 100.324781
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.647973, 100.325028

(นายมานะ วาสกร)

ตำแหน่ง ร.ก.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115W จาก ONE ถึง ONB2YS-06 หน: ONB2YS-04

ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 636/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2-5 พิดเดอร์ 2-5 หน: สฟฟ.กทบ.6 ถึง 55-บ้านแครายเกษตรพันธุ์

ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 636/68

พนักงานศูนย์ นาย ณพพร ชัยไชยศรี ประสานงานการขอดับไฟกับ ผจก.กฟส.กทบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก. กฟส. กทบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกโรงเรียนแคทราย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 เม.ย. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปักเสาไฟ - พาดสายแรงสูง 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	636/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	13 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
3	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- โหลด 1.2 MW
4	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- โหลด 0.9 MW
5	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
6	KTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- โหลด 0.6 MW
7	KTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
8	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- โหลด 1.7 MW
9	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 5.1 MW
10	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 4.5 MW
11	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 0.7 MW
12	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 1.2 MW
13	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- โหลด 3.8 MW
14	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- โหลด 3.1 MW
15	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 3.1 MW
16	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 1.4 MW
17	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 6.9 MW
18	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 5.3 MW
19	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- โหลด 2.0 MW
20	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- โหลด 0.6 MW
21	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB09						
24	KTB05S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ริมคลองแคทราย
25	KTB05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 อนามัยแคทราย
26	ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SMI03						
27	KTU05S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 เยื้องโรงงานโปรเท็ค
28	KTU03S-04	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6 ริมคลองสีวาฬสวัสดิ์ จุดแบ่งเขต สค.-กทบ.
29	SMI05VB-01	ปลด	สับ		SMI		CB ขนานบัส
30	DIS ชค.ไลน์ KTU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชค.หน้าสถานีกระทู้แบน 6


[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		- -
72	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		- -
73	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		- -
74	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		- -
75	KTU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		- -
76	KTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		- -
77	KTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		- -
78	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		- -
79	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
80	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
81	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
82	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
83	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
84	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
85	SMI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
86	SMI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
87	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
88	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
89	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- -
90	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- -
91	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
92	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
93	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		- -
94	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- -
95	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- -
96	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		- -
97	KTU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		- -
98	KTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- -
99	KTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- -
100	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		- -
101	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
102	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
103	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- -
104	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- -
105	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
106	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
107	SMI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- -
108	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- -
109	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
111	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- -
112	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- -
113	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	แจ้งหน่วยงาน ผลิตซื้อคกราวด์ จุด G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 (115kV), G16 (115 kV)						
115	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
116	แจ้งหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด A ระบบ 22 เควี ได้						
117	เมื่อหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด A ระบบ 22 เควีแล้วเสร็จ						
118	แจ้งหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด B ระบบ 22 เควี ได้						
119	เมื่อหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด B ระบบ 22 เควีแล้วเสร็จ						
120	แจ้งหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด C ระบบ 22 เควี ได้						
121	เมื่อหน่วยงานทำการ จั้ม DDE จุด C ระบบ 22 เควีแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจ่ายโหลดได้ตามปกติ						
122	DIS ชค.โลน KTB01	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ตรงข้าม สถานีฯ กระทุ่มแบน 6
123	DIS ชค.โลน KTB05	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ตรงข้าม สถานีฯ กระทุ่มแบน 6
124	ONB02YS-06	ปลด,ลื้อคกญแฉ	ลั้บ		กทบ.		ABS สีแยกโรงเรียนบ้านแคราย
125	ทำการ Close Loop SAA1YB-01 และ SAA3YB-01 กลับสภาพปกติ						
126	ONE04YS-01	ปลด	ลั้บ		ONE		- ใบมิด 115 เควี
127	ONE04YS-03	ปลด	ลั้บ		ONE		- ใบมิด 115 เควี
128	ONE04YB-01	ปลด	ลั้บ คง OFF Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
129	ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนกลับจาก KTA05						
130	KTA05S-04	ปลด	ลั้บ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
131	KTB01S-09	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนแคราย
132	KTA05S-09	ลั้บ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานธรรมศร
133	ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนกลับจาก KTA10						
134	KTA0BVB-01	ปลด	ลั้บ		KTA		- ขนานบัส
135	DIS ชค.โลน KTB05	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ข้างโรงเรียนแคราย
136	KTA10S-07	ลั้บ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมู
137	KTA05S-04	ลั้บ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
138	KTA0BVB-01	ลั้บ	ปลด		KTA		- ขนานบัส
139	ย้ายโหลด KTU03, KTB01 บางส่วนกลับจาก ONB04						
140	KTU02VB-01	ปลด	ลั้บ คง OFF Auto Reclose		KTU		CB KTU02
141	KTB01S-08	ปลด,ลื้อคคาน	ลั้บ		กทบ.		SF6 อนามัยแคราย
142	DIS ชค.โลน KTU03	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ชค.ตรงข้ามโรงงานโปรเห็ด
143	KTU03S-08	ลั้บ	ปลด,ลื้อคคาน		กทบ.		SF6 โรงงานอิฐบลี้อค
144	ONB09S-10	ลั้บ	ปลด,ลื้อคคาน		กทบ.		SF6 แบ่งแดน ริมคลองแคราย
145	KTU02VB-01	ลั้บ	ปลด		KTU		CB KTU02
146	ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนกลับจาก SMI03						
147	KTU03S-04	ปลด	ลั้บ		บนจ.	SCADA	SF6 ริมคลองสีวาฬสวัสดิ์ จุดแบ่งเขต สค.-กทบ.
148	SMI0BVB-01	ปลด	ลั้บ		SMI		CB ขนานบัส
149	DIS ชค.โลน KTU05	ปลด	ลั้บ		กทบ.		DIS ชค.หน้าสถานีกระทุ่มแบน 6


[illegible]

แผนผังสถานปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟพ.กระทุ่มแบน 6
ตั้งแต่ สฟพ.อ้อมน้อย 5 – สฟพ. อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชยาคร จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจำหน่าย 22 เควี. ผังตรงข้าม สฟพ.กระทุ่มแบน 6
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

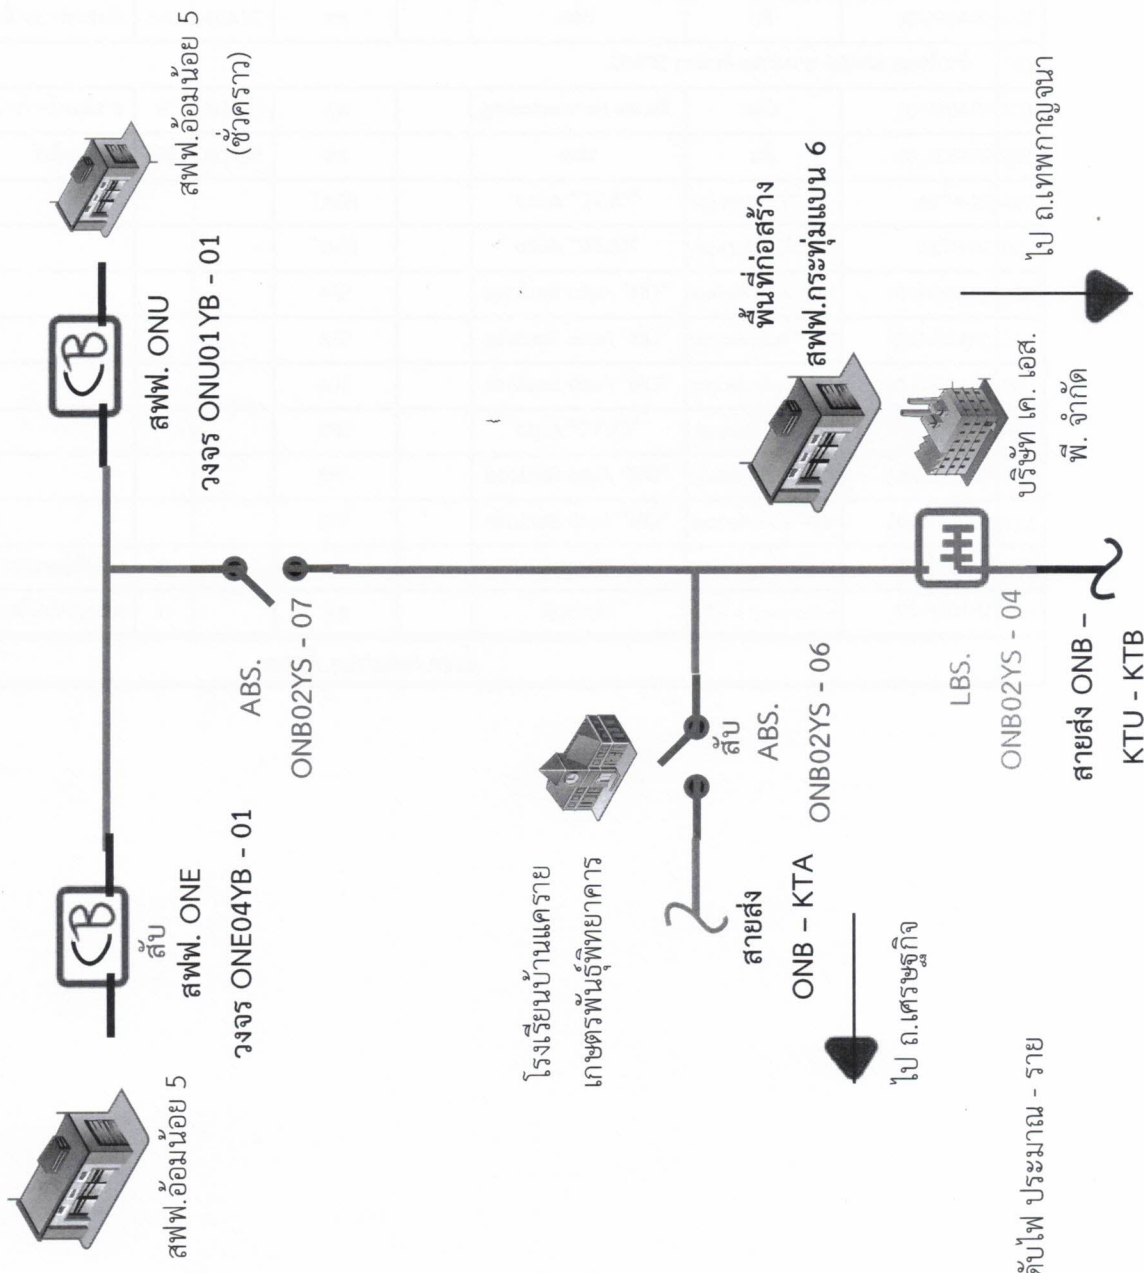

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลัังดับไฟ บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทุ้มแบน 6 ตั้งแต่ สฟฟ.อ้อมน้อย 5 - สฟฟ.อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชยาคร จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ผังตรงข้าม สฟฟ.กระทุ้มแบน 6 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

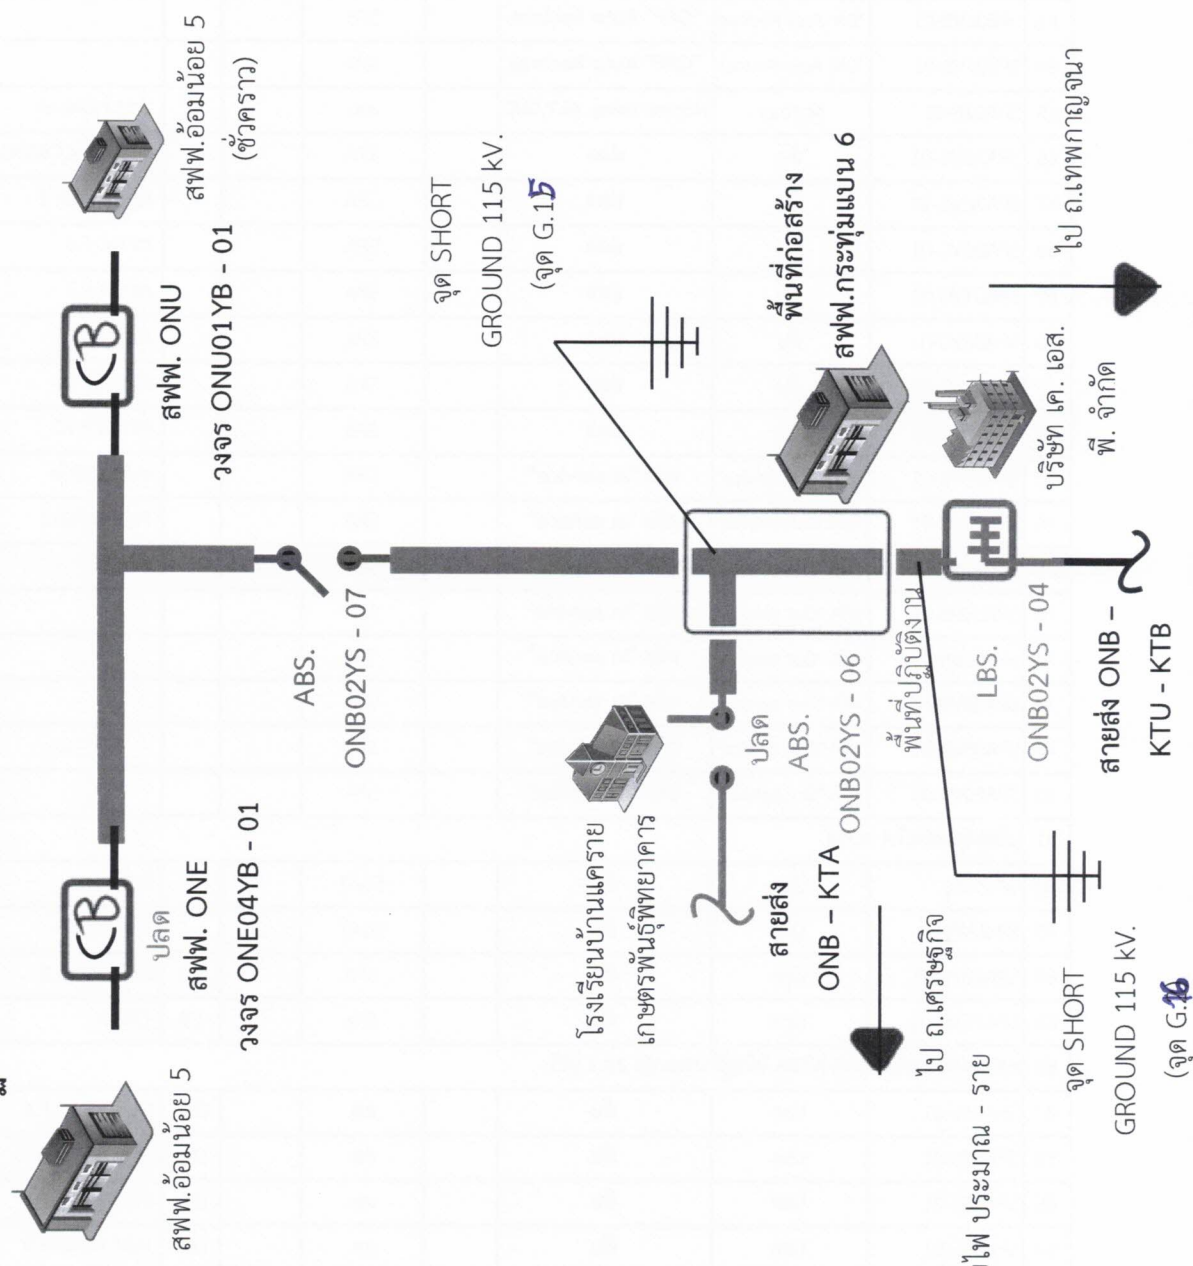

หมายเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย

พันตัดไฟ

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนการดับไฟ บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กระทู้แม่แบบ 6


เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ฟังตรงข้าม สฟฟ.กระทู้แม่แบบ 6

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/
ตัดตอน ตัวถัดไป คือ
KTU05S - 02)

ไปถนนเทพาญดนา

ไป ถ.เศรษฐกิจ
(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/
ตัดตอน ตัวถัดไป คือ
KTU05S - 10)

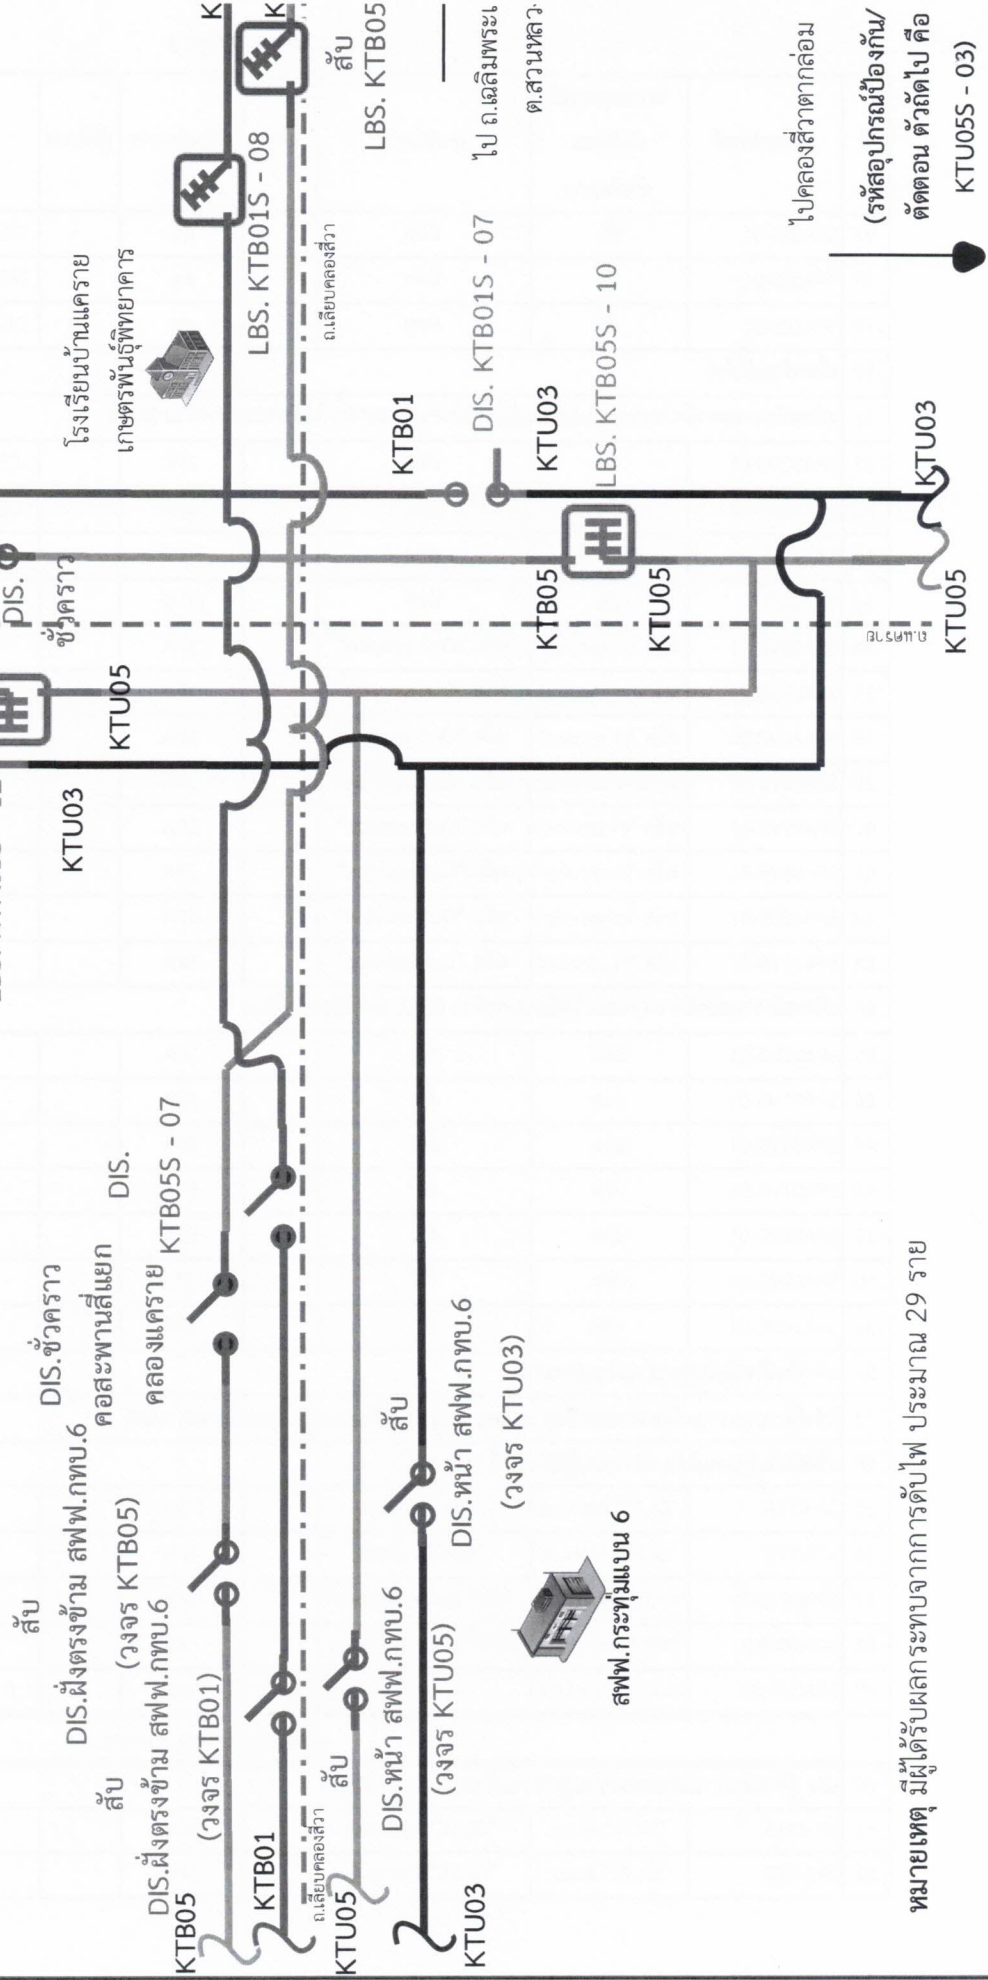

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 29 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังการดับไฟ บริเวณ สีแยกโรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรพันธุ์พืชยาการ จนถึง หน้า สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจำหน่าย 22 เคริ. ผังตรงข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/
 ตัดตอน ตัวถัดไป คือ
 KTU05S - 02)

ไปถนนเทพกาญจนา

DIS.ชั่วคราว
 คอสะพานสีแยก
 DIS. ผังตรงข้าม สฟฟ.กทบ.6
 คลองแคทราย
 จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.1, G.2)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.5, G.6)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.7, G.8)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.9, G.10)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.11, G.12)


จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.13, G.14)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.15, G.16)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.17, G.18)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.19, G.20)

จุด SHORT
 GROUND
 (จุด G.21, G.22)

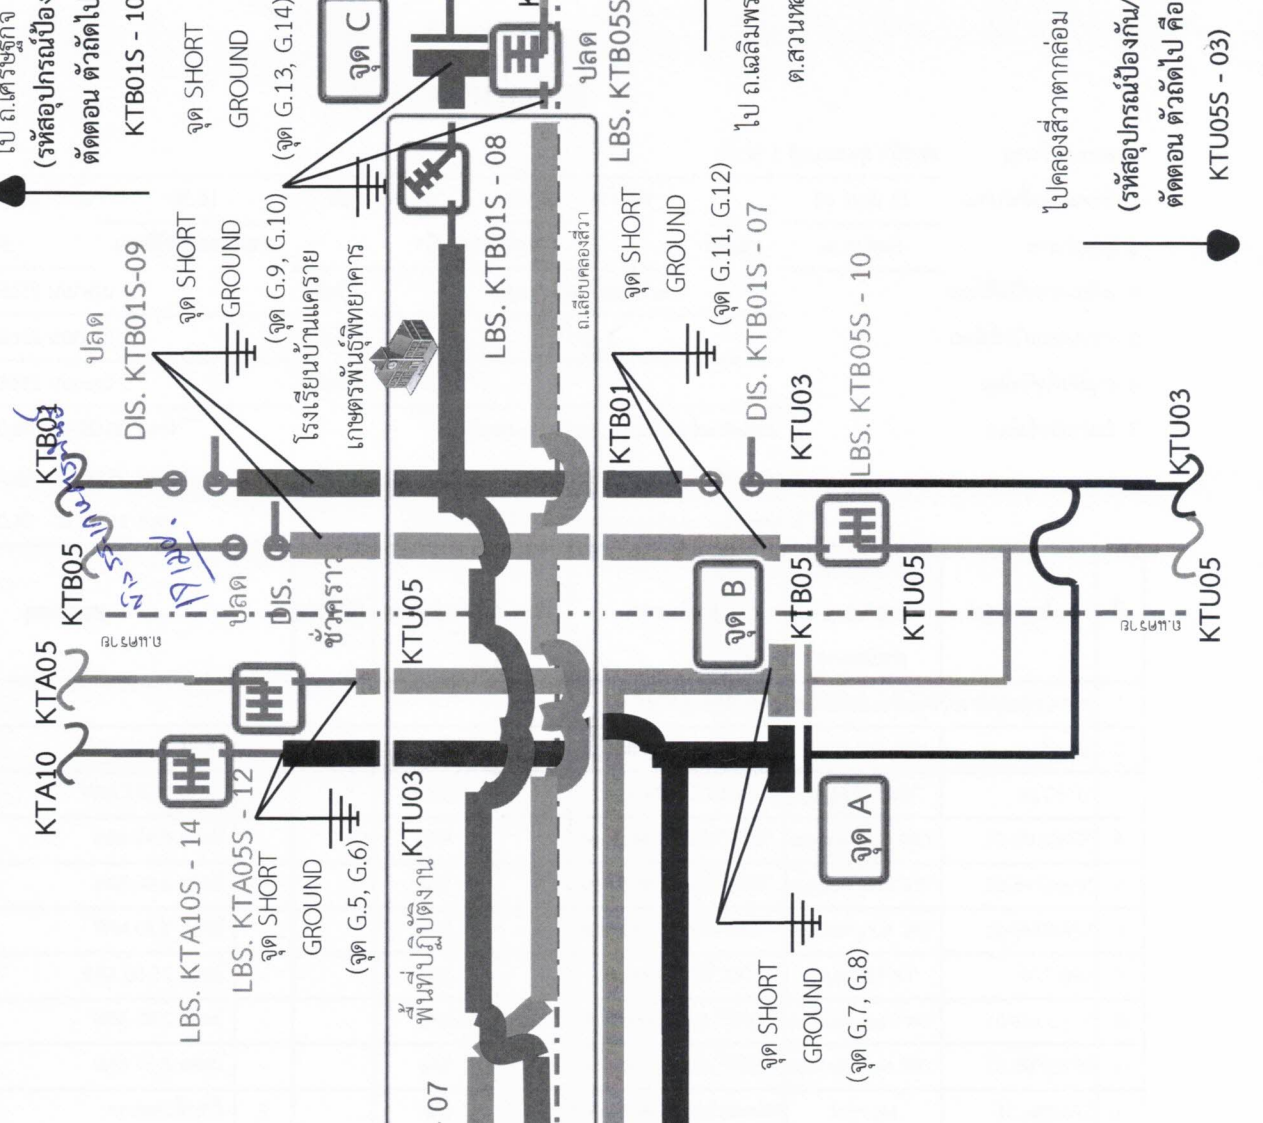

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 29 ราย

พื้นที่ดับไฟ

ไปคลองสี่วาตากล่อม
 (รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/
 ตัดตอน ตัวถัดไป คือ
 KTU05S - 03)

ไป ถ.เฉลิมพระ
 ต.สวนหส

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ หลังการตัดไฟฟ้า บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชยาการ์ จนถึง หน้า สฟฟ.กระท่อมแบน 6 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กระท่อมแบน 6


วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง

(หัวเสา DDE คอนแทก ชื่นบน ได้แก่ วงจร

KTU03 และ KTU05)

จุด A และ จุด B

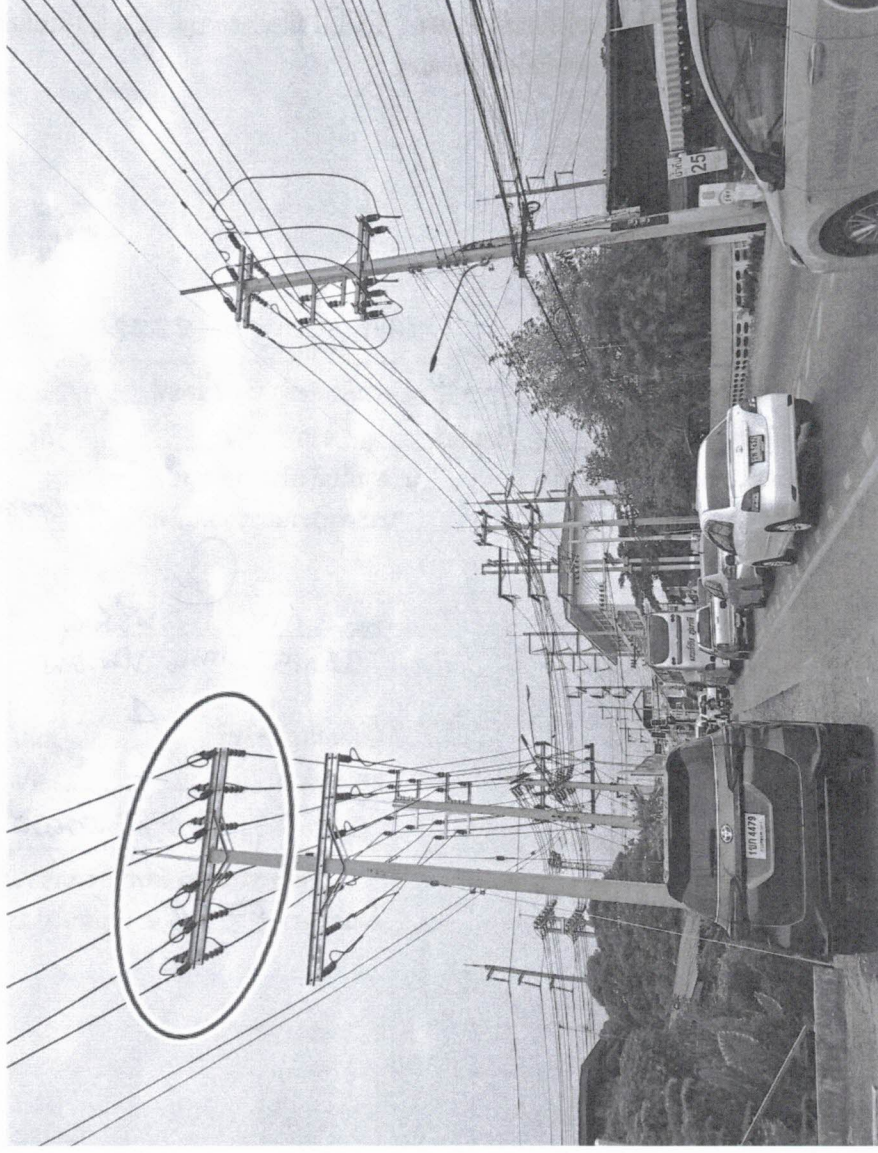

จุด C

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง (หัวเสา DDE วงจรบน คือ วงจร KTB01)

