



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ท.ม.ง. - ๖๒๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายนิวัฒน์ มาประจวบ
ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชาตุลย์

Switching Deadline

28 พ.ค. 67

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีท่าม่วง ๒	DISS TMV๒S - ๐๑	DISS ชั่วคราว หน้า โรงปุ๋ยเขาคันหมอก	นายจิราวัฒน์ พักอ่อน ๐๘๐- ๖๕๖๕๓๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน ตำแหน่ง พ.ท.ง.๖.กฟส.บ้านตลาดสำโรง โทร. ๐๖๒-๕๐๗๕๑๓๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

24พค.67
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.(๙) กฟส.ท.ม.ง.

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร.๐๓๕-๖๑๑๐๙๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ TMV02 จาก TMV025-01 ถึง P15 ตำบลว ทต.วังใหม่ กิ่งก้นดอก
ในวันที่ 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 752/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช วิเศษ เฉลิมชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นางรำไพรัตน์ ศรีเกิดรัตน์
24 พ.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ตสร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

P. 15
(เฉลิมชัย วิเศษ)
ผค. วังใหม่ กิ่งก้นดอก

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

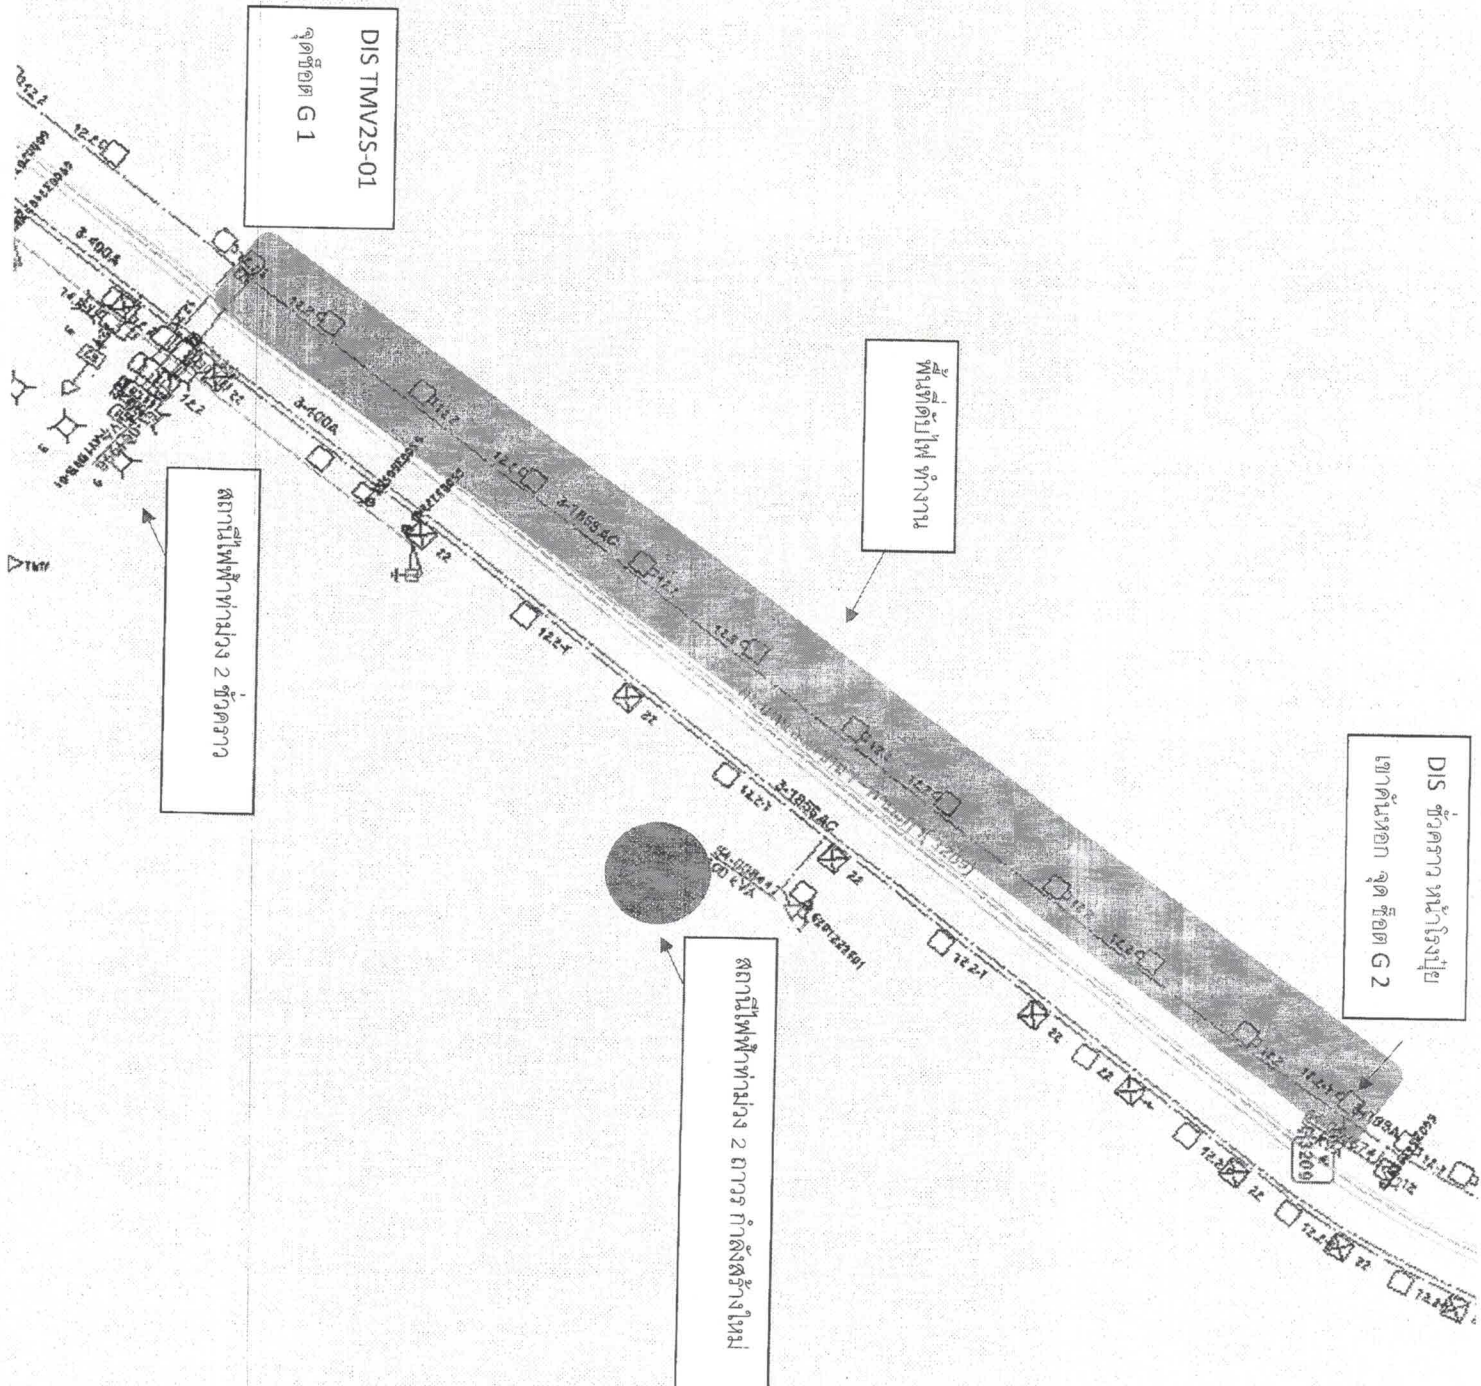

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีท่าม่วง 2 ถึง โรงปุ๋ยเขาคันหอก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพย.สตง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	752/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	24 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	คิซง			วันที่	24 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจักรวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
				2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ SF6 TMV02S-02 ตรงข้ามสถานีท่าม่วง2 อยู่ตำแหน่ง OPNE พร้อมลิ้อคคาน						
3	กฟส.ตสร.แจ้ง VSPP บ.บีซีพีจี , บ.พลังงานเพิ่มพูล , บ.เสถียรปาล์ม หยุดชานาน						
4	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
5	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
6	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load = 7 MW
7	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		Load = 5.5 MW
8	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		Load = 1.5 MW
9	ย้ายโหลด TMV02 ไปรับไฟจาก TMK01						
10	TMK02S-09	ปลด	ล๊ับ		ทมก.	scada	SF6 แบ่งเขต ตสร.-ทมก.
11	TMV02S-03	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		SF6 ช่างโรงโม่หินศิลาสมบูรณทรัพย์
12	ย้ายโหลด TMV02 ไปรับไฟจาก TMV01						
13	TMV01S-04	ปลด	ล๊ับ		ตสร.	scada	SF6 แยกเขาคันหอก
14	TMV02VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMV		CB TMV02
15	TMV02S-01	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		DIS POT HEAD F.2
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
17	DIS ชั่วคราว TMV02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS หน้าโรงปุ๋ยเขาคันหอก
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
23	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
24	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
25	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
26	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching แรก							
27	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
30	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
31	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
32	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
33	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
34	จ่ายไฟ						
35	DIS ชั่วคราว TMV02	ปลด	สับ		ตสร.		DIS หน้าโรงบู้ยเขาคันหอก
36	ย้ายโหลด TMV02 กลับจาก TMV01						
37	TMV02S-01	ปลด	สับ		ตสร.		DIS POT HEAD F.2
38	TMV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		CB TMV02
39	TMV01S-04	สับ	ปลด		ตสร.	scada	SF6 แยกเขาคันหอก
40	ย้ายโหลด TMV02 กลับจาก TMK01						
41	TMV02S-03	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ข้างโรงโม่หินศิลาสมบูรณทรัพย์
42	TMK02S-09	สับ	ปลด		ทมก.	scada	SF6 แบ่งเขต ตสร.-ทมก.
43	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
44	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
45	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
46	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
47	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
สิ้นสุด Switching							



DIS TMV2S-01
จุดตัด G 1

สถานีไฟฟ้าทางลง 2 ชั้นดงาว

พื้นที่เดินไฟ ทางลง

DIS ชั้นดงาว หน้าโรงโม่
เขตต้นหมอก จุดตัด G 2

สถานีไฟฟ้าทางลง 2 ตาราง กำลังสร้างใหม่
