



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline.  
30. มิ.ย. 64.

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๐๐๒๗ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายณรินทร์ เข้มทอง  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย.จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย. ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑	๓ ก.ค.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ซ่อมแซม ใน ระบบ ๒๒ KV R บ้านใหม่	หลัง R บ้าน ใหม่ รหัส BOP๐๑R-๐๒	สูตรระบบ จำหน่าย	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย พช.๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑
๒	๑	๓ ก.ค.๖๔	๐๘.๓๐ น. ๑๖.๐๐ น.	๐๙.๓๐ น. ๑๗.๐๐ น.	ตัด DDE ก่อน R บ้านใหม่ BOP๐๑R-๐๒ เชื่อม DDE เข้า ระบบเดิม	DIS เนินเขา ดินสอ BOP๐๑S-๐๔	DIS ข้าง ป้อม สาม แยกทุ่งมะ สังข์ BOP๐๑S-๐๖	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย พช.๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พช.๖ (สข) โทร.๐๘๔-๒๔๖๙๔๒๔...  
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง พช.๖ ผบ. โทร.๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

☐ ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

☒ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรินทร์ เข้มทอง)

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ตำแหน่ง



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเตอร์ BOP01 จาก BOP1P-02. ถึง 8๐๒๒๖, น.ป.บ.  
ในวันที่ 3 กค ๖4. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 861

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. พัดเตอร์ BOP01 จาก P15 เ็น พัด ๕๐. ถึง DIS. บังคับมอเตอร์ตามใบค. พัด ๕๐  
ในวันที่ 3 กค ๖4. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 09.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ BOP1S-06.  
4.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ BOP1S-06.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามกร วัชรมาตร์  
29 มิ.ย. ๖๔

นางสาว อธิมา  
(นางสาว อธิมา)  
0๘๐.๓๖๖.๖๖๖

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ขบค., กฟร. ลพ

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตช์


- | รีโคลสเซอร์ BOP1R-02 (บ้านใหม่) - สูตรระบบจำหน่าย  |  |          |                     |        |                            |
|--|--|----------|---------------------|--------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน  |  |          |                     |        |                            |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน  | 3 ก.ค. 64  | เวลา     | 08.30 น.            | ถึง    | 17.00 น.                   |
| 3. ผู้ขอทำงาน  | กฟอ.บพล.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 861/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย   | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |          |                     | วันที่ | 28 มิถุนายน 2564           |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                     | วันที่ | 28 มิถุนายน 2564           |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                     | วันที่ | 28 มิถุนายน 2564           |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย  |  |          |                     | วันที่ | 28 มิถุนายน 2564           |
| 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |  |          |                     |        |                            |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	LOAD 3.25 MW.
3	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	LOAD 2.07 MW.
4	BOP01R-02	Normal	Nonreclosing		บพล.		R	บ้านใหม่
5	ย้ายโหลด BOP01 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP02							
6	BOP01S-08	ปลด	ล๊اب		บพล.		DIS	ตรงข้ามฟาร์มโกสีพี
7	BOP01S-06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	บ้านทุ่งมะสังข์(ใต้ไลน์ 115 เคริ)
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.							
9	BOP01R-02	ล๊اب	ปลด		บพล.		R	บ้านใหม่
10	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการปลดใบมิตด้านออกไลน์ BOP01R-02 ออกทั้ง 3 เฟสได้							
11	เมื่อ กฟอ.บพล.ทำการปลดใบมิตด้านออกไลน์ BOP01R-02 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
12	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการตรวจสอบ Switch bypass BOP01R-02 ให้อยู่ตำแหน่ง Open							
13	BOP01S-04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	ลงเนินเขาดินสอ
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1							
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2							
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G3							
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G4							
18	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้							
19	เมื่อ กฟอ.บพล.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟมาถึงจุดตัด DDE							
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G3							
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G4							
23	BOP01S-04	ปลด	ล๊اب		บพล.		DIS	ลงเนินเขาดินสอ
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ							
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
26	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	
27	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	
28	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมดับไฟเพื่อทำการจี้ม DDE							
30	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	
31	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	
32	BOP01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	ลงเนินเขาดินสอ
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3							
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4							
35	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
36	เมื่อ กฟอ.บพล.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
37	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1							
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2							
39	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3							
40	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4							
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งหมด							
42	BOP01S-04	ปลด	สับ		บพล.		DIS	ลงเนินเขาดินสอ
43	แจ้ง กฟอ.บพล.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ BOP01R-02 เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
44	เมื่อ กฟอ.บพล.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ BOP01R-02 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
45	BOP01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.		R	บ้านใหม่
46	ย้ายโหด BOP01 บางส่วนกลับจาก BOP02							
47	BOP01S-06	ปลด	สับ		บพล.		DIS	บ้านทุ่งมะสังข์(ใต้ไลน์ 115 เครวี)
48	BOP01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	ตรงข้ามฟาร์มไก่ซีพี
49	BOP01R-02	Nonreclosing	Normal		บพล.		R	บ้านใหม่
50	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	-
51	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	-
52	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

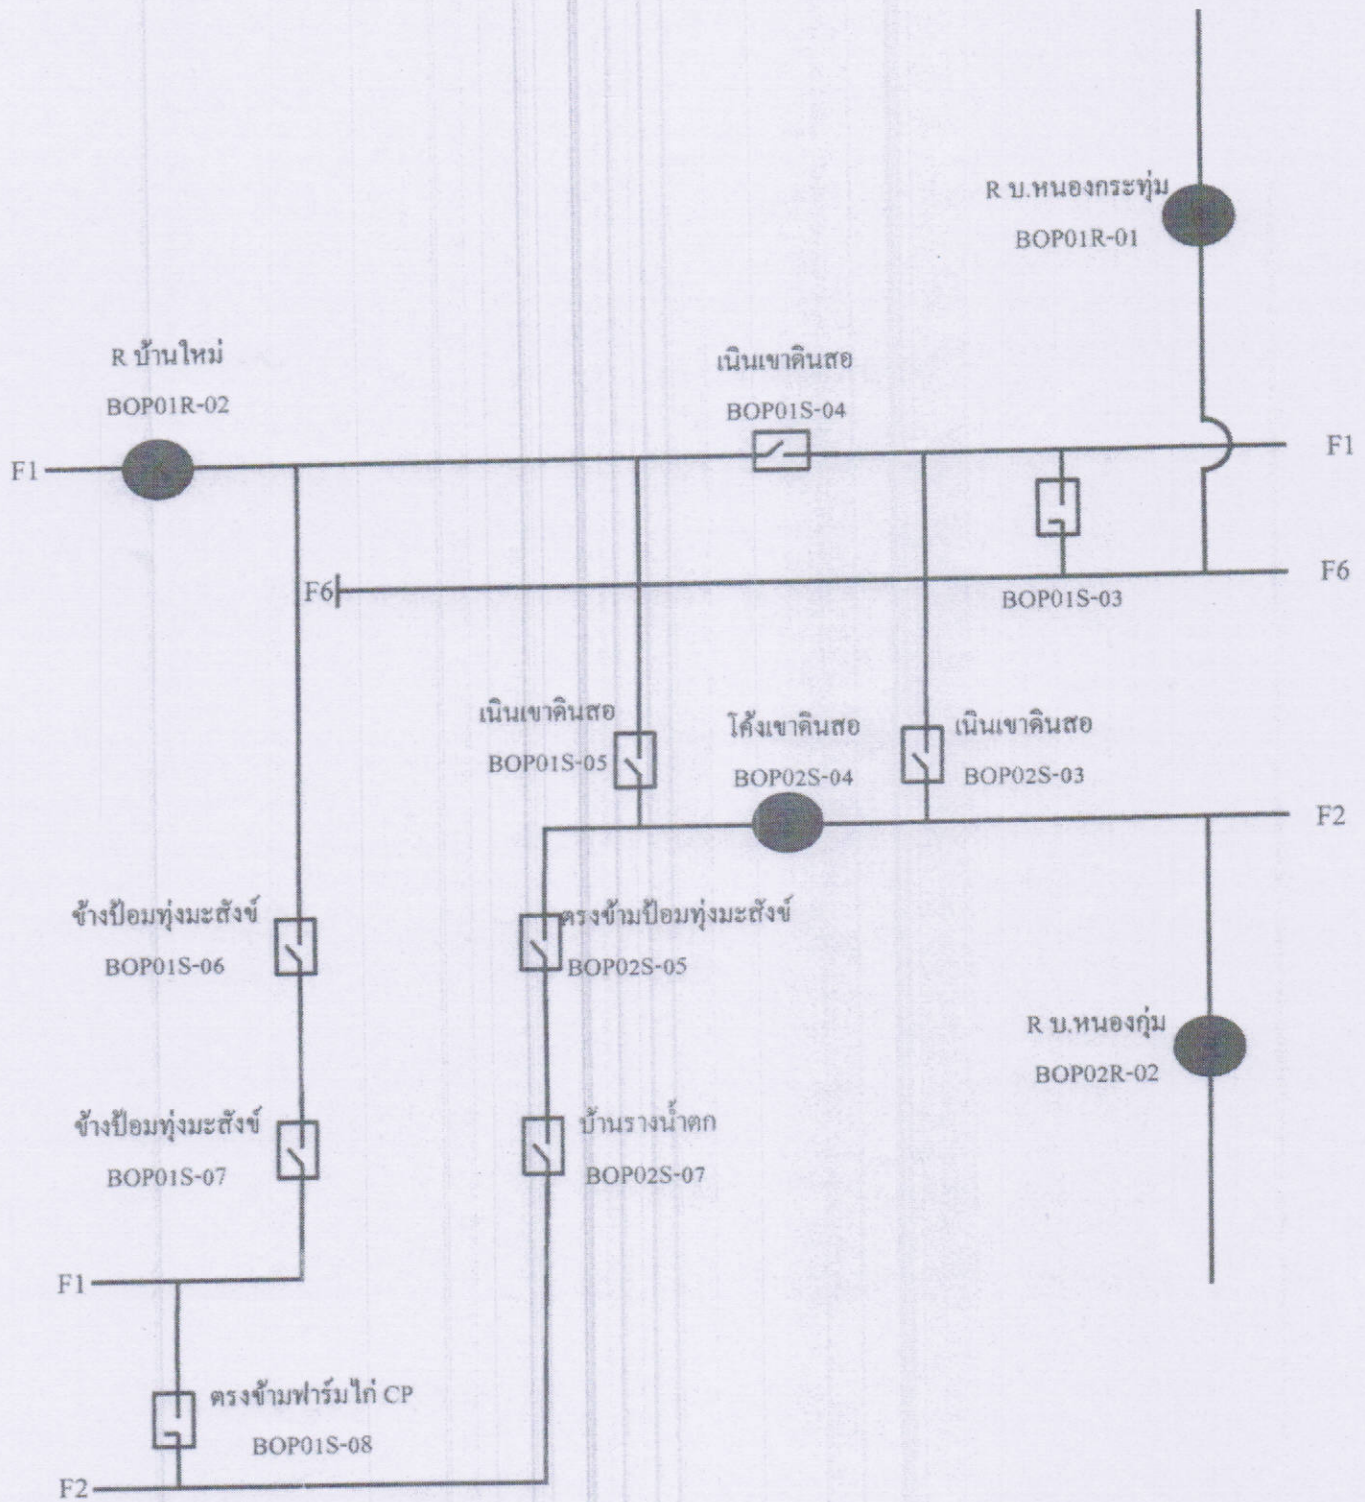



# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

