



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(งานด่วน)

Switching Deadline

27 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.นญช. ๓๗๘ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด ตำแหน่ง อภ.นบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑.ซ่อมแซมระบบจำหน่ายมีกเสา ๑๒.๒๐ เมตร หลัง ครอบเอาท์บ้านวังน้ำโจนรหัส DAA๐๔F-๑๖ สถานีไฟฟ้าดำนช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ ๑
เอกสารแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DAA๐๔	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ เมตรและ เปลี่ยนคอนตันข้ามคลองน้ำ โจน	ครอบเอาท์บ้านวัง น้ำโจนรหัส DAA๐๔F-๑๖	ต้น BA ช่างวัด วังน้ำโจน	นายสำเร็จ แก้วเรือง
๒.	DAA๐๖	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๐.๐๐ น.	ขอจ่ายไฟจากครอบเอาท์ ไลน์บ้านดงเชือก DAA๐๔F- ๐๗ (ต้องปลดครอบเอาท์ เพื่อเพิ่มขนาดฟิวส์) แล้ว จ่ายไฟผ่าน DIS กลางไลน์ DAA๐๔F-๐๘ (เดิม เป็นครอบเอาท์) ถึงต้น BA ช่างวัดวังน้ำโจน	ครอบเอาท์ไลน์ บ้านดงเชือก DAA๐๔F-๐๗	ต้น BA ช่างวัด วังน้ำโจน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ผ.ภ.น. โทร. ๐๘๑๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.ภฟส.อ.หนองหญ้าไซ

นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
วันที่.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ DAA09 จาก DAA09F-16 ถึง PPE บึงวัดวังน้ำใส
ในวันที่ 24 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 0๗.๓๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 888/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ DAA06 จาก DAA09F-07 ถึง PPE บึงวัดวังน้ำใส
ในวันที่ 24 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 0๗.๓๐ น. ถึง 16.0๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เลขช่วง ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สำเริง เก้าเรือ
25 มิ.ย. 67

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.หนอง.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านวังน้ำโจรส					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	888/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	25 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจรรยาวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB
3	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB
4	เมื่อพร้อมดับ ตัด DDE						
5	DAA09F-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ้านดงเชือก
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE ข้างวัดวังน้ำโจรส ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
10	เมื่อแจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE ข้างวัดวังน้ำโจรส ออกจากกันทั้ง 3 แล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
12	เมื่อพร้อมดับช่วงที่ 2 (หน้างานเพิ่มขนาดฟิวส์แรงสูง)						
13	DAA09F-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ้านดงเชือก
15	เมื่อผู้ควบคุมงานเพิ่มขนาดฟิวส์ D/O DAA09F-07 บ้านดงเชือก แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟไปถึงจุดตัด DDE						
16	DAA09F-07	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ้านดงเชือก
17	DIS ชั่วคราวDAA09	ปลด	สับ		นญช.		DIS กลางไลน์บ้านดงเชือก
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
21	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
22	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
สิ้นสุด Switching แรก							
23	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB
26	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ดับไฟ เชื่อม DDE ข้างวัดวังน้ำโจร						
28	DIS ชั่วคราวDAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS กลางไลน์บ้านดงเชือก
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE ข้างวัดวังน้ำโจร เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	เมื่อแจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE ข้างวัดวังน้ำโจร เข้าทั้ง 3 แล้วเสร็จ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	DAA09F-16	ปลด	สับ		นญช.		D/O วังน้ำโจร
36	เมื่อพร้อมดับช่วงที่ 2 (หน้างานลดขนาดฟิวส์แรงสูง)						
37	DAA09F-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ้านดงเชือก
38	เมื่อผู้ควบคุมงานลดขนาดฟิวส์ D/O DAA09F-07 บ้านดงเชือก แล้วเสร็จ						
39	DAA09F-07	ปลด	สับ		นญช.		D/O บ้านดงเชือก
40	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
41	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		CB
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เอกสารแนบ ๑

เพื่อซ่อมแซม ปีกเสา ๑๒.๒๐ เมตร ข้างวัดวังน้ำโจน

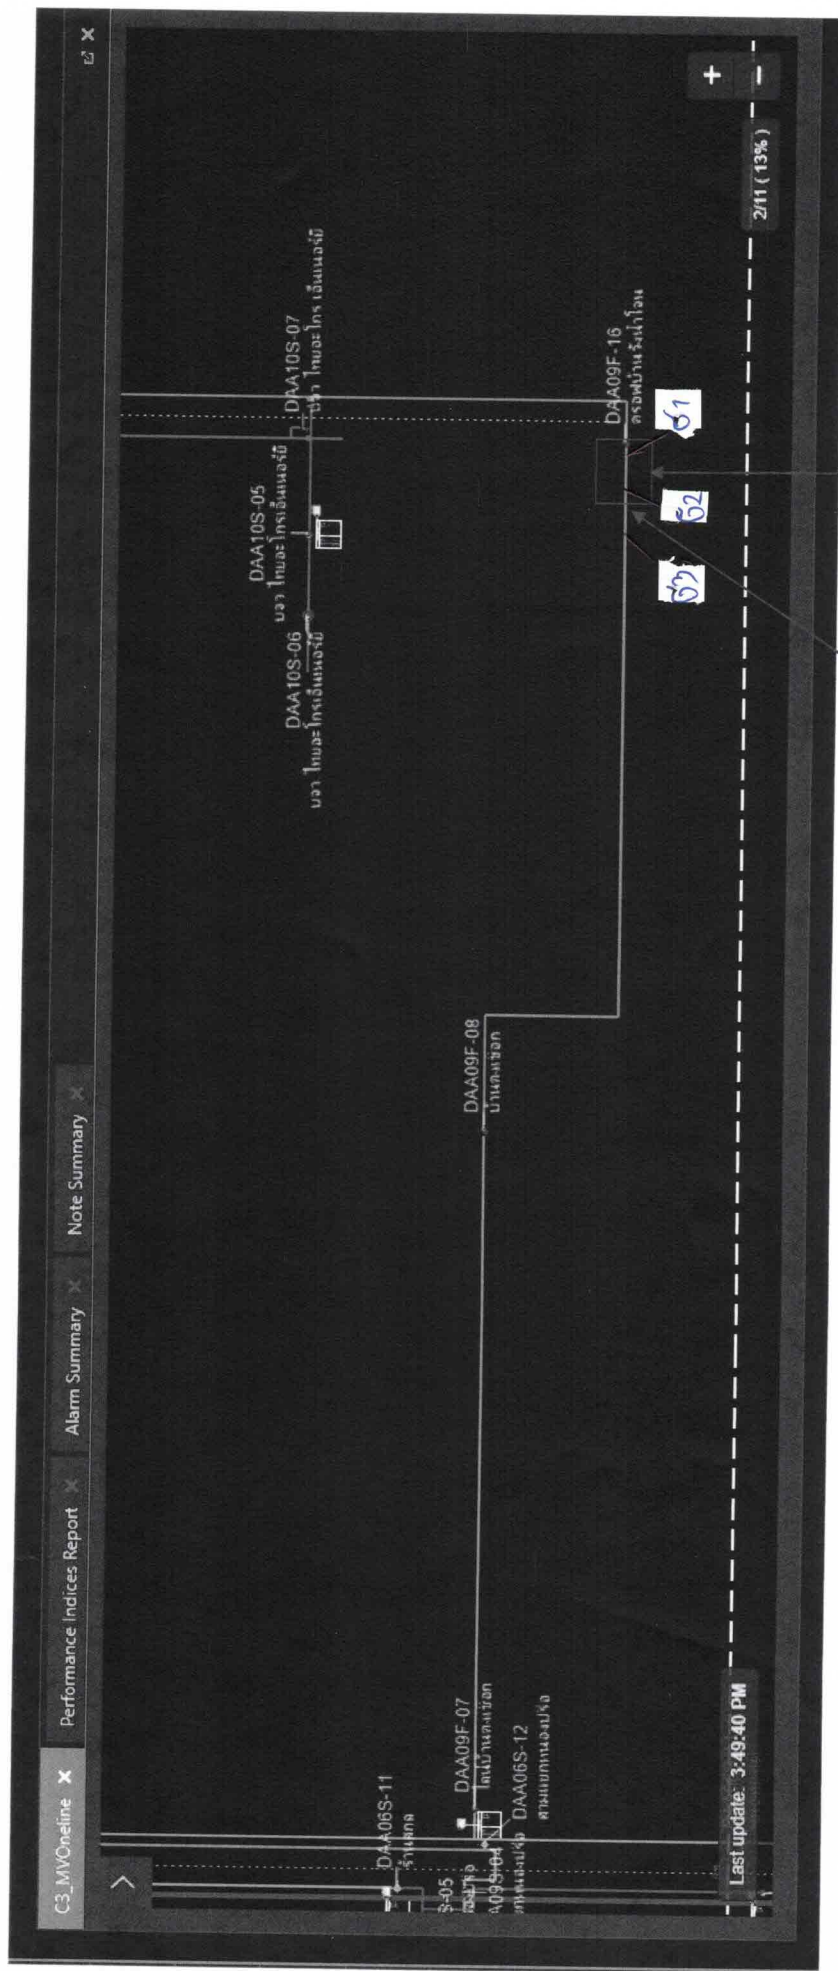

จุดปลดคัน BA ข้างวัดวังน้ำโจน

จุดดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
