



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

15/07/67

เลขที่ ก.ต.อท.(ปบ) ๒๖๓๓/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขชอทไลน์แคลมป์ - เบลแคลมป์ เป็นพีวีวีโรสเซอร์หนองยายทรัพย์ และเชื่อม DDE จุดตรชนเสาบ้านหนองยายทรัพย์ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1 UTG01	18 ก.ค. 2567	08.30	16.30	แกะไขชอทไลน์แคลมป์ - เบลแคลมป์ เป็นพีวีวีโรสเซอร์หนองยายทรัพย์และเชื่อม DDE จุดตรชนเสาบ้านหนองยายทรัพย์	จาก รีโครสเซอร์หนองยายทรัพย์ UTG01R-01 พิกัด 14.28129, 99.89253	ถึง ครอบครัวเสนา แยกบ่อน พิกัด 14.24274, 99.82261 UTG01F-97	นายจกกล โพธิกุล ชผ.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.085-2668919

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร 085-2668919

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG01 จาก UTG01R-01 ถึง UTG01F-97
ในวันที่ 18 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 963/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ~~มี~~ สุภัทรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โพธิกุล
สุภัทรา
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญมาก)



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง
อก.บช.(ก๓),
อก.วว.(ก๓)

๑๓๓. 5 ๓๓๓ ทพ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น
ผจพ. - (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน บ้านหนองยายทรัพย์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-ก.ค.-67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.อทง. งานที่ทำ เปลี่ยนฮอทไลน์แคลัมป์ และเชื่อม DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน 963/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายภัทรภัทร, สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
3	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
4	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
5	UTG01R-01	Normal	Nonreclosing		UTG		
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	D/O ในไลน์ UTG01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		D/O UTG01F-97
8	UTG01R-01	สับ	ปลด		อทง.		R บ้านหนองยายทรัพย์
9	SW.Load UTG01R-01	สับ	ปลด		อทง.		R บ้านหนองยายทรัพย์
10	แจ้งชุด HL ปลดจุดจัมฮอทไลน์แคลัมป์ เบลต์แคลัมป์ เพื่อเปลี่ยนเป็นพีจี						
11	หลังจากชุด HL ปลดจุดจัมฮอทไลน์แคลัมป์แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ชุดทำงาน กฟอ.อทง. รับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
17	ขณะปฏิบัติงาน คง "OFF Auto Reclose" UTG01VB-01 ให้ชุด HL ดำเนินการเปลี่ยนฮอทไลน์แคลัมป์เป็นพีจี บริเวณต้นไลน์แยก						
18	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
19	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
สิ้นสุด Switching แรก							
20	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
23	ตรวจสอบเชื่อม DDE บริเวณนอกแกจเริญ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส จำนวน 1 จุด						
24	ตรวจสอบเชื่อมจุดจัมพีจี บริเวณปากทางไลน์แยกบ้านหนองยายทรัพย์ เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
25	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU			
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
28	SW.Load UTG01R-01	ปลด	สับ		อทง.		R	บ้านหนองยายทรัพย์
29	UTG01R-01	ปลด	สับ ๓ Nonreclosing		อทง.		R	บ้านหนองยายทรัพย์
30	ย้ายโหลดกลับสภาพปกติ ด้วยวิธีการดับไฟย้ายโหลด							
31	D/O ในไลน์ UTG01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		D/O	UTG01F-08 ไลน์แยกบ่อน
32	D/O ในไลน์ UTG01	ปลด	สับ		อทง.		D/O	UTG01F-97
33	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU			
34	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
35	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
36	UTG01R-01	Nonreclosing	Normal		UTG			
สิ้นสุด Switching								

แผนผังงานดับไฟแก๊สท่อทไลน์แคสลับป์ - เบลแคสลับป์ เป็นพีจี

รีโครสเซอร์ทของยทรีพี

และเชื่อม DDE จุดตรณสบ้านหนองยทรีพี

ก่อนดับไฟ

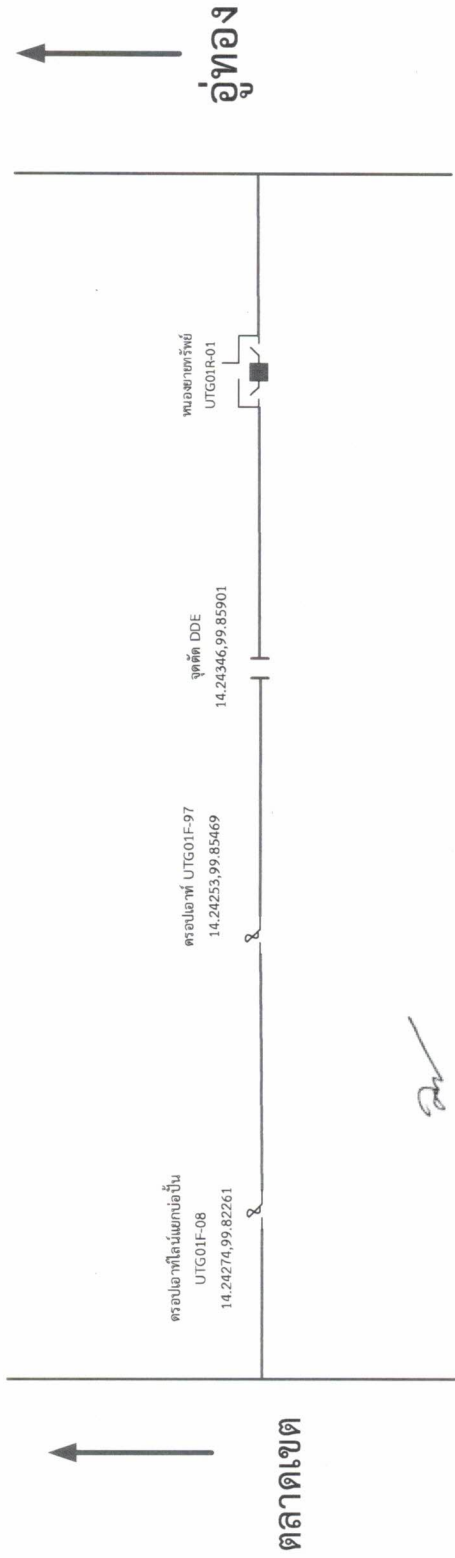


(นายจกกล โพธิกุล)
ชม.ป.บ.กฟอ.อู่ทอง

แผนผังงานดับไฟแก๊วของท่อไลน์แค้มป์ - เบลแค้มป์ เป็นพีจี

รีโครสเซอร์หนองยายทรัพย์

และเชื่อม DDE จุดรถขนเสาบ้านหนองยายทรัพย์

หลังดับไฟ(ปฏิบัติงานโดยขอทไลน์)

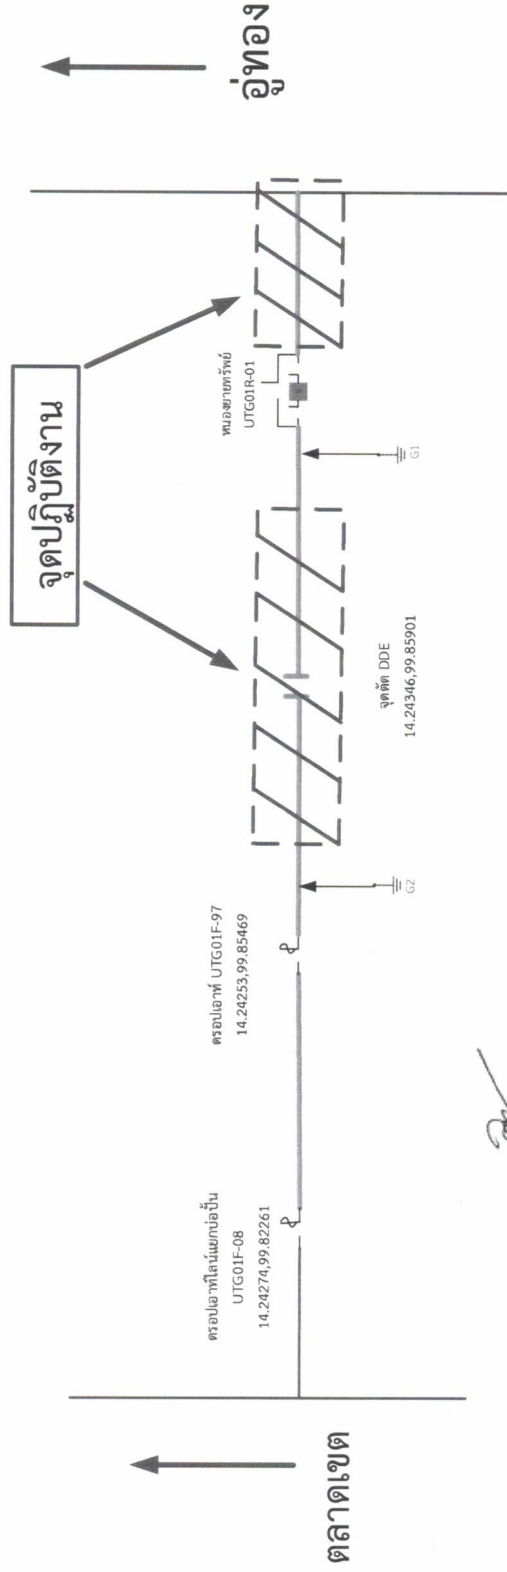


(นายจنگกล โพธิ์กุล)
ขณ.บ.บ.ท.อ.อุ้มทอง
