



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) 3๓๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปป.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี ขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB3YB	24 - 26 เม.ย. 68	08.00	17.00	ติดตั้งลูกถ้วย Line Post UG 115 kV/ มอเตอร์เวย์สำโรง	- NCB3YB-01	- NCB3YS-05	น.ส.พัฒนสุตา พงษ์เผ่า วศก.5 ผบ.กฟส.นช. 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุตา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๓๕๓๓๒๕ Long ๑๐๐.๑๙๓๓๔๐๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๓๕๓๓๒๕ Long ๑๐๐.๑๙๓๓๔๐๓

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ติดตั้งลูกถ้วย Line Post UG 115 kV..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... มอเตอร์เวย์สำโรง..... วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี..... ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า) ชื่อ..... นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง..... ชก.ก.ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๕๕๔๔-๓๕๓๔..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า..... ตำแหน่ง..... วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๕๓๖-๑๔๒๐๓..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.ผู้รับจ้าง..... 	
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วศก.๕ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖).....	
๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....	
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching.....	
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....	
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ ☒ ไม่มีข้อทักท้วง ☐ ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ..... วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....	
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน วันระดมหรือไม่ ☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ☒ จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑..... วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม..... ชก.ก.ท) , ผบ. , กรย.(กต), จป. และ ผู้รับจ้าง.....	
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่ ☐ ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... ☒ ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘.....	

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟครั้งนี้

(นายชลิต สีขาวคำ)

พ.บ.กฟส.นครชัยศรี


๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน

เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้


๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เปรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง

หมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้
จ่ายไฟฟ้า


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

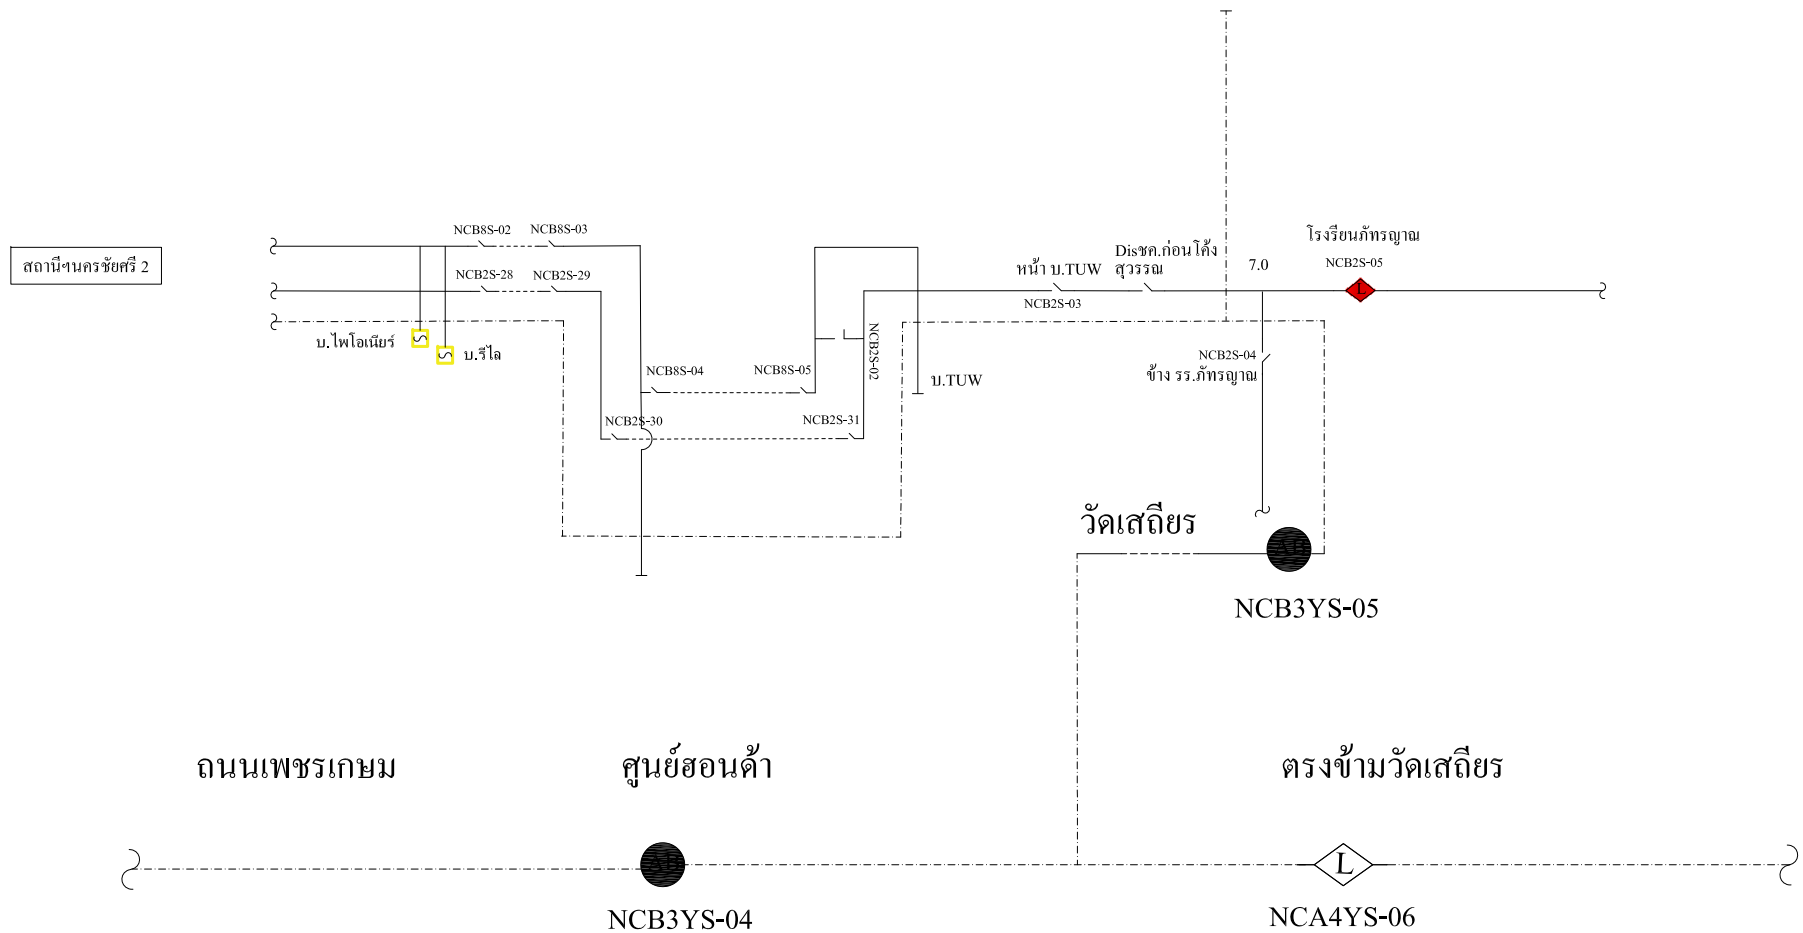

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

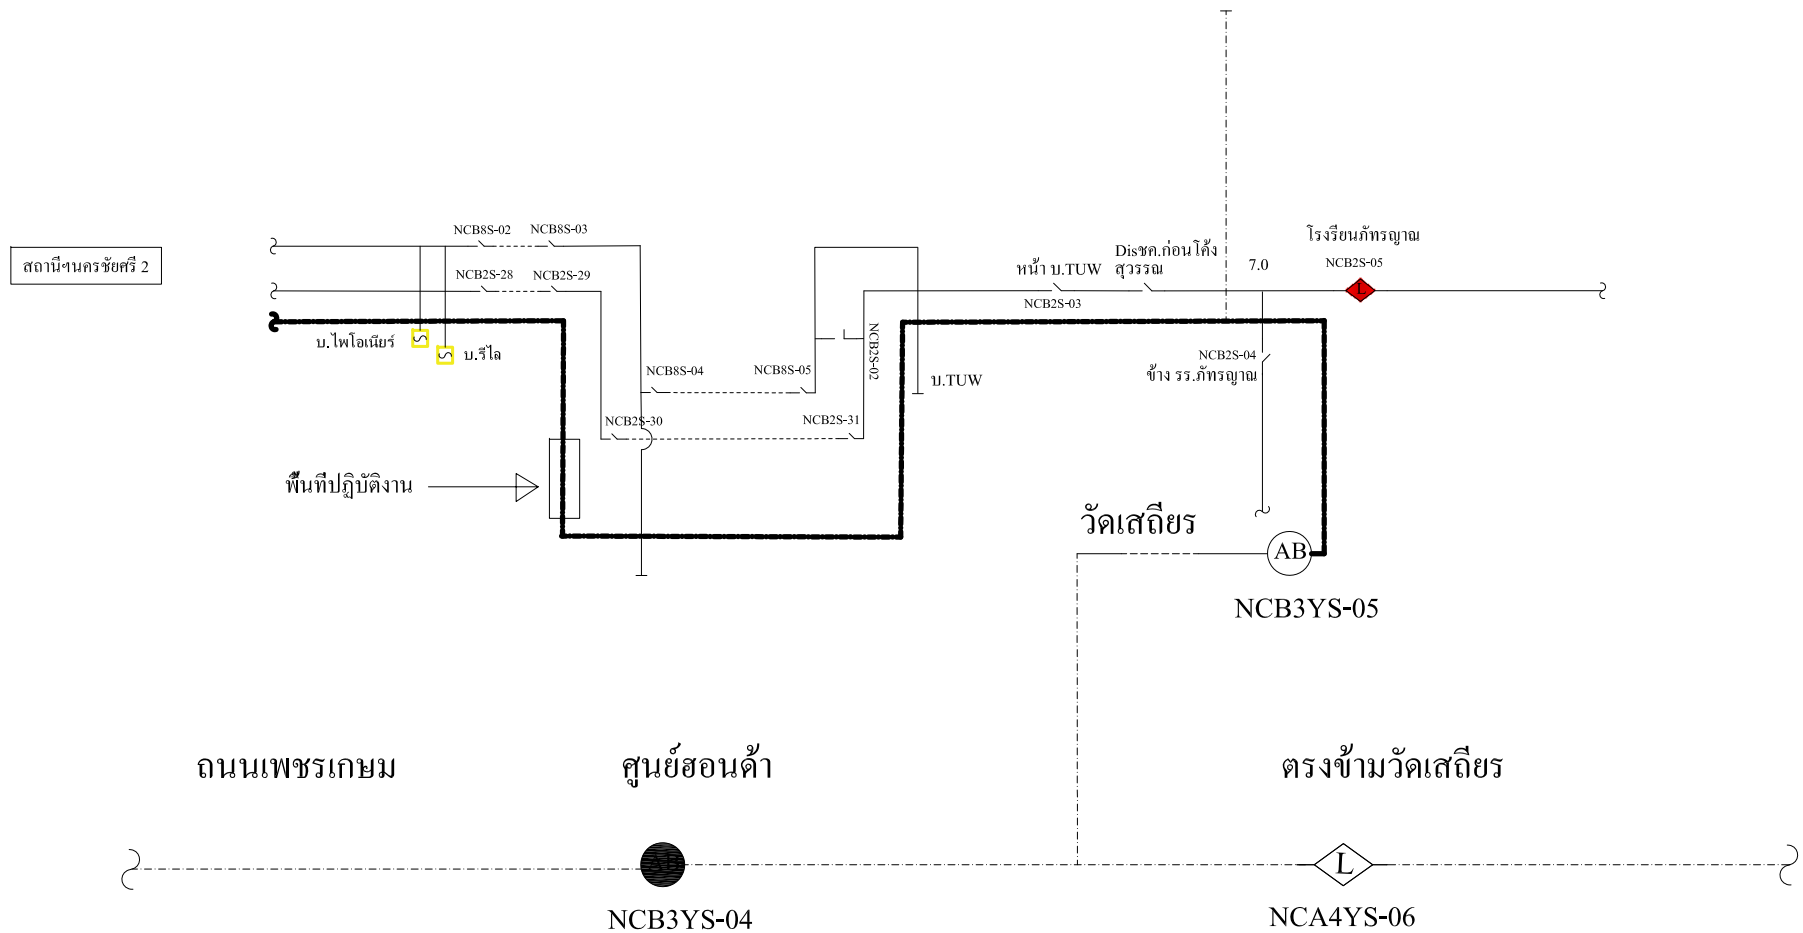

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

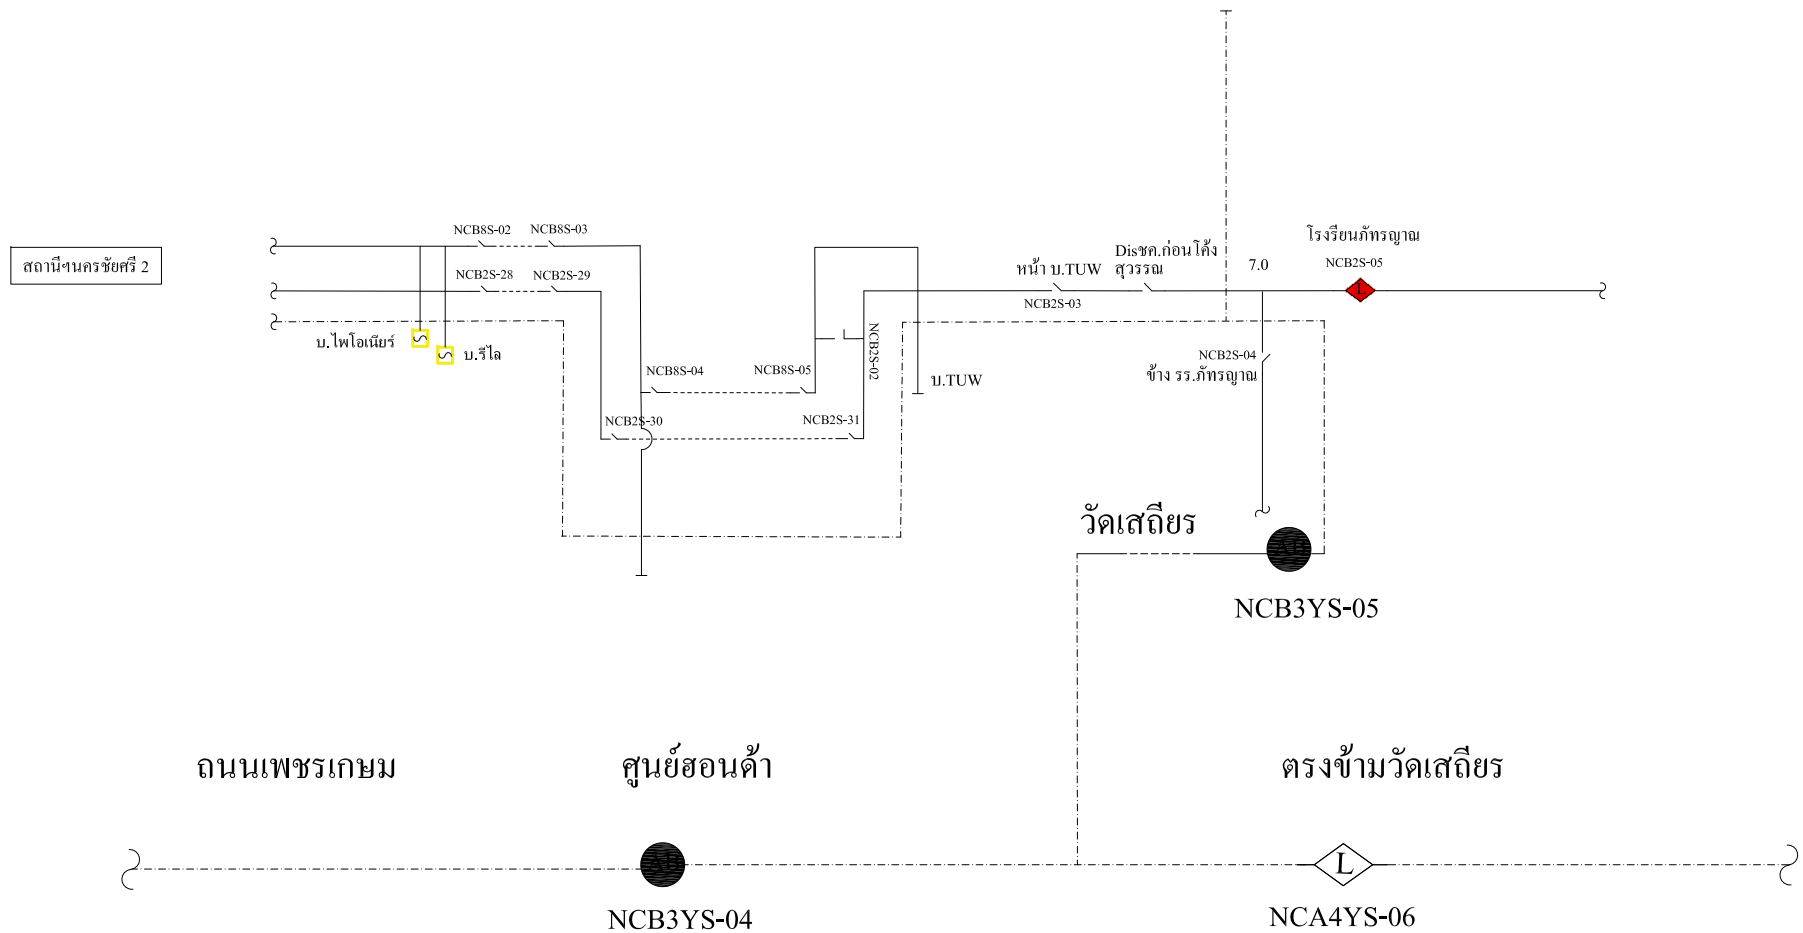



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรย.(กต)

ถึง กปบ.(กต)

เลขที่ ก.ต กรย.(จส) ๑๐๐๕ / ๒๕๖๘

วันที่

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดับไฟเพื่อเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) งานจ้างเหมา
ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข ๘๑ บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง
หมายเลข ๓๒๓๓ (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เรียน อก.ปบ.(กต)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จก.๓ (ผกม) ๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีวเจอร์ เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข ๘๑ บริเวณก่อสร้างทางเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๓ (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นั้น

ตามหนังสือที่ FPC-PEA-001/2568 ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างแจ้งขอดับไฟระบบ
๑๑๕ เควี เพื่อดำเนินการเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่
ส่งมาด้วย

เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน และมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน กรย.(กต) จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์จ่ายไฟ กปบ.(กต) ดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณ
จุดก่อสร้างงานดังกล่าว เพื่อเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖
เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. (ดับกระแสไฟฟ้าตอนเช้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าตอนเย็น) โดย
มอบหมายให้นายวัชร เวทีภิรมย์ พง.๖ ผจส.กรย.(กต) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๕๓๒-๓๓๓๖ เป็น
ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป

นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

อก.รย.(กต)

ที่ ก.ต กรย.(จส) ๑๐๐๕ / ๒๕๖๘

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟส.นครชัยศรี (M)

เพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)

อก.รย.(กต)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘



กรร.(กต)	19/6
เลขที่รับ	
วันที่	๙ มิ.ย. ๖๘
เวลา	

ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ชิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

เลขที่ FPC-PEA-001/2568

7 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟเพื่อติดตั้งนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เรียน ผู้ควบคุมงาน (คุณจักรพันธ์ นรเหรียญ) ตำแหน่ง พชง.6 พจส.กรร.(ก3)
อ้างถึง

- (1) สัญญาจ้างเลขที่ จก.3(พคม) 51/2567 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567
- (2) แผนงานตัดไฟเพื่อติดตั้งนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal)

ตามอ้างถึง (1) ทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้ง บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี) ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีรายละเอียดตามความเจ้้นั้น

สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานก่อสร้างได้ดำเนินการค้นท่อลอดและขึ้นชุด Cable Riser เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตั้งชุดนั่งร้าน SD-UG-5 และเจาะรูสำหรับติดตั้งลูกถ้วย Line Post (Horizontal) ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสารอ้างถึง (2) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อติดตั้งนั่งร้าน และดับไฟระบบ 115 เควี เพื่อดำเนินการเจาะรูเสาตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นาย วสันต์ ละหุ่ง)


ผู้จัดการภาคสนาม

ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

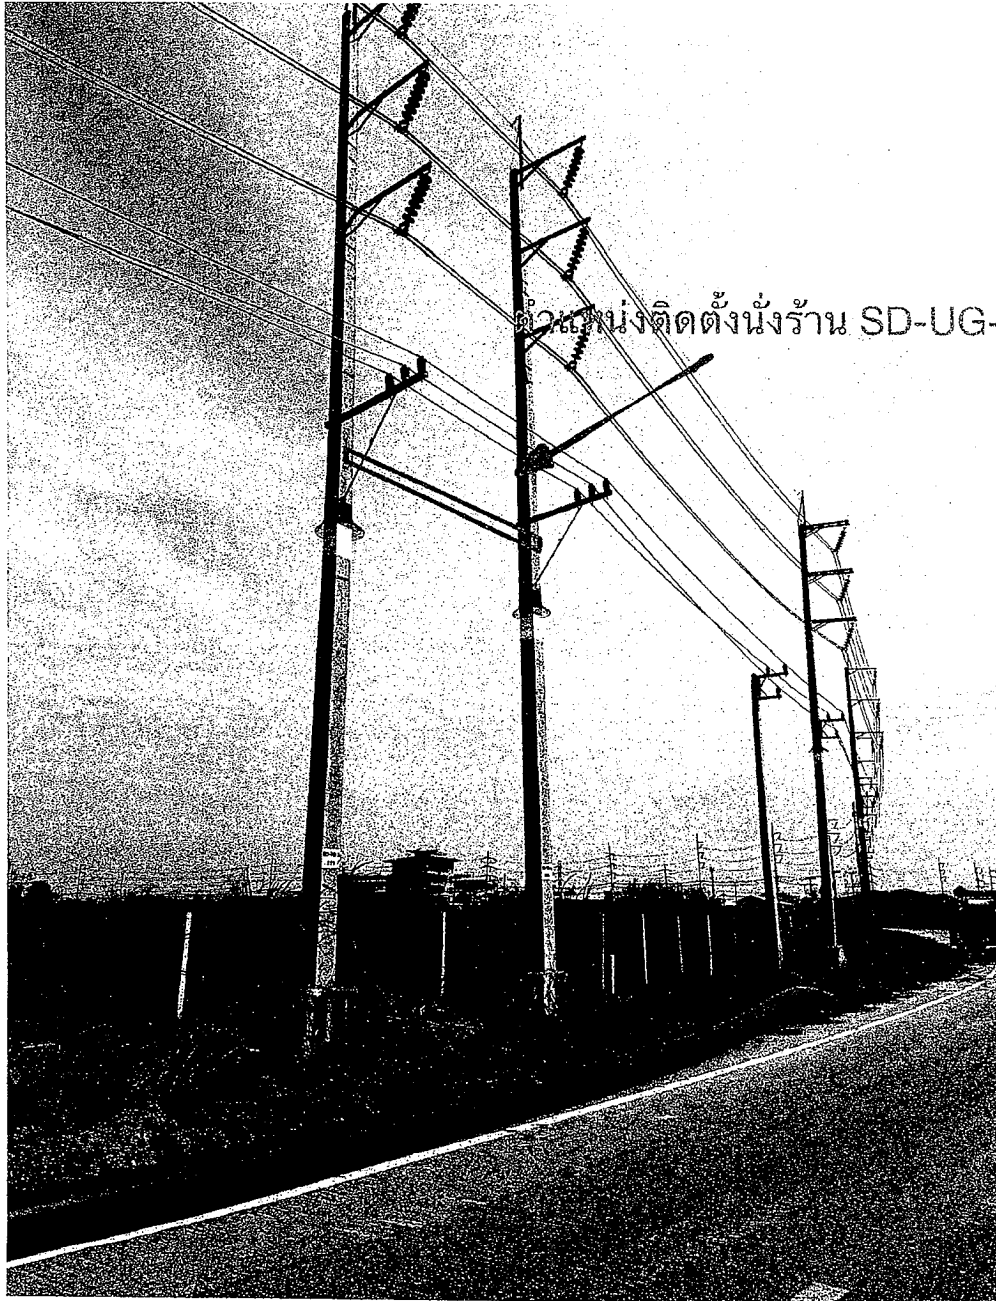

ตำแหน่งติดตั้งนํ้าร้อน SD-UG-5

ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330



ตำแหน่งเจาะรูเสาสำหรับลูกถ้วย Line post


ฝ่ายบริหาร โครงการก่อสร้าง 5

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

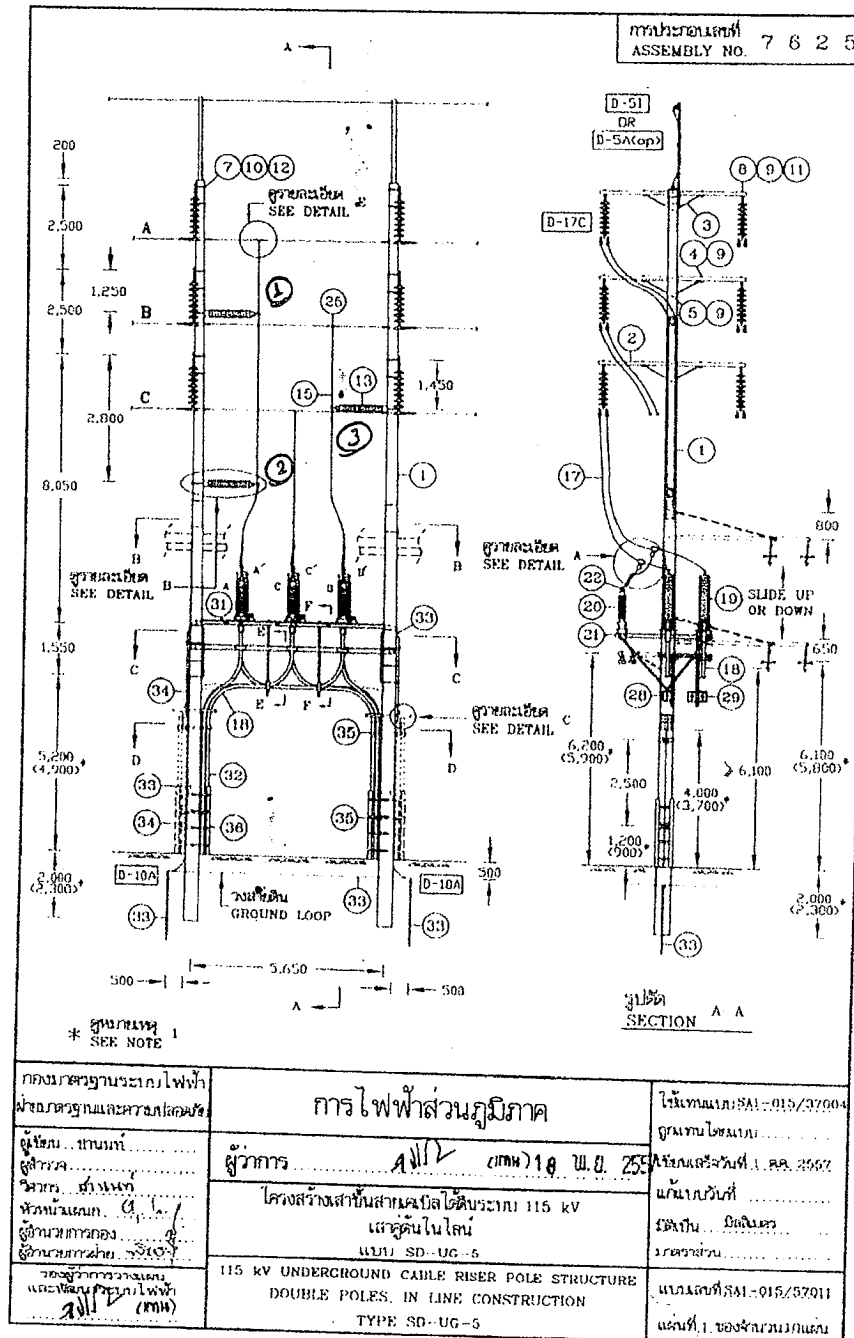



แผนงานก่อสร้างงานไฟฟ้า

จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ทางหลวงหมายเลข 81 บริเวณก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3233 (Interchange นครชัยศรี)

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT



THAI POWER
CONSTRUCTION

บริษัท ปิอี อ.นครชัยศรี จำกัด

รายการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เวลาดำเนินงาน		เม.ย.-68											หมายเหตุ	
				เริ่ม	จบ	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
งานก่อสร้างขุดเปิดที่ดิน แยกไฟฟ้า	21 เม.ย. 68	26 เม.ย. 68	6															
งานติดตั้งจุดตั้งฐาน SD-UG-5	21 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	3	08:00 น.	17:00 น.													รับไฟฟ้า Line 22 kv
ขุดฝังฐาน P1 (SD_UG_5)	21 เม.ย. 68	21 เม.ย. 68	1	08:00 น.	17:00 น.													
ขุดฝังฐาน P2 (SD_UG_5)	22 เม.ย. 68	23 เม.ย. 68	2	08:00 น.	17:00 น.													
ติดตั้งอุปกรณ์ Line Post	24 เม.ย. 68	26 เม.ย. 68	3	08:00 น.	17:00 น.													รับไฟฟ้า Line 115 kv
งานอาคารฐานสำหรับติดตั้ง Line Post (P1)	24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	1	08:00 น.	17:00 น.													
งานอาคารฐานสำหรับติดตั้ง Line Post (P2)	25 เม.ย. 68	26 เม.ย. 68	2	08:00 น.	17:00 น.													

หมายเหตุ :

นาย อดิศักดิ์
