



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓. กฟอ.บปง. (ปบ) ๑๐๖๐/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

Switching Deadline

2 ส.ค. 66

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB11	๕ ส.ค. ๖๖ ๒๑ ก.ค. ๖๖	08.30 น	15.00	เปลี่ยนเสาแรง สูง เนื่องจากสายส่ง EGAT สวิงฟาดเสาแรงสูงหัวเสาแตก	ไลน์แยกเข้าหมู่บ้านเจริญ รัตน์	สุดไลน์	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่บ้านเจริญรัตน์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.กฟอ.บปง.....โทร.....๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB11 จาก TAP ไลน์หมอกมาตวัด ถึง ศาลินรพขงจังหวัด
ในวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1100/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภสรวิทย์ เพ็ญพูน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

(นายอภสรวิทย์ เพ็ญพูน)
ว.ค.๕ ทน. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

ผจก. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (BPB11)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสาแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1100/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียมผดุง					วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)




ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
3	BP2-70222	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	TM-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	ดับไฟสายส่ง กฟผ. ไลน์ BP2 - TM						
7	BP2-70222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BP2-70223	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BP2-70224	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	TM-7022	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	TM-7023	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	TM-7024	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ดับไฟไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (BPB11)						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลดหม้อแปลงไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) ออก						
15	หลังจากทำการปลดโหลดหม้อแปลงไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) ออก ทั้งหมด เรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด PG จุดเชื่อมสายไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) ออก ทั้ง 3 เฟส (ปลดแบบมีไฟ)						
17	หลังจาก Hotline ทำการปลด PG จุดเชื่อมสายไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) ออก ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	BPB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
24	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
27	หลังจากผู้ควบคุมงานทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
28	BPB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	จ่ายไฟไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (BPB11)						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม PG จุดเชื่อมสายไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) เข้า ทั้ง 3 เฟส						
32	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม PG จุดเชื่อมสายไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) เข้า ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการนำโหลดหม้อแปลงไลน์แยกบ้านเจริญรัตน์ (วงจร BPB11) เข้าได้						
34	จ่ายไฟสายส่ง กฟผ. ไลน์ BP2 - TM						
35	BP2-70223	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
36	BP2-70224	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
37	BP2-70222	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	TM-7023	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
39	TM-7024	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
40	TM-7022	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BPB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
42	BP2-70222	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	TM-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

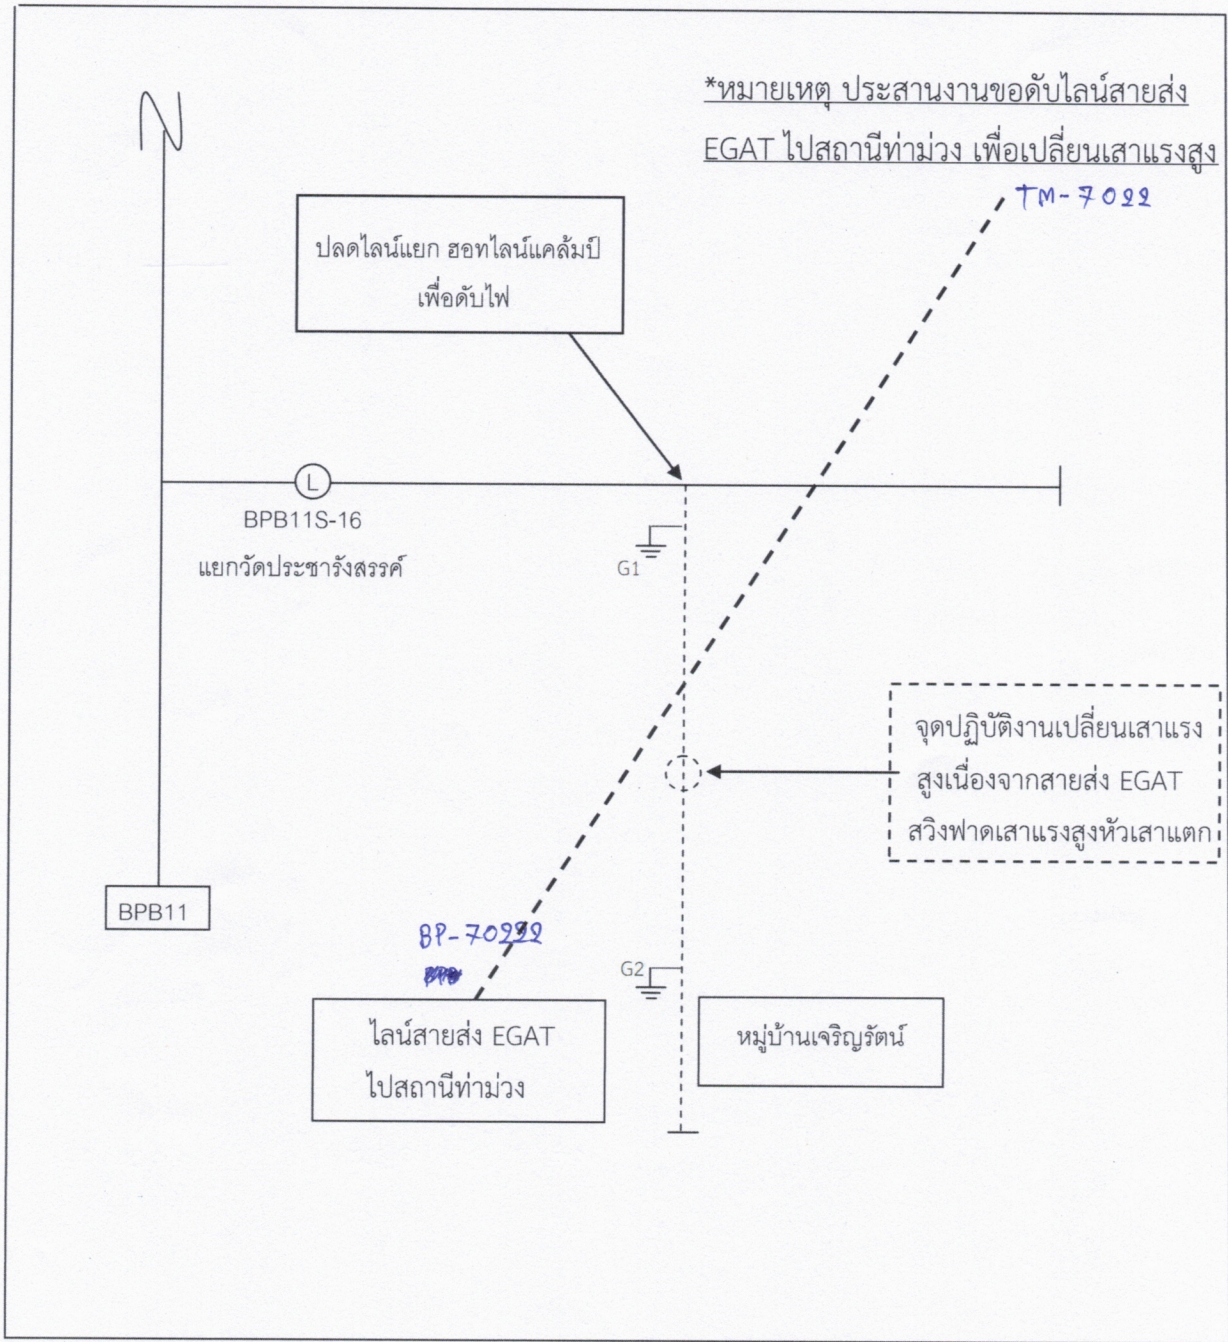

หมายเหตุ

-  เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
-  ตำแหน่งจุด Short Ground
-  จุดตัดเคต

ผู้ควบคุมงาน

นายวิทยา...เรื่อนสว

ผู้ Short Ground

จป.

นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์







