



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๕๖๗/ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

Switching Deadline

22 ส.ค. 67

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

ด้วย กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๒ และ ๐๓ สถานีกระทุ่มแบน ๕ เพื่อย้ายแนวสายไฟระบบจำหน่ายให้ อดต.อำแพง ตอกเสาเข็มก่อสร้าง ศาลาประชาคม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE๐๒	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายแนวสายไฟระบบ จำหน่ายให้ อดต.อำแพง ตอกเสาเข็มก่อสร้างศาลา ประชาคม	KTE๐๓S-๑๑ เชิงสะพานท่าจัน ฝั่งบ้านแพ้ว	จุดเปิด DDE สวนพุทธสาคร	นายเจษา คงพุกา ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๒๘๘๓๕๖
๒.	KTE๐๓				*** กรณีเร่งด่วน ***	จุดเปิด DDE สวนพุทธสาคร	KTE๐๘S-๐๗ เชิงสะพานท่าจัน ฝั่งบ้านแพ้ว	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรธนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ. โทร ๐๘๖-๒๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟส.สมุทรสาคร  
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KTE๐2 จาก DDE สวนพุทธสาคร ถึง KTE 85-04

ในวันที่ 23 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1172/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ KTE๐3 จาก DDE สวนพุทธสาคร ถึง KTE 33-11

ในวันที่ 23 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พุทธอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรธนันท์ บัวสงค์

สุจิตา  
(นางสาวสุจิตา งามบุญผูกก.)  
จตค. 5 แทน ผค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ อบต.อำแพง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ย้ายแนวสายไฟระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1172/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 17 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
3	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
4	- ย้ายโหลด KTE03 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE02						
5	KTE02S-16	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 แสร์กรีสมอร์ท
6	KTE03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		สะพานทำเงินฝั่งทำเงิน
7	ตรวจสอบ KTE08S-07 DIS เชิงสะพานทำเงินฝั่งบ้านแพ้ว ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
8	- เมื่อพร้อมดับไฟ KTE02,03VB-01 เวลา 08.30 น.						
9	แจ้งกฟส.บพว.ทำการไลนโหลด KTE02,03 บริเวณสวนพุทรมลฑลพุทธสาคร ออกทั้งหมด ทั้ง 2 วงจร(ตามผังแนบ)						
10	หลังจากกฟส.บพว.ทำการไลนโหลด KTE02,03 บริเวณสวนพุทรมลฑลพุทธสาคร ออกทั้งหมด ทั้ง 2 วงจร เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งกฟส.บพว.ทำการตัดเตส KTE02,03 บริเวณสวนพุทรมลฑลพุทธสาคร ออกทั้ง 3 เฟสทั้ง 2 วงจร (ตามผังแนบ)						
12	หลังจากกฟส.บพว.ทำการตัดเตส KTE02,03 บริเวณสวนพุทรมลฑลพุทธสาคร ออกทั้ง 3 เฟสทั้ง 2 วงจร เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บพว.รับทราบ						
14	แจ้งกฟส.บพว.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งกฟส.บพว.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
16	แจ้งกฟส.บพว.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G3						
17	แจ้งกฟส.บพว.เทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4						
18	แจ้งกฟส.บพว.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งกฟส.บพว.ปฏิบัติงานได้						
20	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
21	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากกฟส.บพว.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
25	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
26	แจ้งกฟส.บพว.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
27	แจ้งกฟส.บพว.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
28	แจ้งกฟส.บพว.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
29	แจ้งกฟส.บพว.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งกฟส.บพว.ทำการเชื่อมเตส KTE02,03 บริเวณสวนพุทธรณีสถิตพุทธสาคร เข้าทั้ง 3 เฟสทั้ง 2 วงจร (ตามผังแนบ)						
31	หลังจากกฟส.บพว.ทำการเชื่อมเตส KTE02,03 บริเวณสวนพุทธรณีสถิตพุทธสาคร เข้าทั้ง 3 เฟสทั้ง 2 วงจร เสร็จเรียบร้อย						
32	แจ้งกฟส.บพว.ทำการนำโหลด KTE02,03 บริเวณสวนพุทธรณีสถิตพุทธสาคร เข้าทั้งหมด ทั้ง 2 วงจร(ตามผังแนบ)						
33	หลังจากกฟส.บพว.ทำการนำโหลด KTE02,03 บริเวณสวนพุทธรณีสถิตพุทธสาคร เข้าทั้งหมด ทั้ง 2 วงจร เสร็จเรียบร้อย						
34	- ย้ายโหลด KTE03 บางส่วนกลับจาก KTE02						
35	KTE03S-11	ปลด	สับ		บพว.		DIS สะพานท่าจีนฝั่งท่าจีน
36	KTE02S-16	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 แสนร์กรีสอร์ท
37	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
38	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

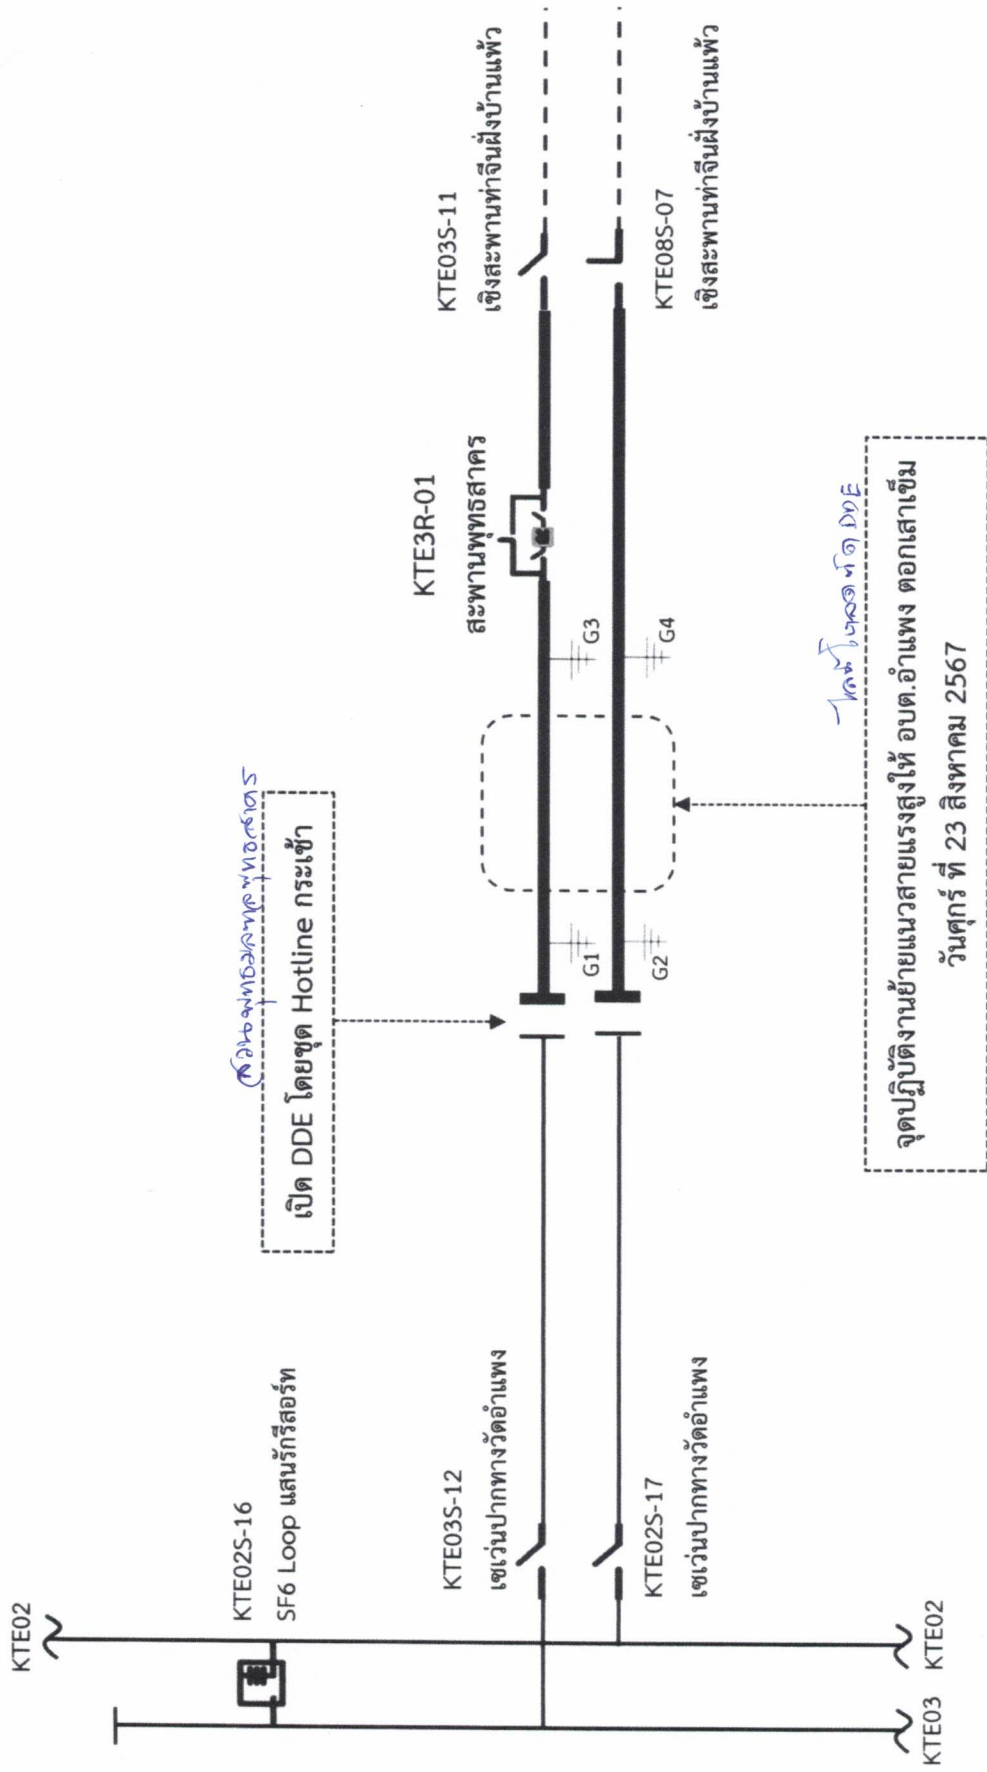

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground
