



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

16 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๓๗๗๔ / ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
 ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันนุตร

วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๖
 ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
SMB๑๓	๒๐ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตั้งแต่นิคมอยู่เจริญถึงปาก คลองชลประทาน	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ เลย์นิคมอยู่ เจริญ	SMB๕S-๑๐ ก่อนถึงหมู่บ้าน สินธร	นายไชรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร.๐๙๐-๙๑๗๗๑๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่นิคมอยู่เจริญถึงปากคลองชลประทาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หล.ปบ โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ นันนุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB13 จาก DPE เลขนิคมย่อยถึง SMB45-10
ในวันที่ 20 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1191/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพธิ์พันธุ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ สายอำนาจ เห็นทอง


(นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์)
อดก.4 11กค นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจฟ. (.....) (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่นิคมอยู่เจริญถึงปากคลองชลประทาน (SMB13)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1191/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	8 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบ SF6 ก่อนถึงหมู่บ้านสินธร รหัส SMB04S-10 อยู่ตำแหน่ง "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
5	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการไล่นิวโทรเจน SF6 SMB04S-10 ถึง จุดปลดสายบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ ออก						
6	เมื่อ กฟจ.สค. ทำการไล่นิวโทรเจน SF6 SMB04S-10 ถึง จุดปลดสายบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ ออก แล้วเสร็จ						
7	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ ออกทั้ง 3 เฟส						
8	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟจ.สค. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งให้ กฟจ.สค. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
14	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
16	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
17	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟจ.สค. ปลด Short ground จุด G2						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณเลนนิคมอยู่เจริญ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการเชื่อมโหลดคืนระบบ						
23	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการปลดล๊อคคาน SF6 ก่อนถึงหมู่บ้านสินธร รหัส SMB04S-10						
24	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

กรมการช่างเทคนิค
กรมการช่างเทคนิค

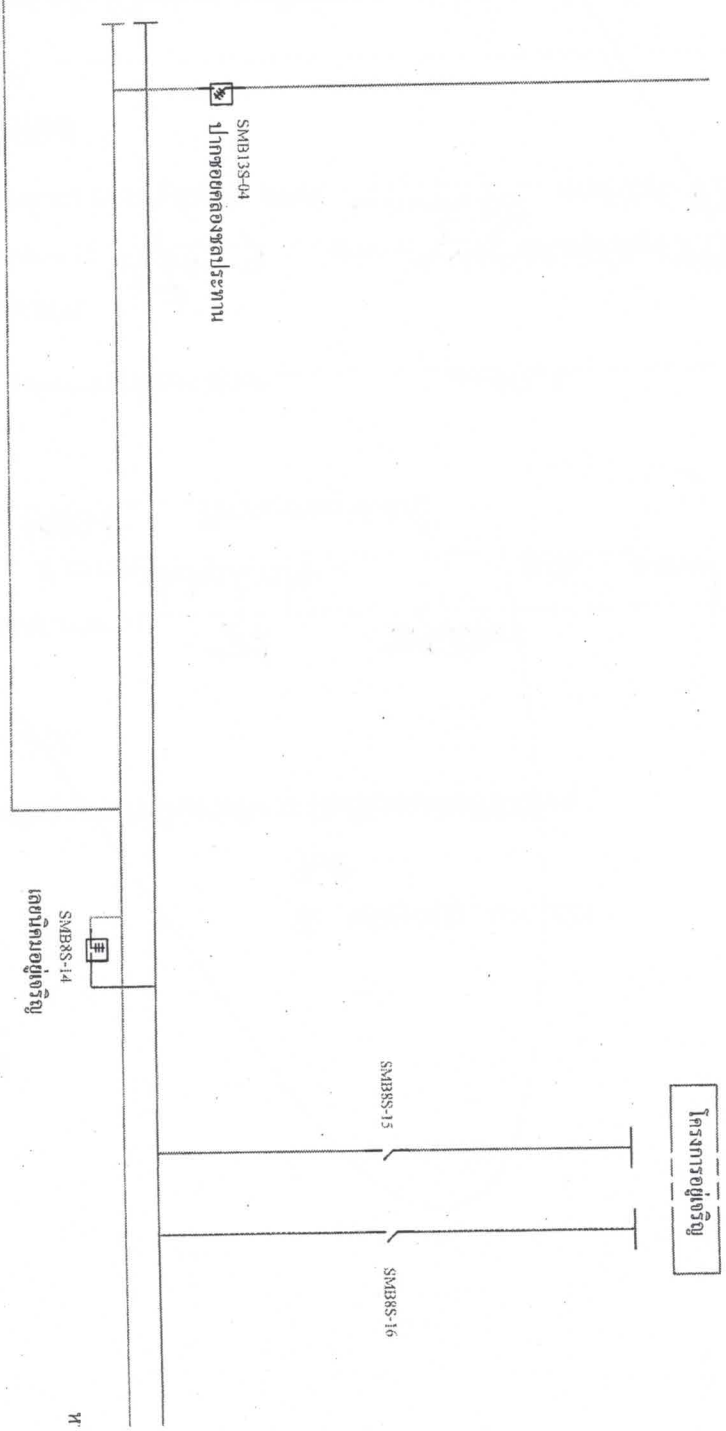

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า

