



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๒๕๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง กก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานให้เขตตามเดิมของกรรมสิทธิ์ของ กฟอ.กทบ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๔๖๒-๐๑	๒๒ ก.ย.๖๔	๐๔.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	เพื่อให้เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน จะดำเนินการยก โครงเหล็กหลังคาตาม เอนกประสงค์	ADS KTD 04๖๒-0๑ ใต้ปางเตชะ	CB KTE 04๖๒-01 และถึง CB KTA 0๓๖๒-01	นายสมชาย มาบัณฑิต ทพ.ปบ.กทบ. โทร. ๐๙๒-๐๐๔๔๔๔๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิต ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๙๒-๐๐๔๔๔๔๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กตรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

- พิชิต อุดมรักษาทรัพย์
(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115๗๖ จาก KTDAYS-06 ถึง KTA3๖3-0๑ KTEAYS-02
ในวันที่ ๒๒-๐๙-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง 15๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1240/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ สมชาย มาบัณฑิต
21 ก.ย. 64

(สมชาย มาบัณฑิต)
๐๐๓. ๗ กทบ นว.๐๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

ออก.บช.(ก.๓), ออก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี) ระยอง 1

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว
เสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


สถานที่ทำงาน	หน้าเทศบาล กทบ.					
กำหนดวันที่ทำงาน	22/09/2564	เวลา	09.00 น.	ถึง	22/09/2564	เวลา 15.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ให้เทศบาล กทบ. ยกโครงเหล็กหลังคา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1240/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	21 กันยายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 กันยายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 กันยายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTA, KTE และระบบ 115 เควี SAA01YB-01, SAA03YB-01 จ่ายไฟแบบ CLOSE LOOP							
1	เมื่อพร้อมดับไปปฏิบัติงาน						
2	KTA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	KTE04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KTA03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
5	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		
6	KTD04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ		ABS. 115 KV. เนืออย่างเอเชีย
7	KTE04YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	KTD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
9	KTA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	KTE04YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
11	KTD04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กทบ		ABS. 115 KV. เนืออย่างเอเชีย
12	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		
13	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
14	KTA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	KTE04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							


แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าเทศบาลเมืองระงุมแบน
 เพื่อให้เทศบาลเมืองระงุมแบน ดำเนินการยกโครงการหลักหลังคาคลุมลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระงุมแบน
 (ตามหนังสือเลขที่ ศก ๕๒๐๔/๑๕๘๘ ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๔ และหนังสือเลขที่ SRC ๒๒๗๖๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๖๔)
 ขอตัดการจ่ายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า ๒๒ กิโลวัตต์ ที่ ๒๒ กิโลเมตร ๒๕๖๔ (ลว ๑๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้งานได้รับผลกระทบจากการตัดไฟในครั้งนี้

จุดยกโครงการระบบสายส่งประมาณ 3.0 เมตร
 ใช้รองรับจำนวน 4 ชั้น
 (หลังจากติดตั้งแล้วจะวางระบบสายส่งประมาณ 10 ม.)




อาคารเมืองระงุมแบน

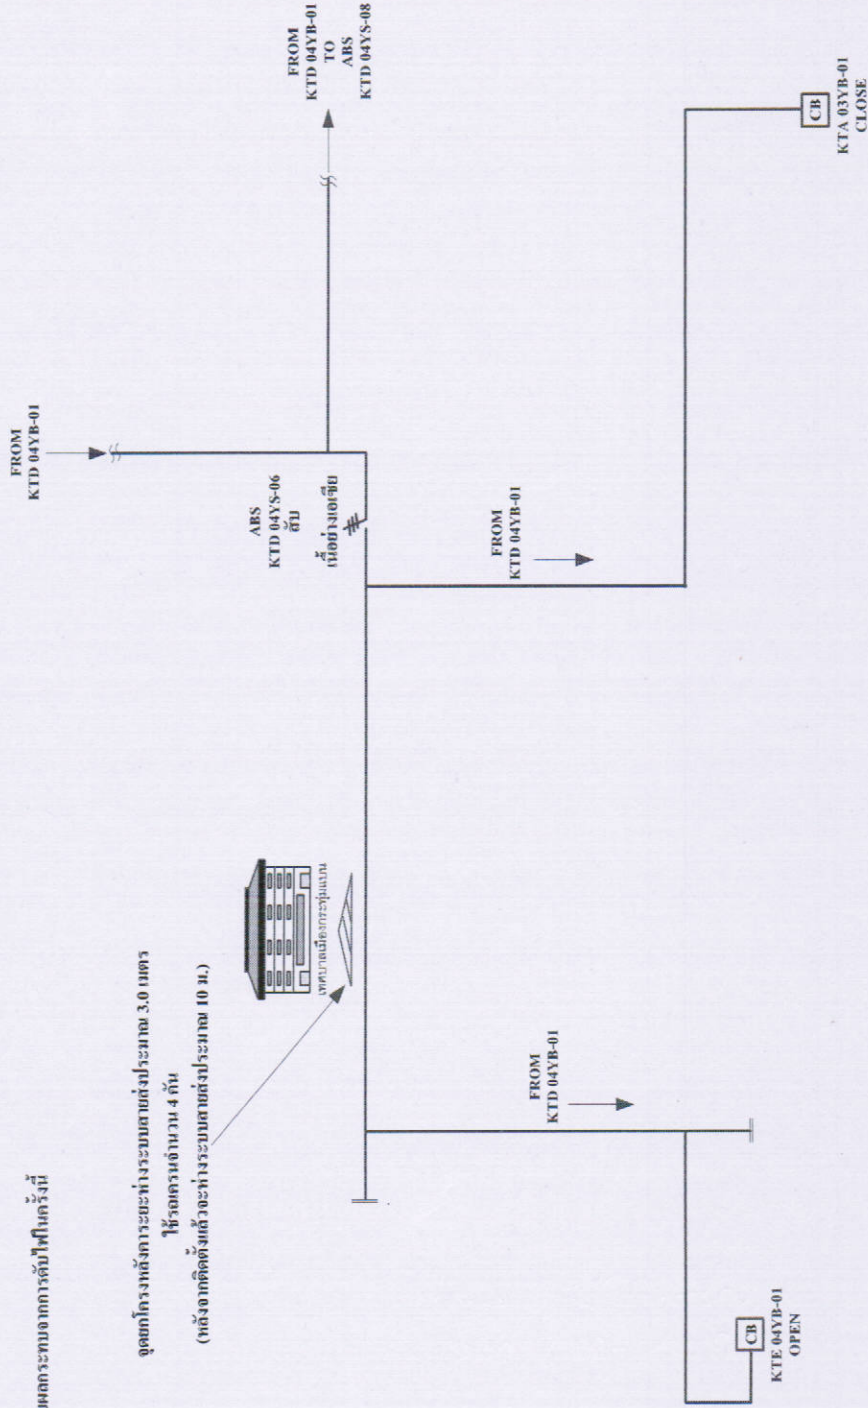

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังอัปเดต ระบบสายส่ง ๑๕ คิว บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 เพื่อให้เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ดำเนินการยกเครื่องเหล็กหลังคาคลุมลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 (ตามหนังสือเลขที่ ศก ๕๒๐๐๔/๑๕๘๑ ลว. ๑๕ ก.ย. ๖๔ และหนังสือเลขที่ SRC ๒๒๓๖๖๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๖๔)
 ขอคำกรณีจัด เป็นแรงดันไฟฟ้า ๒๒ กัณยาน ๒๕๖๔ 131 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบการดับไฟในครั้งนี้

จุดยกเครื่องหลังคาจะห่างระบบสายส่งประมาณ 3.0 เมตร
 ใช้รถตกรถจำนวน 4 คัน
 (หลังจากติดตั้งแล้วจะห่างระบบสายส่งประมาณ 10 ม.)

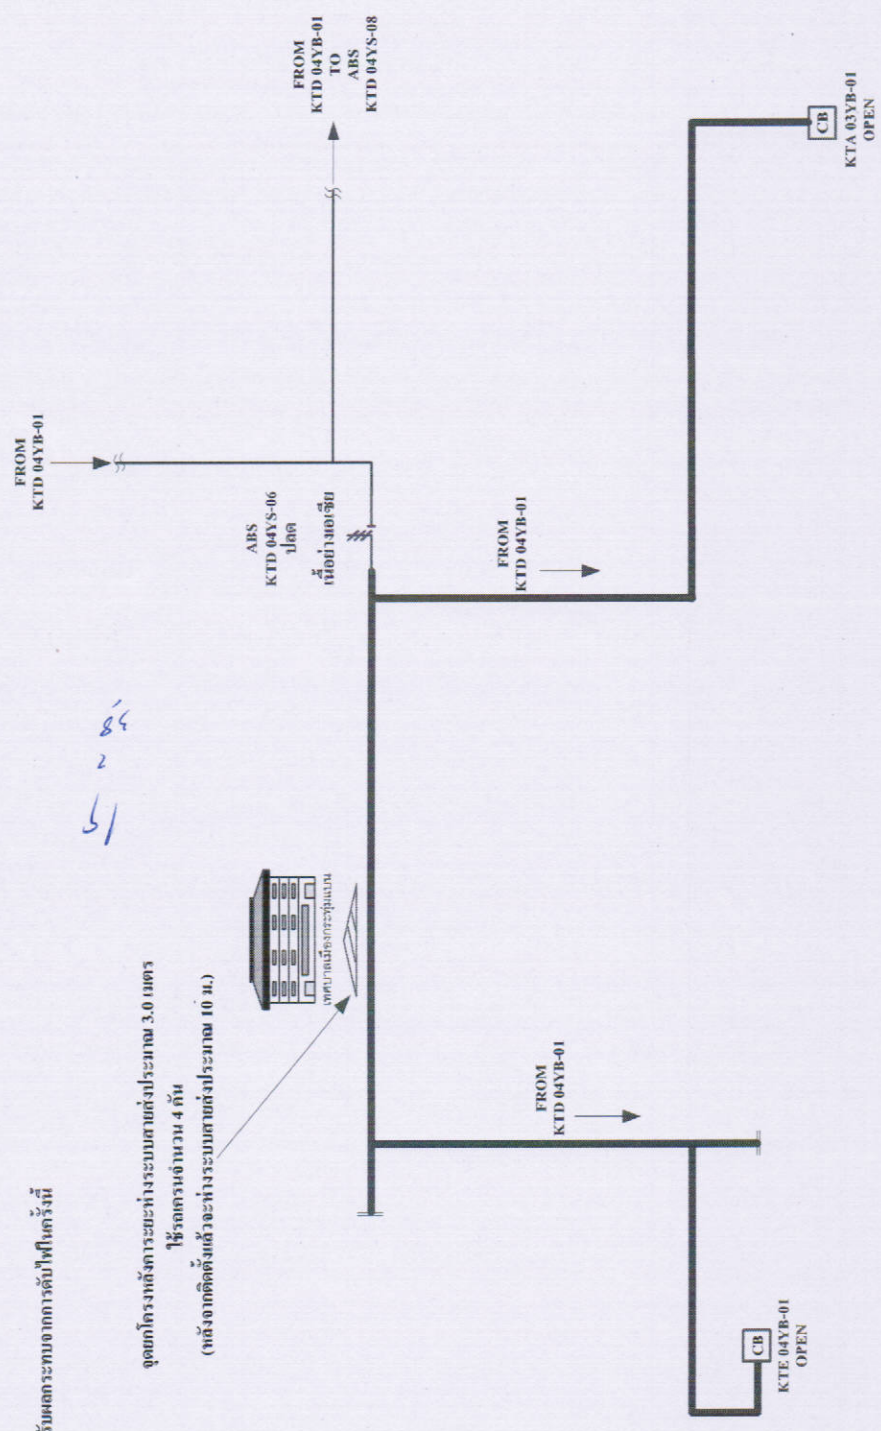

หมายเหตุ เส้นที่บ่งสายส่งระบบ 115 คิว โด่ง KTD 04YB-01 ไฟดับ



กรอ.กระทรวงแบบ
เลขที่รับ ๕๙๕๓
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๒๗

ที่ สค ๕๒๑๐๔/๑๕๕๑

สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
ถนนสุขนครวิท อำเภอกะทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความปลอดภัยจากสายไฟฟ้าแรงสูง
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกะทุ่มแบน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบริเวณโครงการ

ด้วยเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กำลังดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ซี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมยกโครงหลังคาเหล็กขึ้นติดตั้ง ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว มีสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกะทุ่มแบนพาดสายอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการดำเนินการได้ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการและให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลน เทศบาลฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกะทุ่มแบน ช่วยพิจารณาดำเนินการสำรวจความปลอดภัยจากสายไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ซี คอนสตรัคชั่น จะเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมนี้เทศบาลฯ ได้ส่งนายรุ่งเรือง ใจอารีย์ เบอร์โทร. ๐๘๑-๖๘๖๑๔๕๓ เป็นผู้ประสานงานโดยตรง

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

<input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> รจก.(บ)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> ประชาสัมพันธ์
<input type="checkbox"/> วศก.9	<input type="checkbox"/> นตค.9	<input type="checkbox"/> ก่อปฏิบัติ	<input type="checkbox"/>ต้นเรื่อง
<input type="checkbox"/> นทท.9	<input type="checkbox"/> ผชน.9	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	(นายวีรช แดงเอี่ยม)
<input type="checkbox"/> ผชน.8	<input type="checkbox"/> พศค.	<input type="checkbox"/> รายงานผล	รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
<input type="checkbox"/> ทผ.กส.	<input type="checkbox"/> จป.	<input type="checkbox"/>	นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
<input type="checkbox"/> ทผ.มต.	<input type="checkbox"/> ทผ.บท.	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.บค.	<input type="checkbox"/> ทผ.วต.		
<input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปป.	<input type="checkbox"/> ทผ.บป.		
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ....		



Mr.
นายณัฐวัฒน์ ทัพพัชฌณะ
ผจก.กฟอ.กทบ.
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

๒๖ ม.ค.
ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 16:35
วันที่.....เวลา.....น

กองช่าง
โทร (๐๓๔) ๔๗๑๗๔๕ ต่อ ๒๓๘
โทรสาร (๐๓๔) ๔๗๑๗๔๕ ต่อ ๑๐๒

“ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ผังอาคาร สำนักงานเขตบางเขนเมืองระเทศใหม่

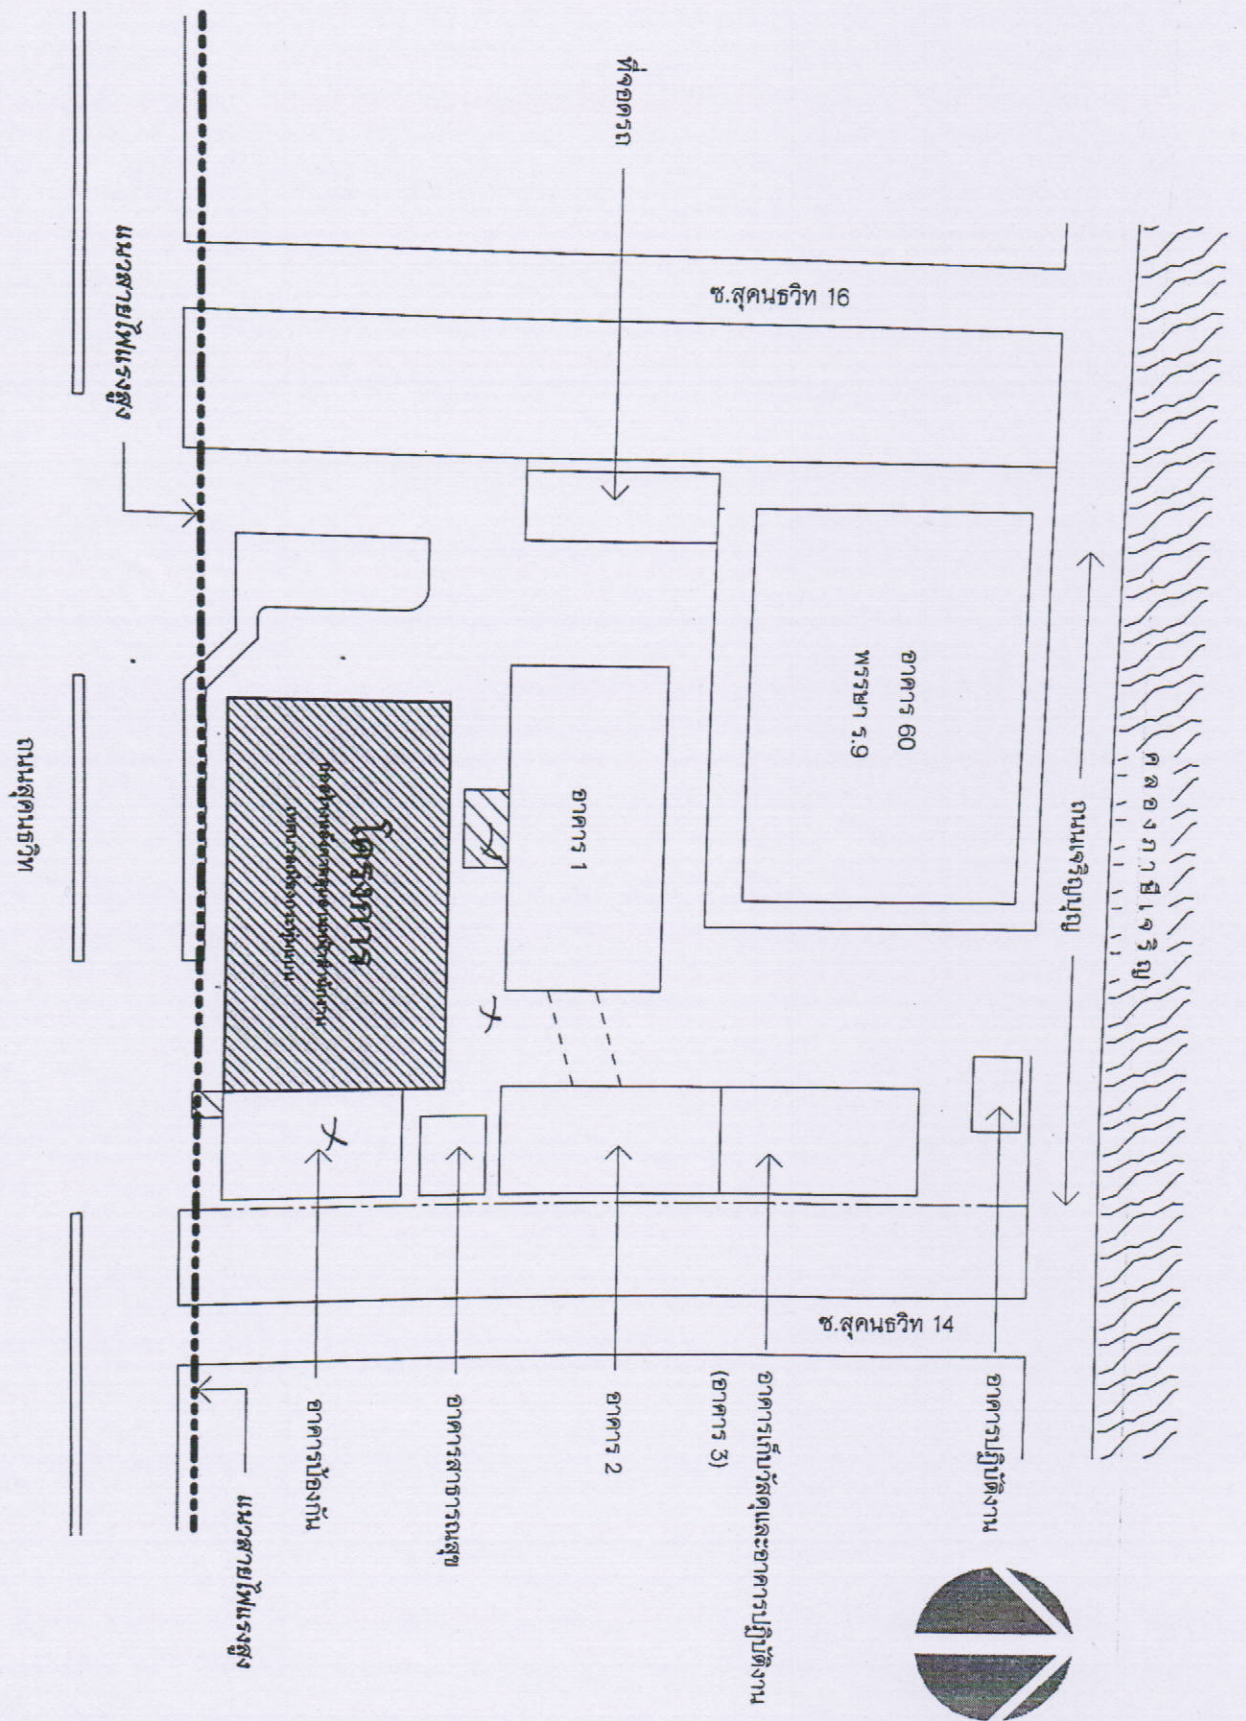

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ซี คอนสตรัคชั่น

27/312 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 089-9217536 , 086-3285476 โทรสาร 034-494255

ที่ SRC 223 / 2564

เลขที่ ๔๙๗
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓:๑๕ น.

วันที่ 17 กันยายน 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความปลอดภัยจากไฟฟ้าแรงสูง

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระทุ่มแบน

อ้างถึง หนังสือจากเทศบาลกระทุ่มแบนเลขที่ สค.52104/1581 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564

ตามที่ทางเทศบาลกระทุ่มแบนได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจความปลอดภัยในการเตรียมยกโครงหลังคาเหล็กขึ้นติดตั้ง เนื่องจากมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดสายอยู่บริเวณใกล้เคียง (รายละเอียดตามหนังสือแนบ) นั้น

ห้างฯ ขอแจ้งว่า ทางห้างฯ เข้าทำการยกโครงหลังคาเหล็กขึ้นติดตั้งในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยเข้าสำรวจเพื่อความปลอดภัยในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการและให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยและเสร็จสมบูรณ์ไปตามแบบแปลน พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ส่งนายรุ่งเรือง โจอารีย์ เบอร์โทร 081-6861953 และ นางสาวศิริพร นิมิตสกุลชัย ตัวแทนห้างฯ เบอร์โทร 086-3285476 เป็นผู้ประสานงานโดยตรง (เวลา 09.00น - 15.00น)

ทางห้างฯ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Signature: *[Handwritten Signature]*

<input checked="" type="checkbox"/> รจด.บป	<input type="checkbox"/> รจด.ปบ
<input type="checkbox"/> รจด.อ	<input type="checkbox"/> นสก.อ
<input type="checkbox"/> นทบ.อ	<input type="checkbox"/> สจน.อ
<input type="checkbox"/> นทบ.บ	<input type="checkbox"/> ทคค.
<input type="checkbox"/> นท.กส.	<input type="checkbox"/> จป.
<input type="checkbox"/> นท.มค.	<input type="checkbox"/> ทน.บข
<input checked="" type="checkbox"/> นท.บค.	<input type="checkbox"/> ทน.วท
<input checked="" type="checkbox"/> นท.ปบ.	<input type="checkbox"/> ทน.บป.
<input type="checkbox"/> กรรมการ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ...

<input type="checkbox"/> เทื่อทราบ	<input type="checkbox"/> ประชาสัมพันธ์
<input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ	<input type="checkbox"/>ต้นเรื่อง
<input checked="" type="checkbox"/> ความเห็นในความเห็นที่เกี่ยวของ
<input type="checkbox"/> รายงานผล.....
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

[Handwritten Signature]

นายณัฐวัฒน์ ทิพย์พัฒนะ

ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten Signature]

นางสาวศิริพร นิมิตสกุลชัย

คุณแฉศย์ชัย

หัวหน้าผู้จัดการ

สว ๒๗๑.

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 12.58

วันที่..... เวลา.....
