



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
26 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๒๕๐๑ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บั๊กเสไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ kV. บริเวณหน้าสถานีฯบางเลน ๒ (ชั่วคราว) ถึง จุดแบ่งแดน พุทธมณฑล ตามหนังสือขอตัดไฟ จาก พชง.๖ ผกร.กทค.(ก.๓) ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEU1	29 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	บั๊กเสแรงสูง ๑๑๕ kV	DIS ชั่วคราว (อิทธิพร มนต์)	BEU1S-07	นายวีรพัฒน์ นาคล มัย พชง.6 ผกร.กทค. (ก.3)
2.	BEU2					BEU2VB-01	BEU2S-02 BEU2S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ผังตรงข้ามสถานีฯบางเลน๒(ชั่วคราว)

*งานรับเดิน 1507

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแรงดัน เนื่องจากได้รับการร้องขอจากผู้ใช้เส้นทางจราจรว่า หลุมเสาที่ขุดรอไว้อยู่ใกล้ถนน เกรงว่าจะเกิดอันตราย สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEU1 จาก Dis. ๕๖ อิทธิพร มนต์ ถึง BEU 1S-07

ในวันที่ 29 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1551/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BEU2 จาก BEU 2VB-01 ถึง BEU2S-02, 03

ในวันที่ 29 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภกรสิทธิ์ เกี่ยมทอง ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายสุภกรสิทธิ์ เกี่ยมทอง)
๑๐๑.5 กกน. นท.๑๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ.....)


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ฝั่งตรงข้ามสถานีฯ บางเลน 2 (ชั่วคราว) (BEU01,02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1551/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	22 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งาน Switching ข้างเคียง เลขที่ 1507						
2	หลังจากดำเนินการ Switching เลขที่ 1507 แล้วเสร็จ						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
4	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	
5	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	
8	BEU02S-01	สับ	ปลด		บล.	DIS	Pothead F.2
9	DIS.ชด.ไลน์ BEU01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บล.	DIS	ชั่วคราว มิเตอร์แบ่งแดน
10	ตรวจสอบ SF6 BEU02S-02 (ตรงข้ามสถานีฯ), BEU01S-07 (ตรงข้ามร้านกึ่งเก), BEU02S-03 (สำนักพิมพ์พิสิกา) สถานะ OPEN พร้อมล๊อคคาน						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
15	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
20	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
21	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	BEU02S-01	ปลด	สับ		บล.	DIS	Pothead F.2
24	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		BEU	-	
25	DIS.ชด.ไลน์ BEU01	ปลด	สับ		บล.	DIS	ชั่วคราว มิเตอร์แบ่งแดน
26	ดำเนินการ Switching เลขที่ 1507 ต่อ จนแล้วเสร็จ						
27	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
28	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	-	
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

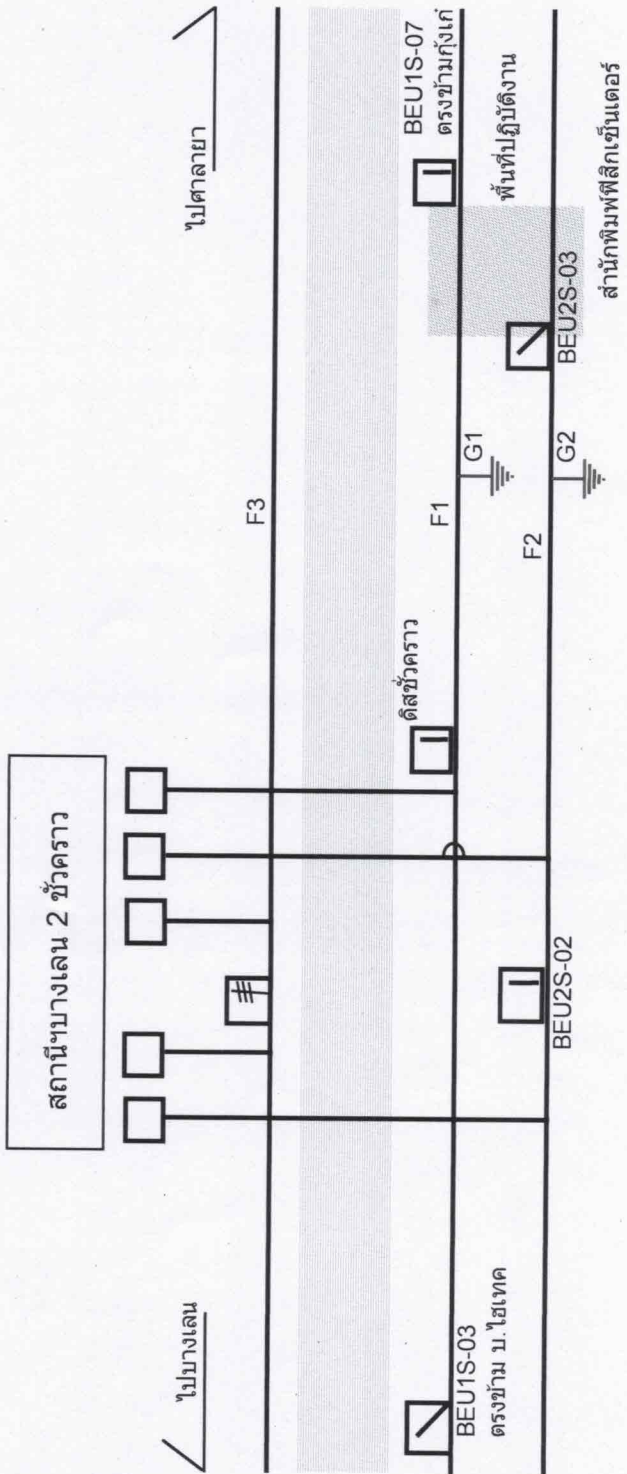

ฝังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟอ.บางเลน

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม
เรียน ผจก.กฟอ.บางเลน

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-BLNT0.0002 โครงการ 6001159267 โดยมี **นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน** ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. และระบบจำหน่าย ๒๒ kV. และแรงต่ำ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟอ.บางเลน ดำเนินการดังนี้

กฟอ.บางเลน

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ สฟพ.บางเลน ๒ (ชั่วคราว) ถึง ชนแดนบางเลน-พุทธมณฑล ระบบจำหน่าย ๒๒ kV. และแรงต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)

พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)

ผู้ควบคุมงาน
