



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

2 พ.ย. 2566

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๕๒๖๒ / ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ  
 จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๘	๕ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ นิคมอยู่เจริญท่าจีน	SMB๘S-๑๕ ปากทางนิคม อยู่เจริญ	ปลายสาย	นายสุชาติ กัลชนะ โทร.๐๙๓-๘๓๖๙๓๕๕
๒	SMB๐๘	๕ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดติดตั้ง DIS หน้า สถานีวงจรบน	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ นิคมอยู่เจริญท่าจีน.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง : ทผ.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.สค....


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS นท.

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเตอร์ SM88 จาก SM88S-15 ถึง ยงเวฟ  
ในวันที่ 5 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1590/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิธรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.อำนวยการ เขตฯ

  
( นาย นิธรา กลิ่นประทุม )  
อก.๕ เขตฯ กฟ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณนิคมอยู่เจริญ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1590/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	30 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
3	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
4	DIS ชค.ไลน์ SMB 8	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ชั่วคราวหน้าสถานีฯ วงจรบน
5	SMB08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางนิคมอยู่เจริญ
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G2						
9	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G3						
10	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G4						
11	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G5						
12	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G6						
13	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ และข้อตรกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	ตรวจสอบเชื่อม DDE ภายในระบบเรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ)						
18	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
23	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G5						
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G6						
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	SMB08S-15	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางนิคมอยู่เจริญ
27	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# กำหนดการสายไฟฟ้าก่อนดำเนินการ

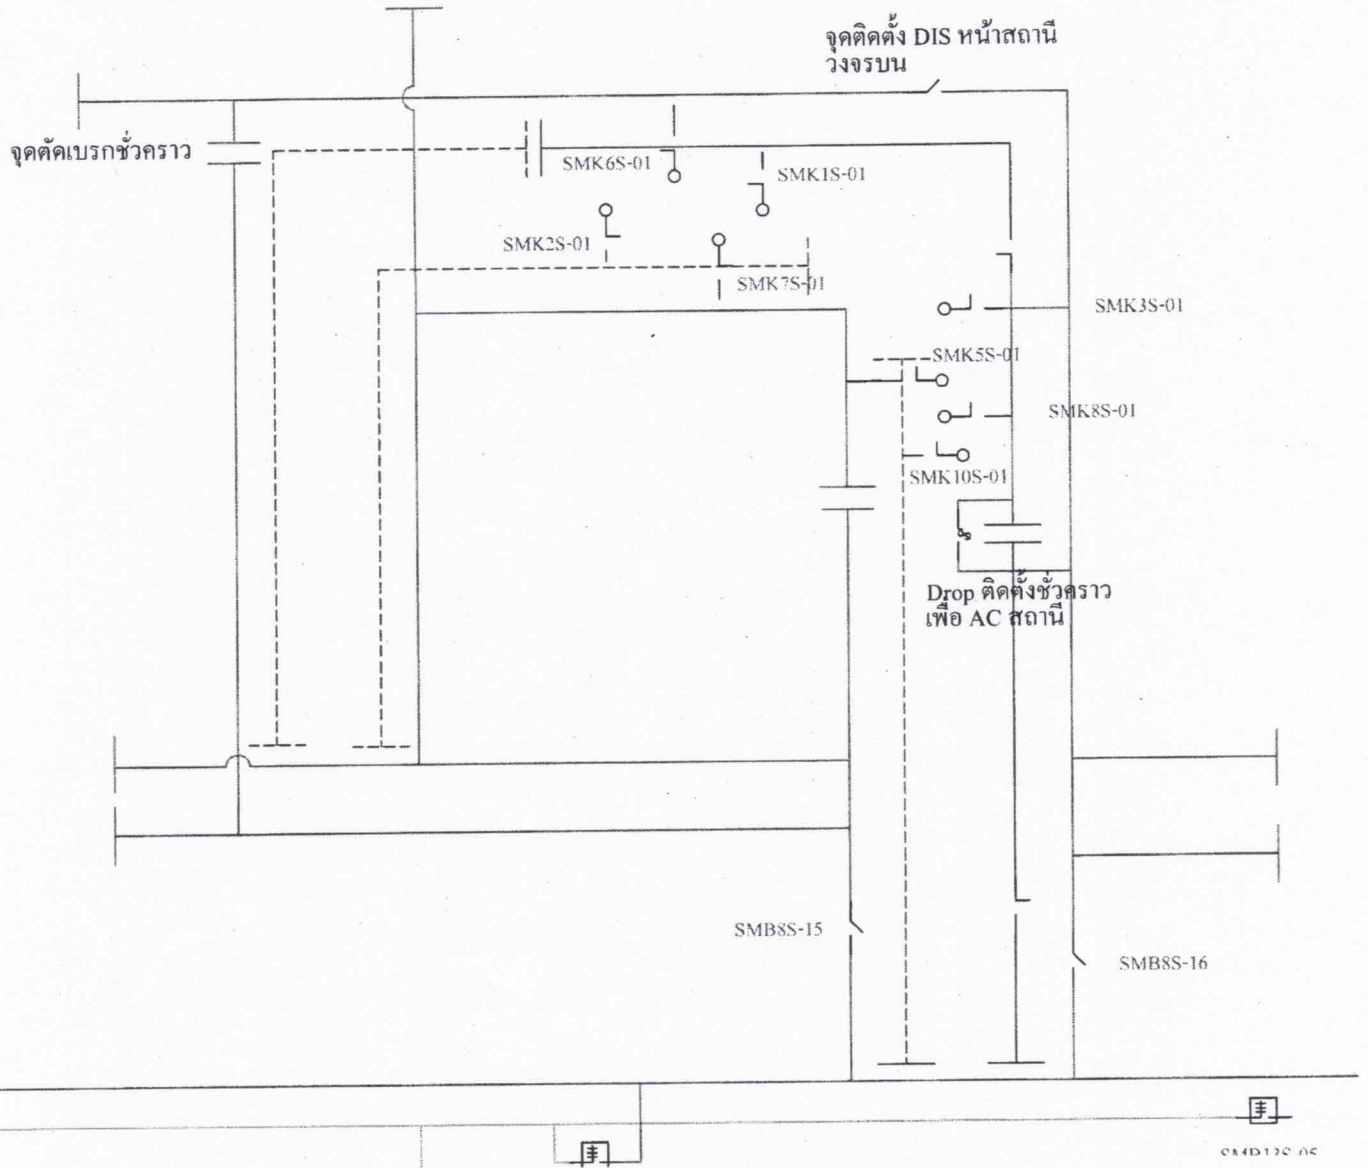

# ลักษณะการจ่ายไฟตอมปฏิกรณ์

