



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ต.ค. 65

เลขที่ ก.สกฟอ.บปง.(ปบ)2576/2565 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์ ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPB7YB	26 ต.ค.65	08.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับสถานี บ้านโป่ง 3	BPB7YB		นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รองรับ สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง.๓.....ตามแผนผังส่งมอบแนบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา.....ตำแหน่ง.....ช.ผ.บ.กฟอ.บปง.....โทร.....๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก BPB7YB-01 ถึง NPY49B-01
ในวันที่ 26 ๓ ๑ 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1600/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เก่งพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

(นายอภิสิทธิ์ เก่งพงษ์)
๐๙๐.4๗๗๒๕๑๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บ้านโป่ง

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี BPB, NPY)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ บ้านโป่ง 3 (BPB07YB-01 - NPV04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-ต.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับสถานีฯ บ้านโป่ง 3 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1600/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 12 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop BPB07YB-01, BPB09YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 - สถานีฯ นครปฐม 3						
6	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
8	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
9	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
11	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ใบมีด 115 เควี
12	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี รหัส NPV04YS-03 สถานีฯ นครปฐม 3 อยู่สถานะ "Open"						
13	แจ้งสถานะไฟดับ 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้ง กฟอ.บ้านโป่ง ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
15	หลังจาก กฟอ.บ้านโป่ง ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี) แล้วเสร็จ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง กฟอ.บ้านโป่ง ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี) ออก						
19	หลังจาก กฟอ.บ้านโป่ง ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี) ออก แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe เรียบร้อย						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 - สถานีฯ นครปฐม 3						
21	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
22	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
23	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	จ่ายไฟ 115 เควี (Loop BPB07YB-01, BPB09YB-01) Close Loop กลับสภาพปกติ						
25	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
26	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

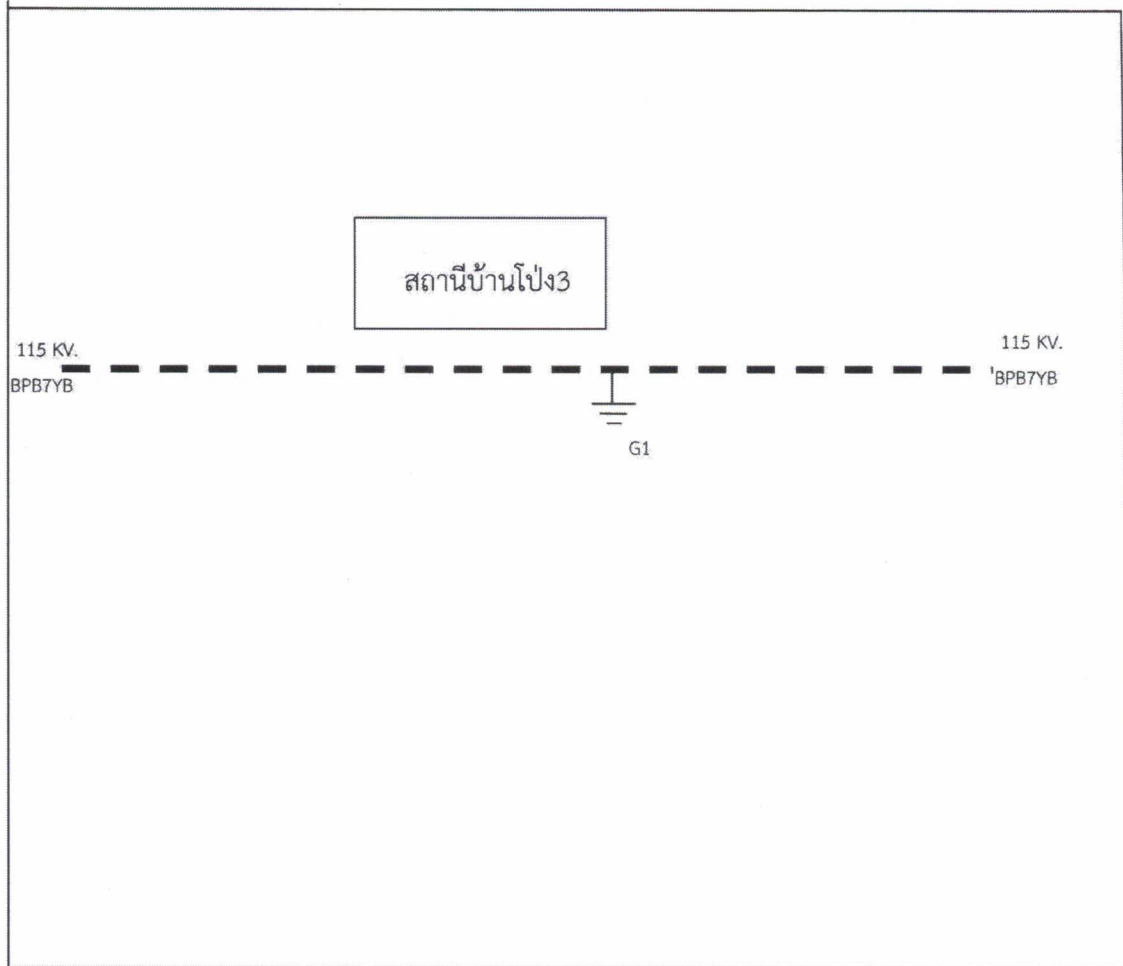

หมายเหตุ
- - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
|| จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายวิทย์ ธีรอนสา
ผู้ Short Ground นายชนพล ยะนิล
จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์



จาก พทง.กทพ.2

ถึง ผจก.กทอ บ้านโป่ง

เลขที่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสา 22 เมตร ระบบ 115 เควี

อ้างอิง

เรียน ผจก. ผ่าน ทน.ปบ.กทอ บ้านโป่ง

ตามที่ กทพ.2 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 42 – สถานีไฟฟ้าห้วยทรายชุม3) – สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง3 ตามอนุมัติ รทผ.(วศ) ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 WBS :P-TDD02.1+BAPTO.0001 งบ คทพ.2 เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปักเสาสายขนาด 22 เมตร ระบบ 115 เควี ตามสถานที่และวันเวลา ดังต่อไปนี้

ระบบ	สถานที่ดับไฟ	วัน เดือน ปี	จากเวลา	ถึงเวลา
115 เควี	บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง3	26 ตุลาคม 2565	08:00 น.	17:00 น.
115 เควี และ 22 เควี	บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง3	27 ตุลาคม 2565	08:00 น.	17:00 น.

โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ ขอให้ทาง กทอ.บ้านโป่ง เป็นผู้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าและก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขอให้ทาง กทอ.บ้านโป่ง ร่วมตรวจสอบระบบจำหน่าย เช่น ตรวจสอบโลโก้ ตรวจสอบเฟส กับ กทพ.2 ด้วย เพื่อให้เกิดความถูกต้องปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับ กทพ. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลาต่อไป ทั้งนี้โปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(.....)

ตำแหน่ง.....

(นายปัทมา พุกอชา)

พทง.กทพ.2

เบอร์โทร 084-7038253

