



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
17 พ.ย. ๖๖

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๕๖๐๓ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMW๐๒	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตั้งแต่ปากทางกระช้ำขาว ถึง ทต.ท่าจีน	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	SMW๒S-๑๓ ปากทางกระช้ำขาว	นายไชรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร.๐๙๐-๙๑๗๗๑๙๑
๒	SMW๐๒	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMW๒S-๑๓ ปากทางกระช้ำขาว	SMB๑๓S-๐๕ หน้า ทต.ท่าจีนและ ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากทางกระช้ำขาว ถึง ทต.ท่าจีน (ฝั่งซ้าย)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMW2 จาก จุดปลดสาย ถึง SMW 2S-13
ในวันที่ 19 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1665/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMW2 จาก SMW 2S-13 ถึง SMW 13S-05, ปลายสาย
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อลงกรณ์ เทียงอุ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ เทียงทอง


(นายอลงกรณ์ เทียงอุ)
๑๐ ก.ย ๖๖ นท. นพ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๑.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

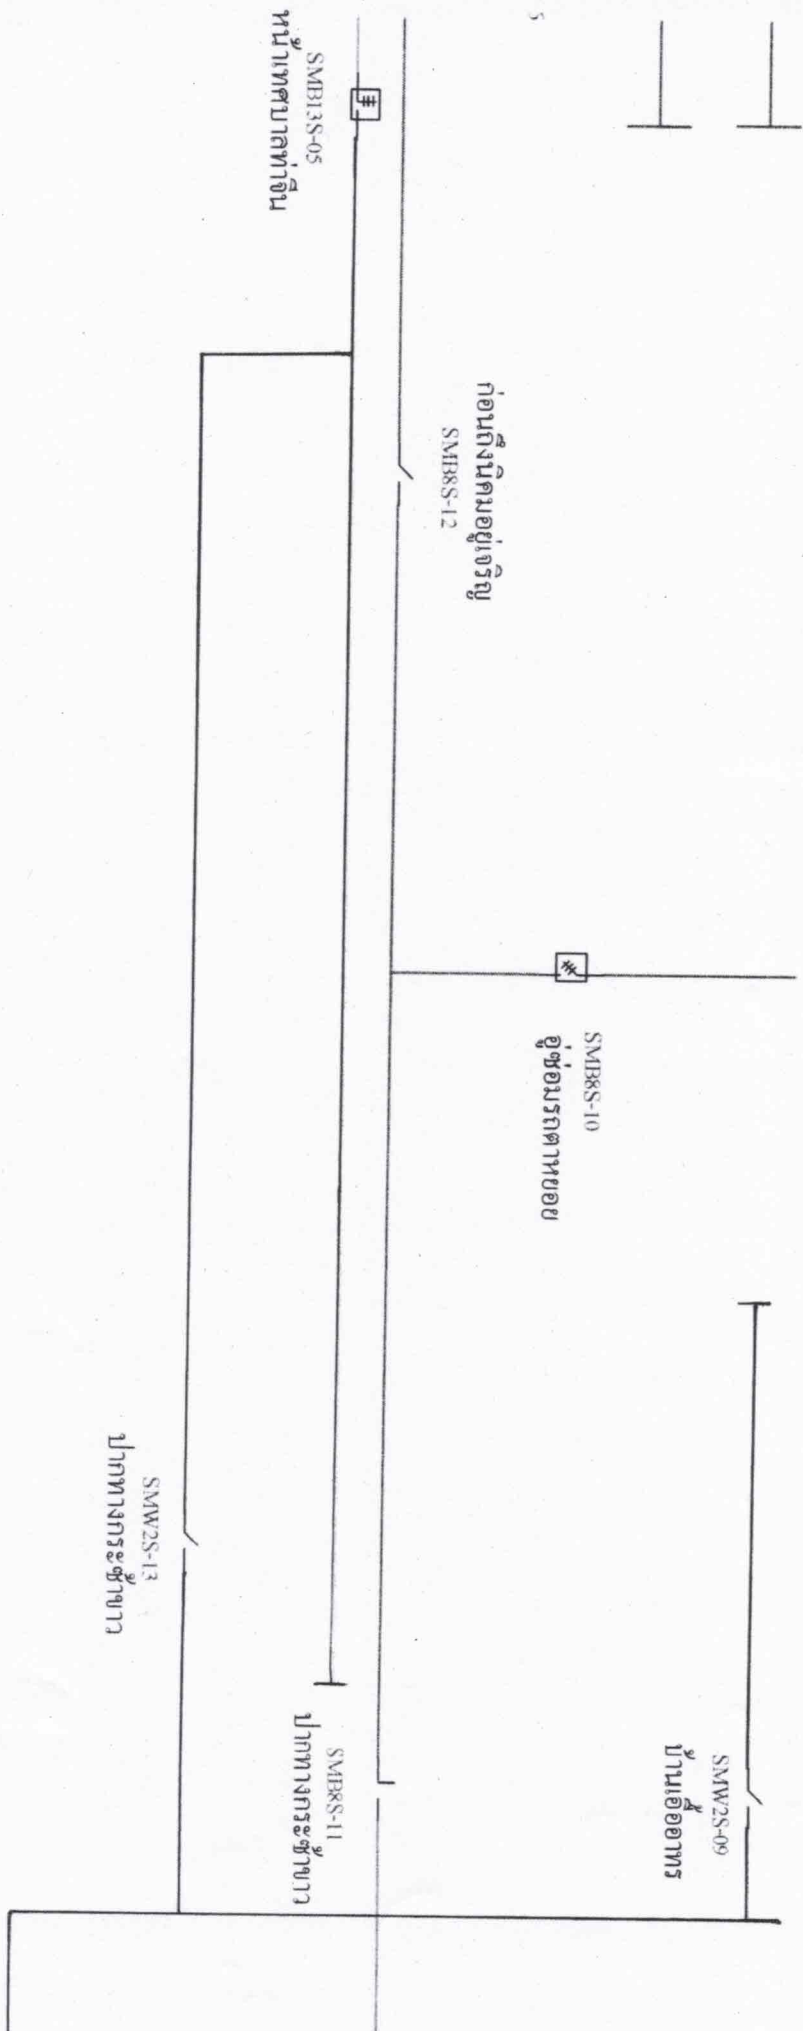

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บริเวณปากทางกระซำขาว - ทต.ท่าจีน (SMW02)
- กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ย. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1665/2566
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำการสวิตชิง						
2	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	SMW02S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางกระซำขาว
5	ตรวจสอบ SF6 SMB13S-05 (หน้าเทศบาลท่าจีน) สถานะ OFF พร้อมให้ ล็อคคาน						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลดจุดปลดสาย บริเวณปากทางกระซำขาว (วงจร SMW02) ออกทั้ง 3 เฟส ปลดแบบมีไฟ						
7	หลังจาก Hotline ทำการปลดจุดปลดสาย บริเวณปากทางกระซำขาว (วงจร SMW02) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
11	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
13	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมจุดปลดสาย บริเวณปากทางกระซำขาว (วงจร SMW02) เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมจุดปลดสาย บริเวณปากทางกระซำขาว (วงจร SMW02) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
22	SMW02S-13	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางกระซำขาว
23	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สีถาวรทางรถไฟห้องปฏิบัติการ



โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า

8S-16

ก่อนถึงนิคมอยู่เจริญ
SMBS-12

SMBS-05
หน้าเทศบาลตาจีน

SMBS-10
ตู้ซ่อมรถตาไทย

SMW-2S-09
บ้านเอดอพร

SMBS-11
ปากทางกระช้ำขาว

SMW-2S-13
ปากทางกระช้ำขาว

พื้นที่ปลูกยาง
↓

พื้นที่ปลูกยาง
↑

