



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ พทท. ๗๐๓ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	BOP05 115 เควี	๑๖-๑๘ พ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม. แยกไฟสี่-แยกตกลงเหนือ	BOP05YS-10	BOP05YS-11	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ.บ. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๓๓๑, long: ๙๙.๗๕๕๑๒๙
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๖๕๐๕, long: ๙๙.๗๕๕๔๑๑

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก BOP5YS-10 ถึง BOP5YS-11
ในวันที่ 16-18 พ.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1703/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิษดา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นายพิษดา กลิ่นประทุม)
วต.๖ กทท. พ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พนท., กฟส.จพ.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

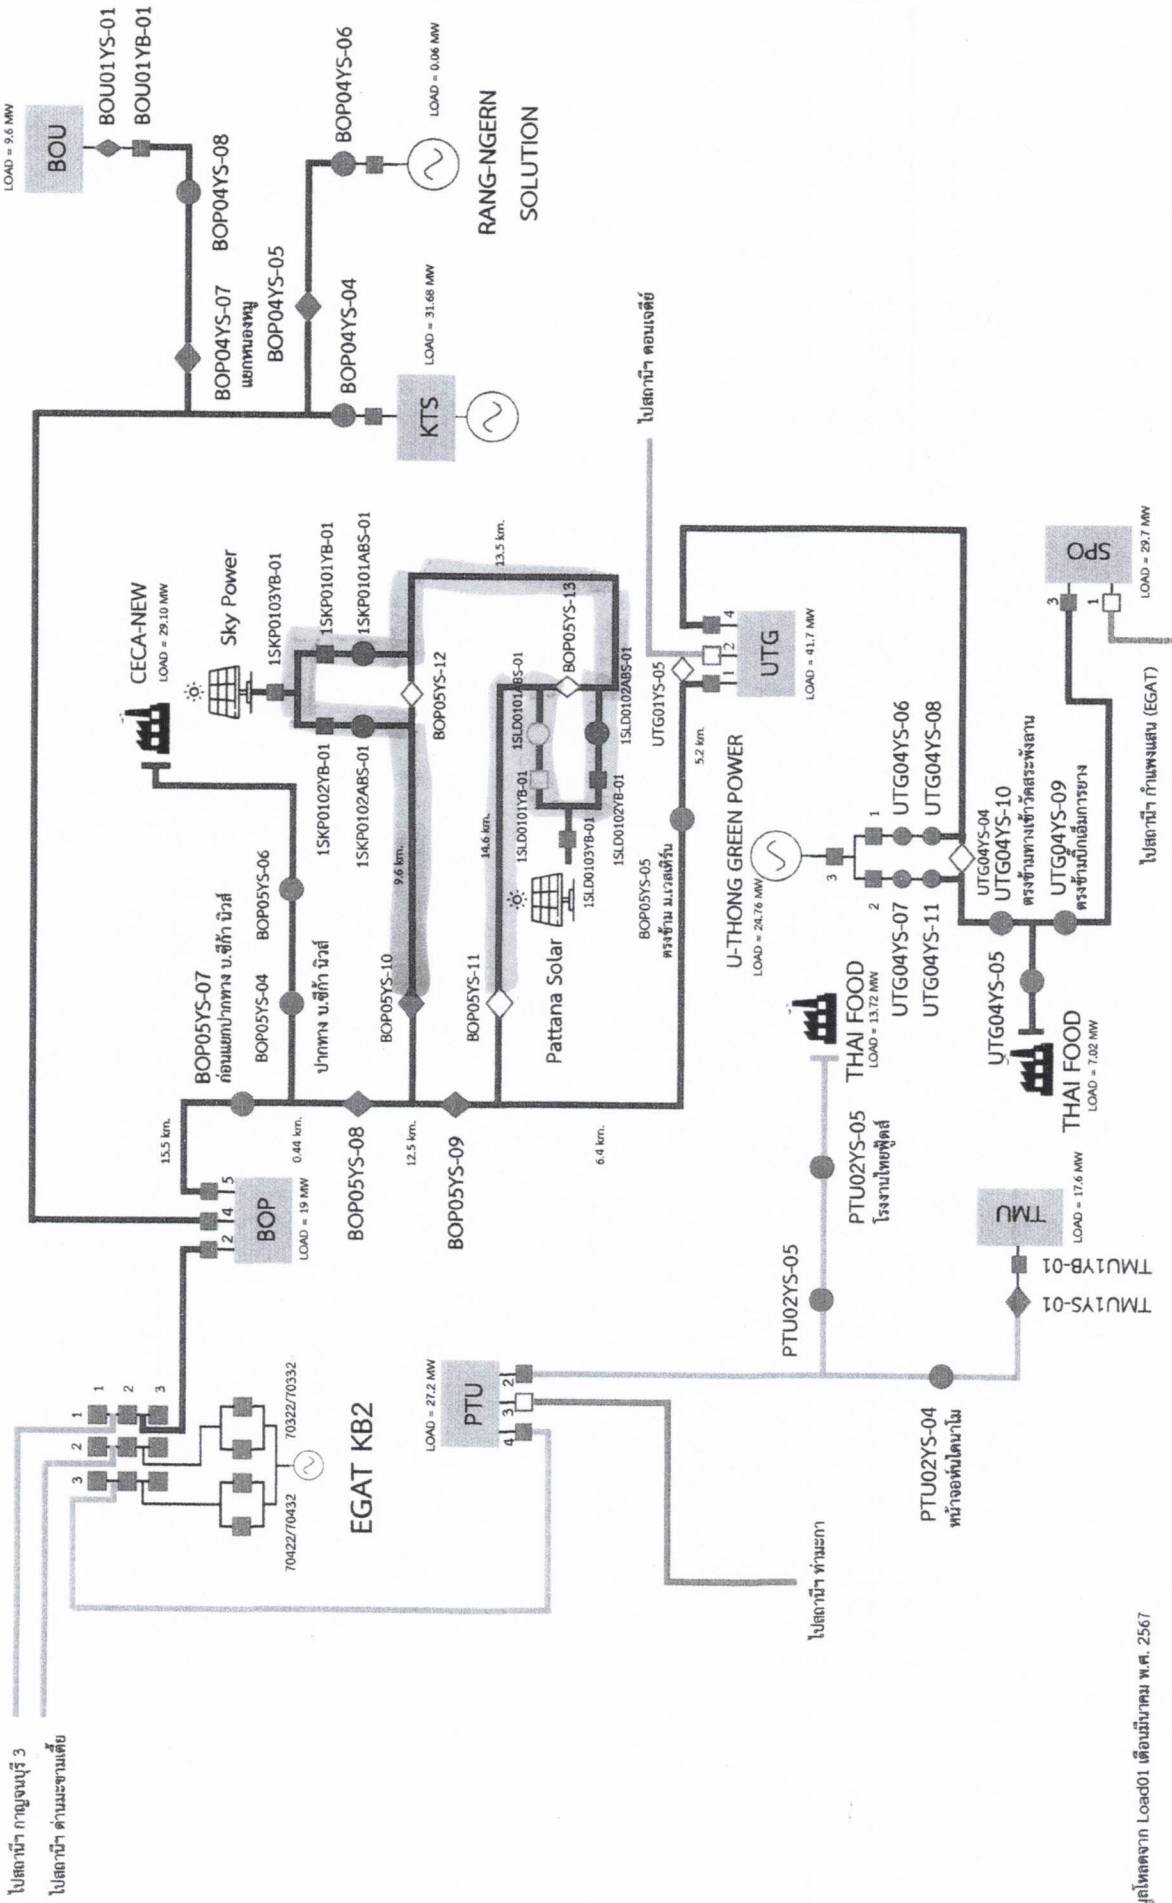
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟสี่ (115kV)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 - 18 พ.ย.2567	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูงใต้ไลน์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1703/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายพิภภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ LBS 115kV Bypass หน้า บ.สกายพาวเวอร์ จำกัด BOP05YS-12 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
3	ตรวจสอบ LBS 115kV Bypass หน้า บ.พัฒนาโซล่า จำกัด BOP05YS-13 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
4	ตรวจสอบ LBS 115kV แยกไฟสี่ (ฝั่งสถานีฯอู่ทอง) BOP05YS-11 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
5	แจ้ง บ.พัฒนาโซล่า จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP (ไม่สามารถรับไฟจาก กฟภ. เดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)						
6	แจ้ง บ.สกายพาวเวอร์ จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP (ไม่สามารถรับไฟจาก กฟภ. เดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)						
7	เมื่อ บ.พัฒนาโซล่า จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP เรียบร้อย พร้อมให้ดับไฟ						
8	เมื่อ บ.สกายพาวเวอร์ จำกัด ทำการหยุดขนานขายไฟ หยุดเดินโหลดภายใน และ OFF INTERTRIP เรียบร้อย พร้อมให้ดับไฟ						
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30น.						
10	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115kV
11	1SLD0103YB-01	สับ	ปลด		1SLD01		CB เบรกเกอร์ 115kV
12	1SLD0102YB-01	สับ	ปลด		1SLD01		CB เบรกเกอร์ 115kV
13	1SLD0102YS-01	สับ	ปลด		1SLD01	SW	ใบมิด 115kV
14	1SLD0102YS-02	สับ	ปลด		1SLD01	SW	ใบมิด 115kV
15	1SKP0103YB-01	สับ	ปลด		1SKP01		CB เบรกเกอร์ 115kV
16	1SKP0101YB-01	สับ	ปลด		1SKP01		CB เบรกเกอร์ 115kV
17	1SKP0102YB-01	สับ	ปลด		1SKP01		CB เบรกเกอร์ 115kV
18	1SKP0101YS-01	สับ	ปลด		1SKP01	SW	ใบมิด 115kV
19	1SKP0101YS-02	สับ	ปลด		1SKP01	SW	ใบมิด 115kV
20	1SKP0102YS-01	สับ	ปลด		1SKP01	SW	ใบมิด 115kV
21	1SKP0102YS-02	สับ	ปลด		1SKP01	SW	ใบมิด 115kV
22	ตรวจสอบสถานะ Lowgas BOP05YS-10 LBS. แยกไฟสี่ (ฝั่งสถานีฯบ่อพลอย) ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
23	BOP05YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ทกจ.		LBS. แยกไฟสี่ (ฝั่งสถานีฯบ่อพลอย)
24	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115kV
25	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน						
26	เมื่อกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน ไม่พบไฟย้อน						
27	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มีการ Short Ground เนื่องจากดับสายส่งเพื่อป้องกันการเกิด Induce)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
29	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อกฟส.พทน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
31	แจ้ง บ.พัฒนาโซล่า จำกัด เตรียมพร้อมรับการจ่ายไฟ						
32	เมื่อ บ.พัฒนาโซล่า จำกัด พร้อมรับการจ่ายไฟ ยืนยันให้จ่ายไฟได้						
33	แจ้ง บ.สกายเพาเวอร์ จำกัด เตรียมพร้อมรับการจ่ายไฟ						
34	เมื่อ บ.สกายเพาเวอร์ จำกัด พร้อมรับการจ่ายไฟ ยืนยันให้จ่ายไฟได้						
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115kV
37	ตรวจสอบสถานะ Lowgas BOP05YS-10 LBS. แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯบ่อพลอย) ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
38	BOP05YS-10	ปลด	ล๊ับ		ทกจ.		LBS. แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯบ่อพลอย)
39	ตรวจสอบสถานะ BOP05YS-10 LBS. แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯบ่อพลอย) ให้สถานะ CLOSE และโชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส						
40	1SKP0102YS-01	ปลด	ล๊ับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
41	1SKP0102YS-02	ปลด	ล๊ับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
42	1SKP0102YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		1SKP01		เบรกเกอร์ 115kV
43	1SKP0101YS-01	ปลด	ล๊ับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
44	1SKP0101YS-02	ปลด	ล๊ับ		1SKP01		ใบมีด 115kV
45	1SKP0101YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		1SKP01		เบรกเกอร์ 115kV
46	1SKP0103YB-01	ปลด	ล๊ับ		1SKP01		เบรกเกอร์ 115kV
47	1SLD0102YS-01	ปลด	ล๊ับ		1SLD01		ใบมีด 115kV
48	1SLD0102YS-02	ปลด	ล๊ับ		1SLD01		ใบมีด 115kV
49	1SLD0102YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		1SLD01		เบรกเกอร์ 115kV
50	1SLD0103YB-01	ปลด	ล๊ับ		1SLD01		เบรกเกอร์ 115kV
51	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115kV
52	แจ้ง บ.พัฒนาโซล่า จำกัด ทำการเดินโหลด ขนานขายไฟ และ ON INTERTRIP ได้						
53	แจ้ง บ.สกายเพาเวอร์ จำกัด ทำการเดินโหลด ขนานขายไฟ และ ON INTERTRIP ได้						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



RANG-NGERN SOLUTION

ไปสถานี กางงนบุรี 3
ไปสถานี ตำบลชามเตี้ย

*อ้างอิงข้อมูลโหลดจาก Load01 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
