



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

18/12/67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๒๓๒๒ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก๓)  
ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วย กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒ เพื่อให้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตอกเสาเข็ม บริเวณสะพานเสาวภา ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB06	<b>ช่วงที่ 1</b> 23 ธ.ค. 67 ถึง 26 ธ.ค. 67	09.00	00.00	ตอกเสาเข็มริม แม่น้ำท่าจีน / สะพานเสาวภา	- DIS ชค. แบบบู	- SFB ชค. หลังศูนย์ฝึก	นายกิตติภูมิ พิภพอมเกร็ด ชผ.ปป.กฟส.นช 083-8994661
		<b>ช่วงที่ 2</b> 13 ม.ค. 68 ถึง 18 ม.ค. 68	09.00	00.00				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่งวศก.๔ ผ.ปป.กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ  
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๕๘๘๕๘ Long ๑๐๐.๑๘๕๑๖๖๓  
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๐๖๑๐๓ Long ๑๐๐.๑๘๗๒๔๑

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)  
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.นครชัยศรี  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ NCB6 จาก DIS ๕๐.11 นนทบุรี ถึง SF6 ๕๐.๕๓ ทุ่งนอกรัต. ในวันที่ 23-26.๑.๖8 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1821/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ รามฤทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอภิชาติภูมิ มีกษณกรัต.

  
(นายพันธ์ รามฤทธิ์)  
วศก.5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.-นศ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 6 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน จะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานเสาวภา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	26 ธ.ค. 67	00.00น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	18 ม.ค. 68	00.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	ให้กรมผังเมืองก่อสร้าง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1821/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	17 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 23 ธ.ค. 67) และ (วันที่ 13 ม.ค. 68)</b>						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
5	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
6	<b>ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC07</b>						
7	NCB06S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้ากฟส.นช
8	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หลังศูนย์ฝึก
9	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS แบบมูอินน์
11	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
12	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
13	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
14	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
15	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	-
16	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
	<b>สิ้นสุด Switching (วันที่ 23 ธ.ค. 67) และ (วันที่ 13 ม.ค. 68)</b>						
17	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ (วันที่ 26 ธ.ค. 67) และ (วันที่ 18 ม.ค. 68)</b>						
18	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
19	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
20	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
21	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
22	<b>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>						
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.		DIS แบบมูอินน์
24	<b>ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก SAC07</b>						
25	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		นช.		SF6 หลังศูนย์ฝึก
26	NCB06S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้ากฟส.นช
27	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
29	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	-



## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ตอกเสาเข็มริมแม่น้ำท่าจีน.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... สะพานเสาวภา.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๓-๒๖ ธ.ค. ๖๗ และ ๑๓-๑๘ ม.ค. ๖๘..... เริ่มเวลา..... ๐๙.๐๐ น. .... จ่ายไฟคืนเวลา..... ๐๐.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)  
ชื่อ..... นายศาศวัต ควรประกอบกิจ ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙-๙๕๔๔-๓๕๓๙ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายกิตติภูมิ พักหอมเกร็ด.....

ตำแหน่ง..... ชม.ป.บ.กฟส.นครชัยศรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘-๓๘๙๙-๔๖๖๑..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... -.....

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วค.๔ ผ.บ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับขบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

---

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

---

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... ชจก.(ท) , ผ.บ., ผ.กส. และ จป.....

---

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

C๓ Safety CAP ๐๑


**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า


11 ธ.ค. 2567

(นายชลิต สีขาวขำ)


# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

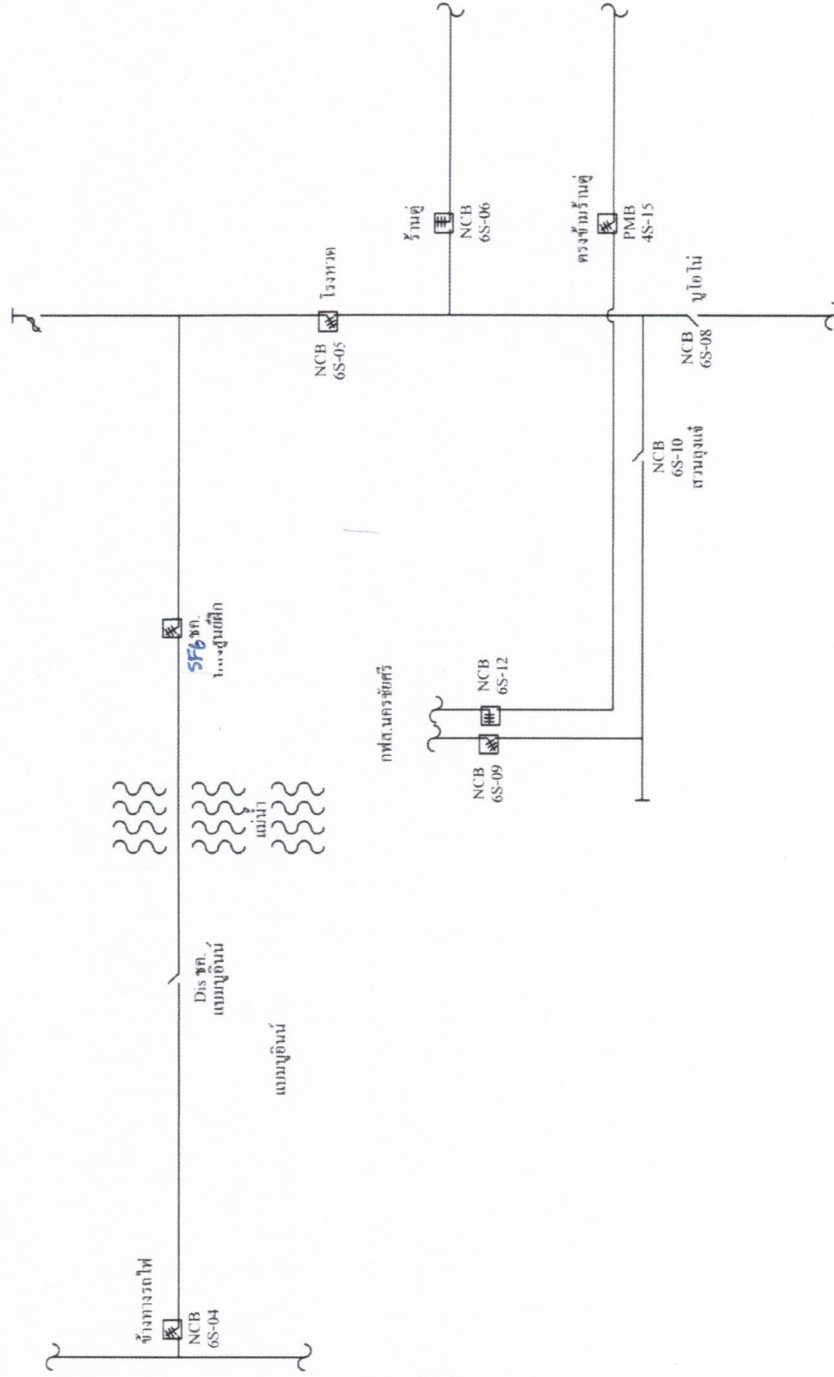

# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

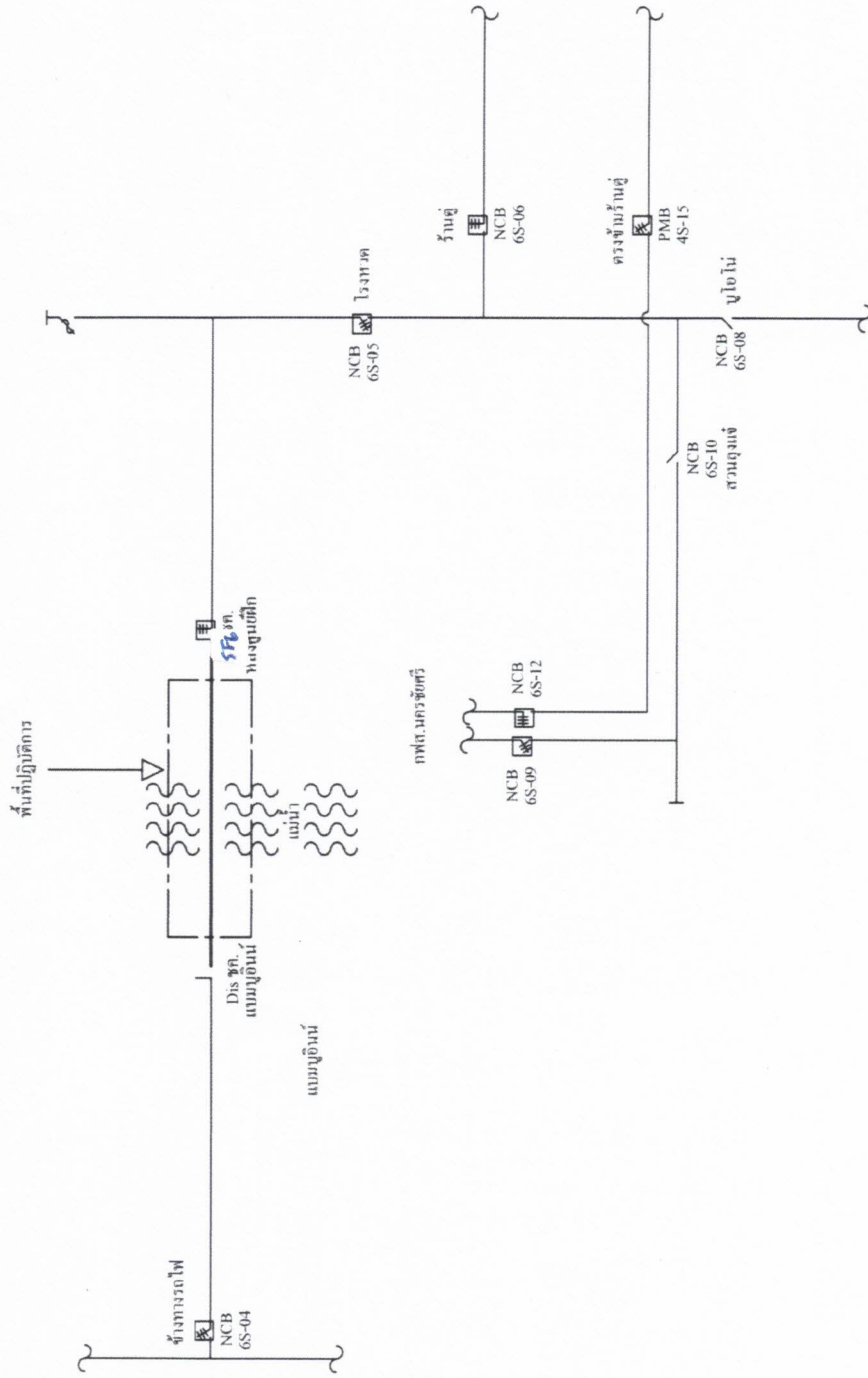

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

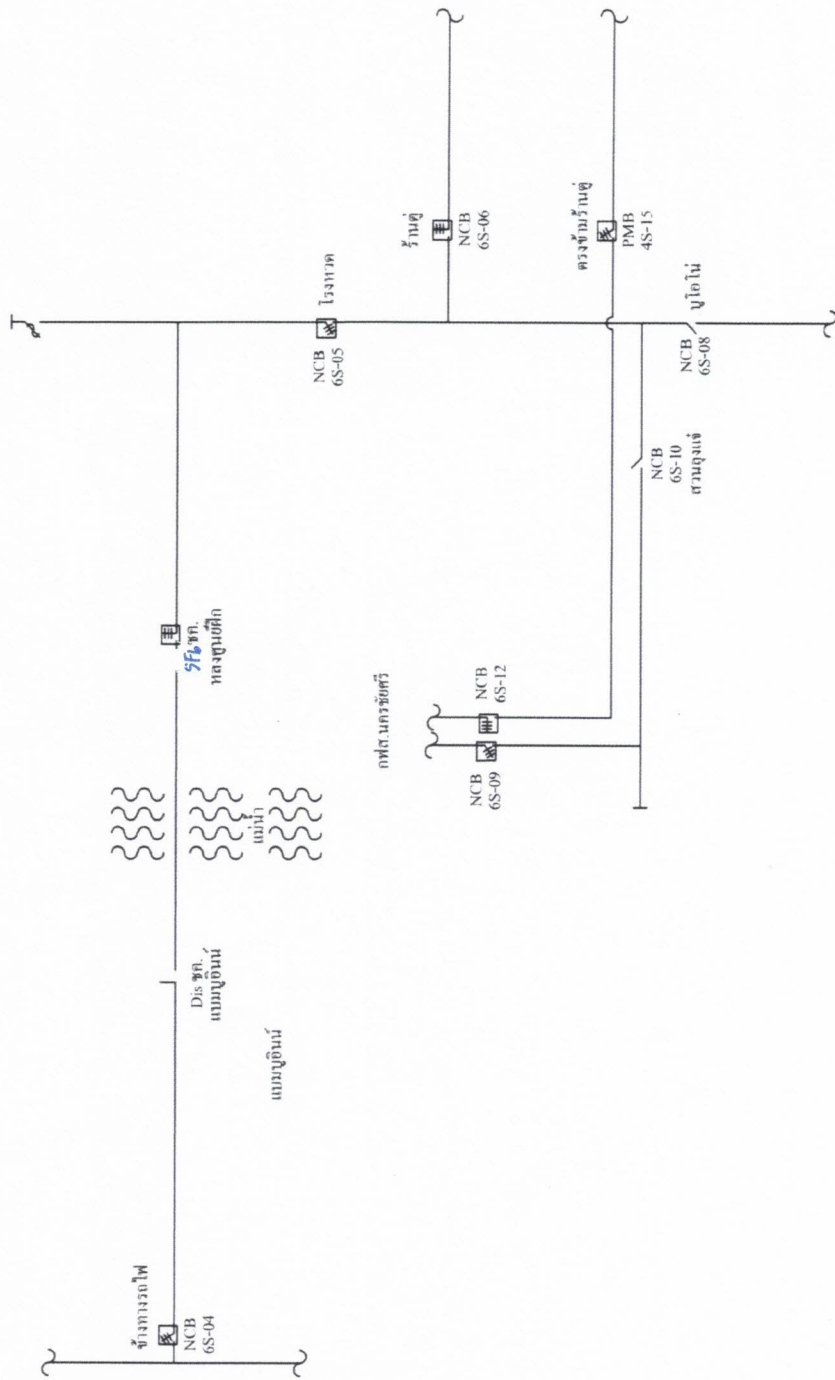





ทะเบียนเลขที่ 0107537000939

กฟส.นครชัยศรี  
เลขที่ 8771  
วันที่ 9/12/67 เวลา 10.10 น.

## บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ที่ J.2585-NKCS.05

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)  
2034/132-161 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0 5533 8864

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทำการตอกเสาเข็ม

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี

อ้างถึง สัญญาก่อสร้างเลขที่ 126/2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแปลนแสดงแนวก่อสร้างค้ำป้องกันน้ำท่วมฯ จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง
  3. รูปถ่ายหน้างาน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนครชัยศรี ระยะที่ 1 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มูลค่าโครงการ 267,180,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ 900 วัน กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้ส่งเริ่มงานทำงานเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั้น

ปัจจุบันบริษัทฯเริ่มดำเนินการก่อสร้างค้ำป้องกันน้ำท่วมฯแล้ว โดยเริ่มทำการตอกเสาเข็มในช่วงแรกจากสะพานเสาวภา มายัง ตลาดท่านา พบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านแม่น้ำท่าจีนตรงสะพานเสาวภา ซึ่งโอบีบั้นจั่นที่ตอกเสาเข็มไม่สามารถเข้าไปทำงานใกล้ตำแหน่งที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านได้ บริษัทฯจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี ช่วยทำการดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวให้กับทางบริษัทฯ เพื่อเข้าไปดำเนินการตอกเสาเข็มในบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จและสามารถก่อสร้างค้ำป้องกันน้ำท่วมฯ ได้ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการวางแผนการตอกเสาเข็มบริเวณนี้เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ถึง 26 ธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา 3 วัน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2568 ถึง 18 ธันวาคม 2568 เป็นระยะเวลา 6 วัน

รวมเป็นระยะเวลาที่ขอดับกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 9 วัน

- ชลภ (ท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าให้กับทางบริษัทฯ ด้วย

- บฉ ปง

ดำเนินการ

(นายพรรัตน์ เคารพไทย)

ผจก.กฟส.นครชัยศรี

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

ชว.พล  
อิตาเลียน

(นายชลิต สีขาวขำ)

- 9 ธ.ค. 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐภูมิ แสงอ่อน)

ผู้จัดการโครงการ

089-4339116



2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หัวข้อ 210 กทม.10310

คู่ ป.อ. 1011 ถนนบุรีรัตน์ โทร. 0-2716-1600 0-2716-1488



