



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ ก.ท.สค.(ปน) ๓๐๒๘ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ท้ายตลาดมหาชัย ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๐๑	๐๗ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี ท้าย ตลาดมหาชัย	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี สามแยกโรงหนัง เก่า	SMD๐๑S-๐๗ ทางรถไฟแลนด์ มาร์ค	นายสุรพันธ์ คำ อุดม โทร. ๐๘๗๕๐๐๖๑๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ท้ายตลาดมหาชัย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๕๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

7/12/67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ SMDI DDE ราม (เหนือ) หนองป่าเต่า ฟีดเดอร์ จาก SMDB/S-02 ถึง
ตั้งแต่วันที่ 08/08/67 น. ถึง 12/08/67 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1831/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิวัฒน์ บุญพิมพ์

วิวัฒน์ บุญพิมพ์
(นายวิวัฒน์ บุญพิมพ์)
๒๐ ก.ย ๖๖ ๖๖.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพส.๑๑.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจพ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท้ายตลาดมหาชัย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟล.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1831/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 4 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 4 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 4 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	SMD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
4	ตรวจสอบ SMD01S-07 SF6 ทางรถไฟหน้าแลนด์มาร์ค ให้อยู่สถานะ OPEN และล็อกคาน						
5	แจ้งกฟล.สค.ให้ปลดโหลดออกก่อนทำการปลด DDE						
6	แจ้งกฟล.สค.ทำการปลด DDE (SMD01) บริเวณสามแยกโรงหนังเก่า ออกจากกันทั้งสามเฟส						
7	หลังจากกฟล.สค.ทำการปลด DDE (SMD01) บริเวณสามแยกโรงหนังเก่า ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟล.สค. รับทราบ						
9	แจ้งให้ชุด กฟล.สค. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งให้ชุด กฟล.สค. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
12	SMD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งให้ชุด กฟล.สค. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งให้ชุด กฟล.สค. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
17	SMD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้งกฟล.สค.ทำการเชื่อม DDE (SMD01) บริเวณสามแยกโรงหนังเก่า เข้าทั้งสามเฟส						
20	หลังจากกฟล.สค.ทำการเชื่อม DDE (SMD01) บริเวณสามแยกโรงหนังเก่า เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
21	แจ้งกฟล.สค.ให้จ่ายโหลดกลับสภาพปกติ						
22	SMD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

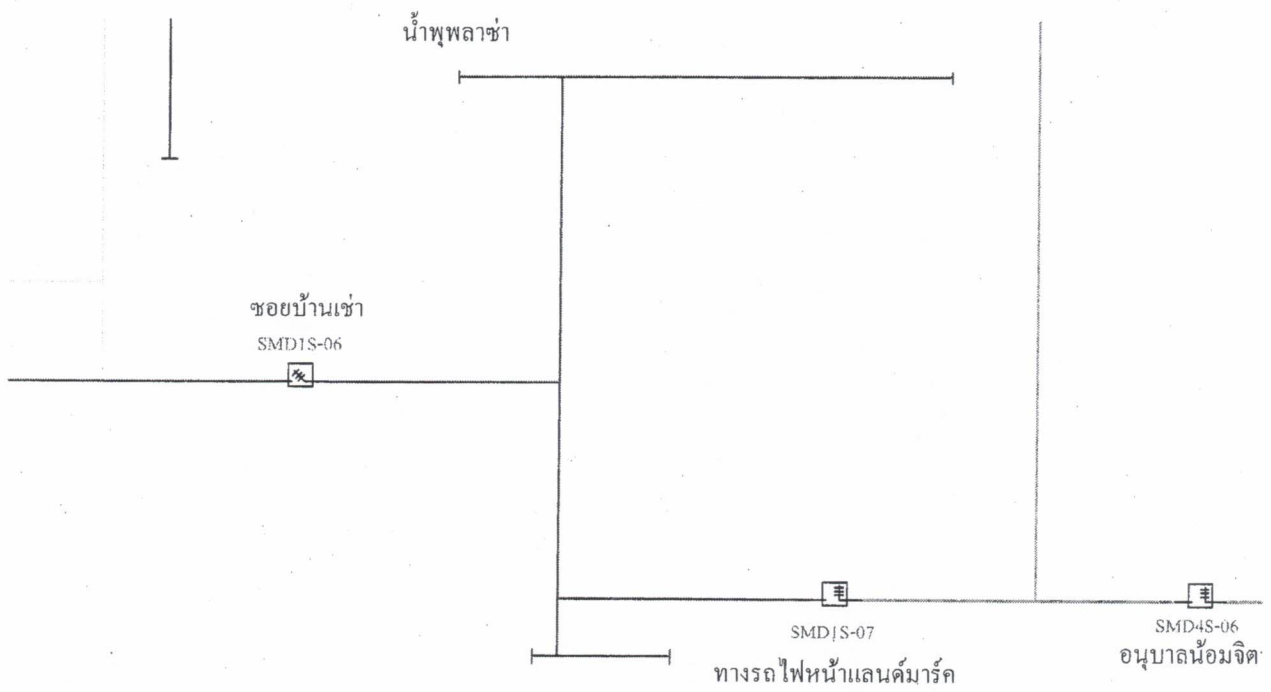

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

