

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท.(กป) ๓๕๖ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU03	๖ มี.ค.๖๘	๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๓๐ น.	๐๙.๓๐ น. และ ๑๗.๓๐ น.	ปลด PG. ๓ สลัก โลว์แยกเข้า บริษัท CP บ้านบ่อระแหง	PTU03R-01 บ้านปลักเขว้า	PTU03S-04 ท้ายบ้านโป่งกูป	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๐๘๒๓๑๘, long: ๙๙.๗๔๒๖๓๗
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๑๒๖๙๐๖, long: ๙๙.๗๕๑๕๘๑

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ PTU03 จาก PTU3R-01 ถึง PTU3S-04
ในวันที่ ๖ มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 426/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุริยศักดิ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
๐๓๓.๖ ๓๓๓ พ.๐๓

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.พนท.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์แยกเข้า บริษัท CP บ้านบ่อระแหง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มี.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปลด PG	ตามใบขอปฏิบัติงาน	426/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	4 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	4 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]			วันที่	4 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิชชา, น.ส.สุภัชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
3	PTU03R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
4	PTU03R-01	สับ	ปลด		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
5	SW.LOAD PTU03R-01	สับ	ปลด		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ						
7	แจ้ง กฟส.พทน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟส.พทน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด PG ไลน์แยกเข้า CP บ้านบ่อระแหง ออกทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำการปลด PG ไลน์แยกเข้า CP บ้านบ่อระแหง ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	SW.LOAD PTU03R-01	ปลด	สับ		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
13	PTU03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
14	PTU03R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	PTU03R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
18	PTU03R-01	สับ	ปลด		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
19	SW.LOAD PTU03R-01	สับ	ปลด		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ						
21	แจ้ง กฟส.พทน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟส.พทน. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
23	เมื่อ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการเชื่อม PG ไลน์แยกเข้า CP บ้านบ่อระแหง เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำการเชื่อม PG ไลน์แยกเข้า CP บ้านบ่อระแหง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
26	SW.LOAD PTU03R-01	ปลด	สับ		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
27	PTU03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
28	PTU03R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

เป็นพื้นที่ของอาคาร

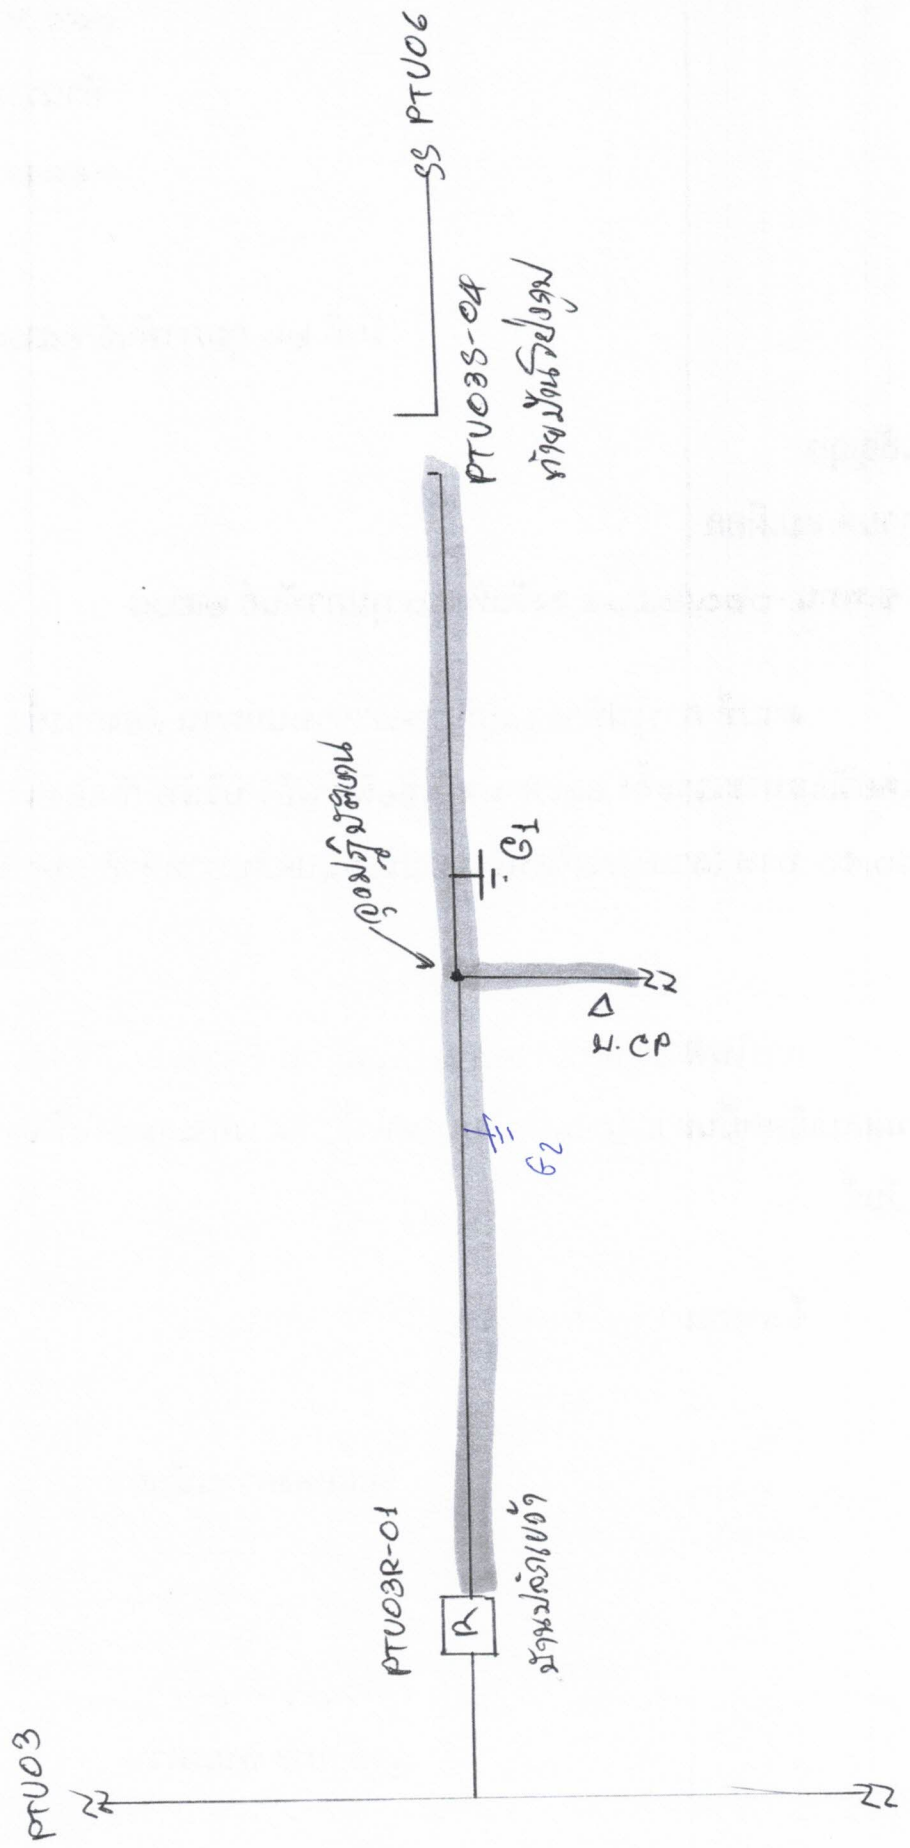

[Signature]
