



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
19 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓.สพท.(ปบ.) 01028
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟให้กรมทางฯ ตอกเสาเข็มถนนบรมฯ ขาออก
กทท.(SAC๐๘,SAC๑๐) บริเวณหน้าบิ๊ม ปตท.สาย๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๘	๒๐ มี.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟยกระดับสาย๒๒kV ให้กรม ทางฯตอกเสาเข็ม ถ.บรมฯขาออก หน้าบิ๊ม ปตท.สาย๗	SAC๘S-๐๑	-SAC๑S-๐๒ -Disชด.ปากทางเข้าสาย๗	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	SAC๑๐					SAC๑๐S-๐๑	-SAC๑S-๐๒ -Disชด.ปากทางเข้าสาย๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่หน้าบ้านท่าท้อคอนกรีต ถึง ปากทางเข้าสาย๗(ฝั่งบรมฯ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๘๐๓๙ Long : ๑๐๐.๒๓๕๙๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๗๙๙๖ Long : ๑๐๐.๒๓๕๑๓

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAC10 SAC10S-01 SAC15-02 , Dis ชด. ปากทางสาย 7
SAC8 จาก SAC8S-01 ถึง SAC15-02 , Dis ชด. ปากทางสาย 7

ในวันที่ 20 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 502/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นิตินัย ผูกฉิม โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับศูนย์ฯ ผูกฉิม

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.สามพราน
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ถนนบรมมา ซาออกหน้าปี่ม ปตท.สาย 7 (SAC08,10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ยกระดับสาย 22 kV เพื่อให้กรมทางดอกเสาเข้ม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	502/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	กฟส.สพร.		นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ	วันที่	18 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			กฟส.สพร.	วันที่	18 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายอนุศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวสุกษา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
7	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
10	ย้ายโหลด SAC08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NCA08						
11	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
12	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
13	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAB04						
14	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้า ม.สราญใจ2 สาย7
15	SAC10VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	ตรวจสอบ SF6 โรงปูนทำท่อ รหัส SAC06S-02 และ SF6 รั้นโก่ย่าง รหัส SAC01S-02 อยู่สถานะ Open แล้วให้ทำการ ล็อคคาน						
18	Dis ชั่วคราว SAC08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางสาย 7
19	Dis ชั่วคราว SAC10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางสาย 7
20	SAC08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot. Head F.8
21	SAC10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pot. Head F.10
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
23	แจ้งให้เทสไฟและช็อคกราวด์ 22 kV จุด G1,G2,G3,G4						
24	ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
25	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
26	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
28	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
32	เมื่อชุด กฟส.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
33	แจ้งให้ปลดขีดคร่าวจุด G1,G2,G3,G4						
34	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
35	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
37	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
39	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
40	Dis ชั่วคราว SAC08	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางสาย 7
41	Dis ชั่วคราว SAC10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางสาย 7
42	SAC08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Pot. Head F.8
43	SAC10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Pot. Head F.10
44	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วนกลับจาก SAB04						
45	SAC10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
46	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.		SF6 หน้า ม.สรานูใจ2 สาย7
47	ย้ายโหลด SAC08 บางส่วนไปกลับจาก NCA08						
48	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
49	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		-
50	ตรวจสอบ SF6 โรงปั่นทำท่อ รหัส SAC06S-02 และ SF6 รั้นโก๋ย่าง รหัส SAC01S-02 อยู่สถานะ Open แล้วให้ทำการ ปลดล๊อคคาน						
51	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
52	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
53	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
54	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
56	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
57	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 กรมทางหลวงตอกเสาเข็ม ถ.บรมฯขาออก

บริเวณหน้าปม ปตท.สาย 7

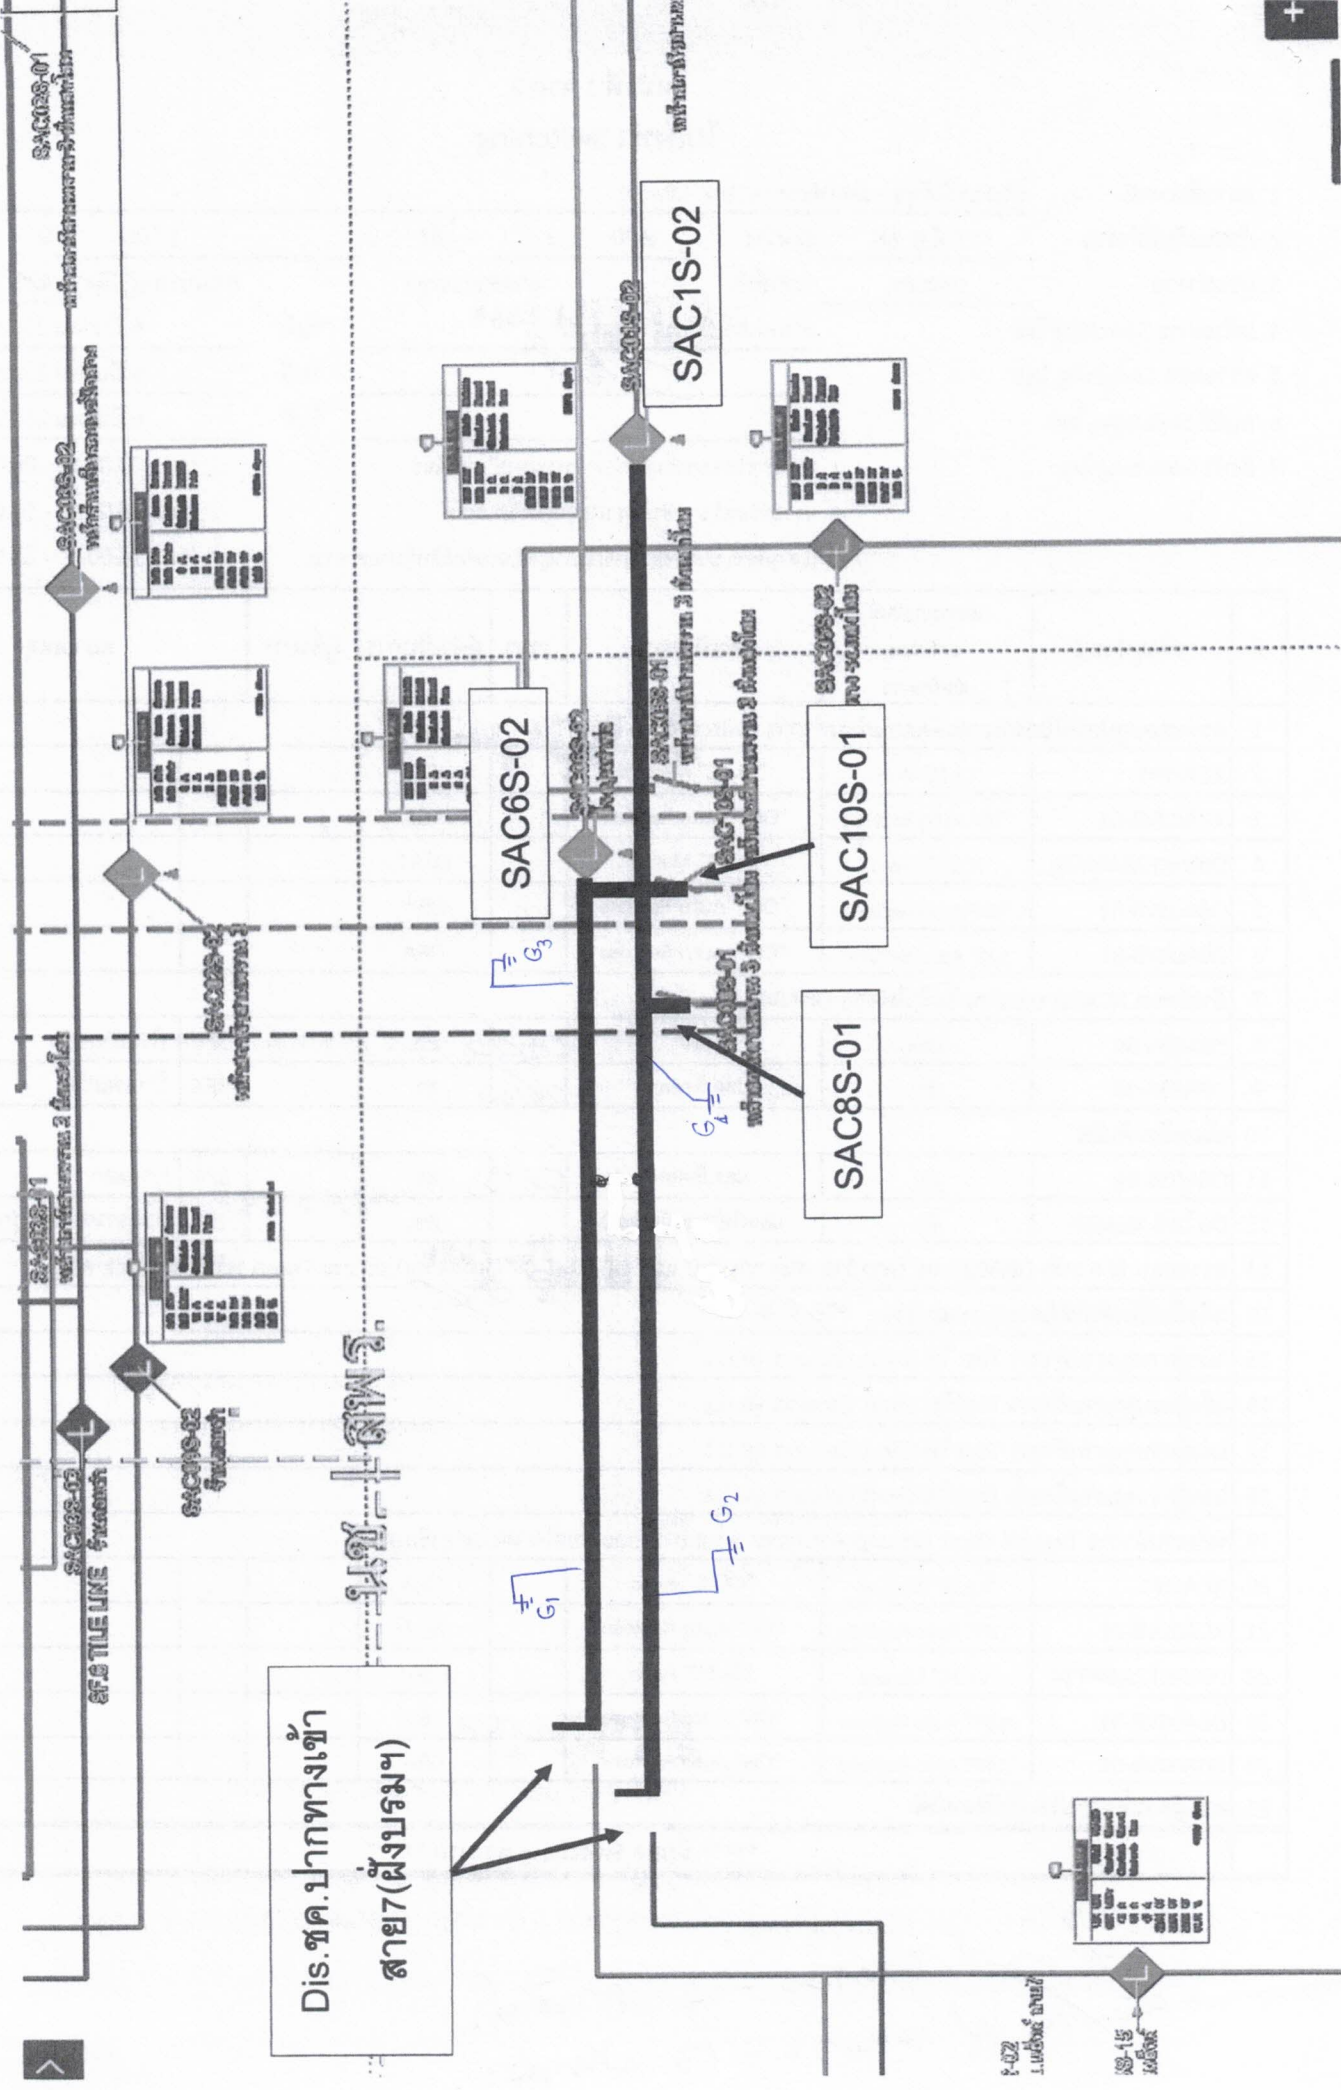

Dis.ชุด.ปากทางเข้า
สาย 7 (ฝั่งบรมฯ)

SAC6S-02

SAC1S-02

SAC10S-01

SAC8S-01

SAC10S-02

SAC10S-01

SAC10S-02

SAC10S-02

SAC10S-02

หม้อแปลงไฟฟ้า

1-022
หม้อแปลง สาย 7

1-015
หม้อแปลง



ด่วนที่สุด

ที่ สส.๗/๒๕๖๓/๒๗๗๙



กฟส.สามพราน
เลขรับที่ 1802
วันที่ 17 มี.ค. 2568
เวลา ๐๗.๒๕ น.

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี
(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง
๔๔/๗ หมู่ ๕ ถ.บรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตัดไฟฟ้าสำหรับงานตอกเสาเข็มงานป้าย Overhead Sign

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสามพราน

ตามสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๙๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๕๔ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒๕ วัน รวมระยะเวลาทำการ ๑,๘๐๘ วัน ค่าก่อสร้าง ๓๖๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๙๐๙,๔๒๕.๐๐ บาท นั้น

เนื่องด้วยผู้รับจ้าง โดย บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด มีแผนเข้าดำเนินการตอกเสาเข็มฐานรากป้าย Overhead กม.๒๘+๔๗๕ (LT. หรือบริเวณบ่อบำบัดน้ำมัน ปตท. สาย ๗) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยบริเวณดังกล่าวบ่อบำบัดน้ำมันจะใกล้กับแนวสายไฟฟ้า ๒๒ เควี เกินระยะความปลอดภัยของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสามพราน ประสานงานการตัดไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะดำเนินการตอกเสาเข็มในบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการฯได้มอบหมายให้ นายไชยยันต์ กุมกัน ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน(บริษัทฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๔๓๖๒๘๐๒ และ นายสุรศักดิ์ หัสตินรัตน์ ตำแหน่งช่างควบคุมงาน กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐๙๒-๗๖๙๘๖๑๕ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนศักดิ์ ออบเชย)

ชค.สส. สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)

จ.นครปฐม ๑ แห่ง

ส่งสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

(นายณัฐวัฒน์ ทิพย์ทัศนะ)

ผจก.กฟส.สพร.

17 มี.ค. 2568

๑๗

<input type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> รจก.(อ)
<input type="checkbox"/> ผ.บ.ร.	<input type="checkbox"/> ผ.บ.ร.
<input type="checkbox"/> ผ.บ.ส.	<input type="checkbox"/> ผ.บ.ส.
<input type="checkbox"/> ผ.บ.ค.	<input type="checkbox"/> ผ.บ.ค.
<input type="checkbox"/> ผ.บ.น.	<input type="checkbox"/> ผ.บ.น.
<input type="checkbox"/> จ.ป.ว.	<input type="checkbox"/> ผ.ช.น.
<input type="checkbox"/> น.ค.	<input type="checkbox"/> น.บ.ท.
<input type="checkbox"/> รายงานด้วย	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
