



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่.....กต.คกข.(ปบ) ๔๘๗/๒๕๖๘.....

ชื่อผู้รับ.....นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล.....

ชื่อผู้ส่ง.....นายสมเจตน์ ฮะวังจุ.....

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

23 เม.ย 68

วันที่.....๑๑ เมษายน ๒๕๖๘.....

ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข.

ด้วยการไฟฟ้า..กฟส.โคกขาม...จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..สถานีสารภี.....สืบสาร
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF7	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมพาดสาย ในช.เข้า โครงการพิเศษสุขนคร	SMF๗S-๑๐	SMF๗S-๑๓ ปลายสาย	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ข.วิเศษสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายสรวิศ สตรี.....สงวนพื้นที่.....ตำแหน่ง.....ทผ.ปบ.....โทร.....๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๘๒๓๘๘ ๑๐๐.๓๖๙๘๗๘ ถึง ๑๓.๕๘๓๕๓๒ ๑๐๐.๓๗๔๓๖๗

ลงชื่อ.....นายสมเจตน์ ฮะวังจุ.....

(นายสมเจตน์ ฮะวังจุ.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิตเตอร์ SMF7 จาก SMF7S-10 ถึง SMF7S-13, ปลายสาย
ในวันที่ 27 มี.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 643/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อารามวรวิชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสรอหสร์ สงวนพินิจ

อภิสิทธิ์
(นายอภิสิทธิ์ อารามวรวิชัย)
วอ.ก. 5 ถนน นน.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓ กช.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

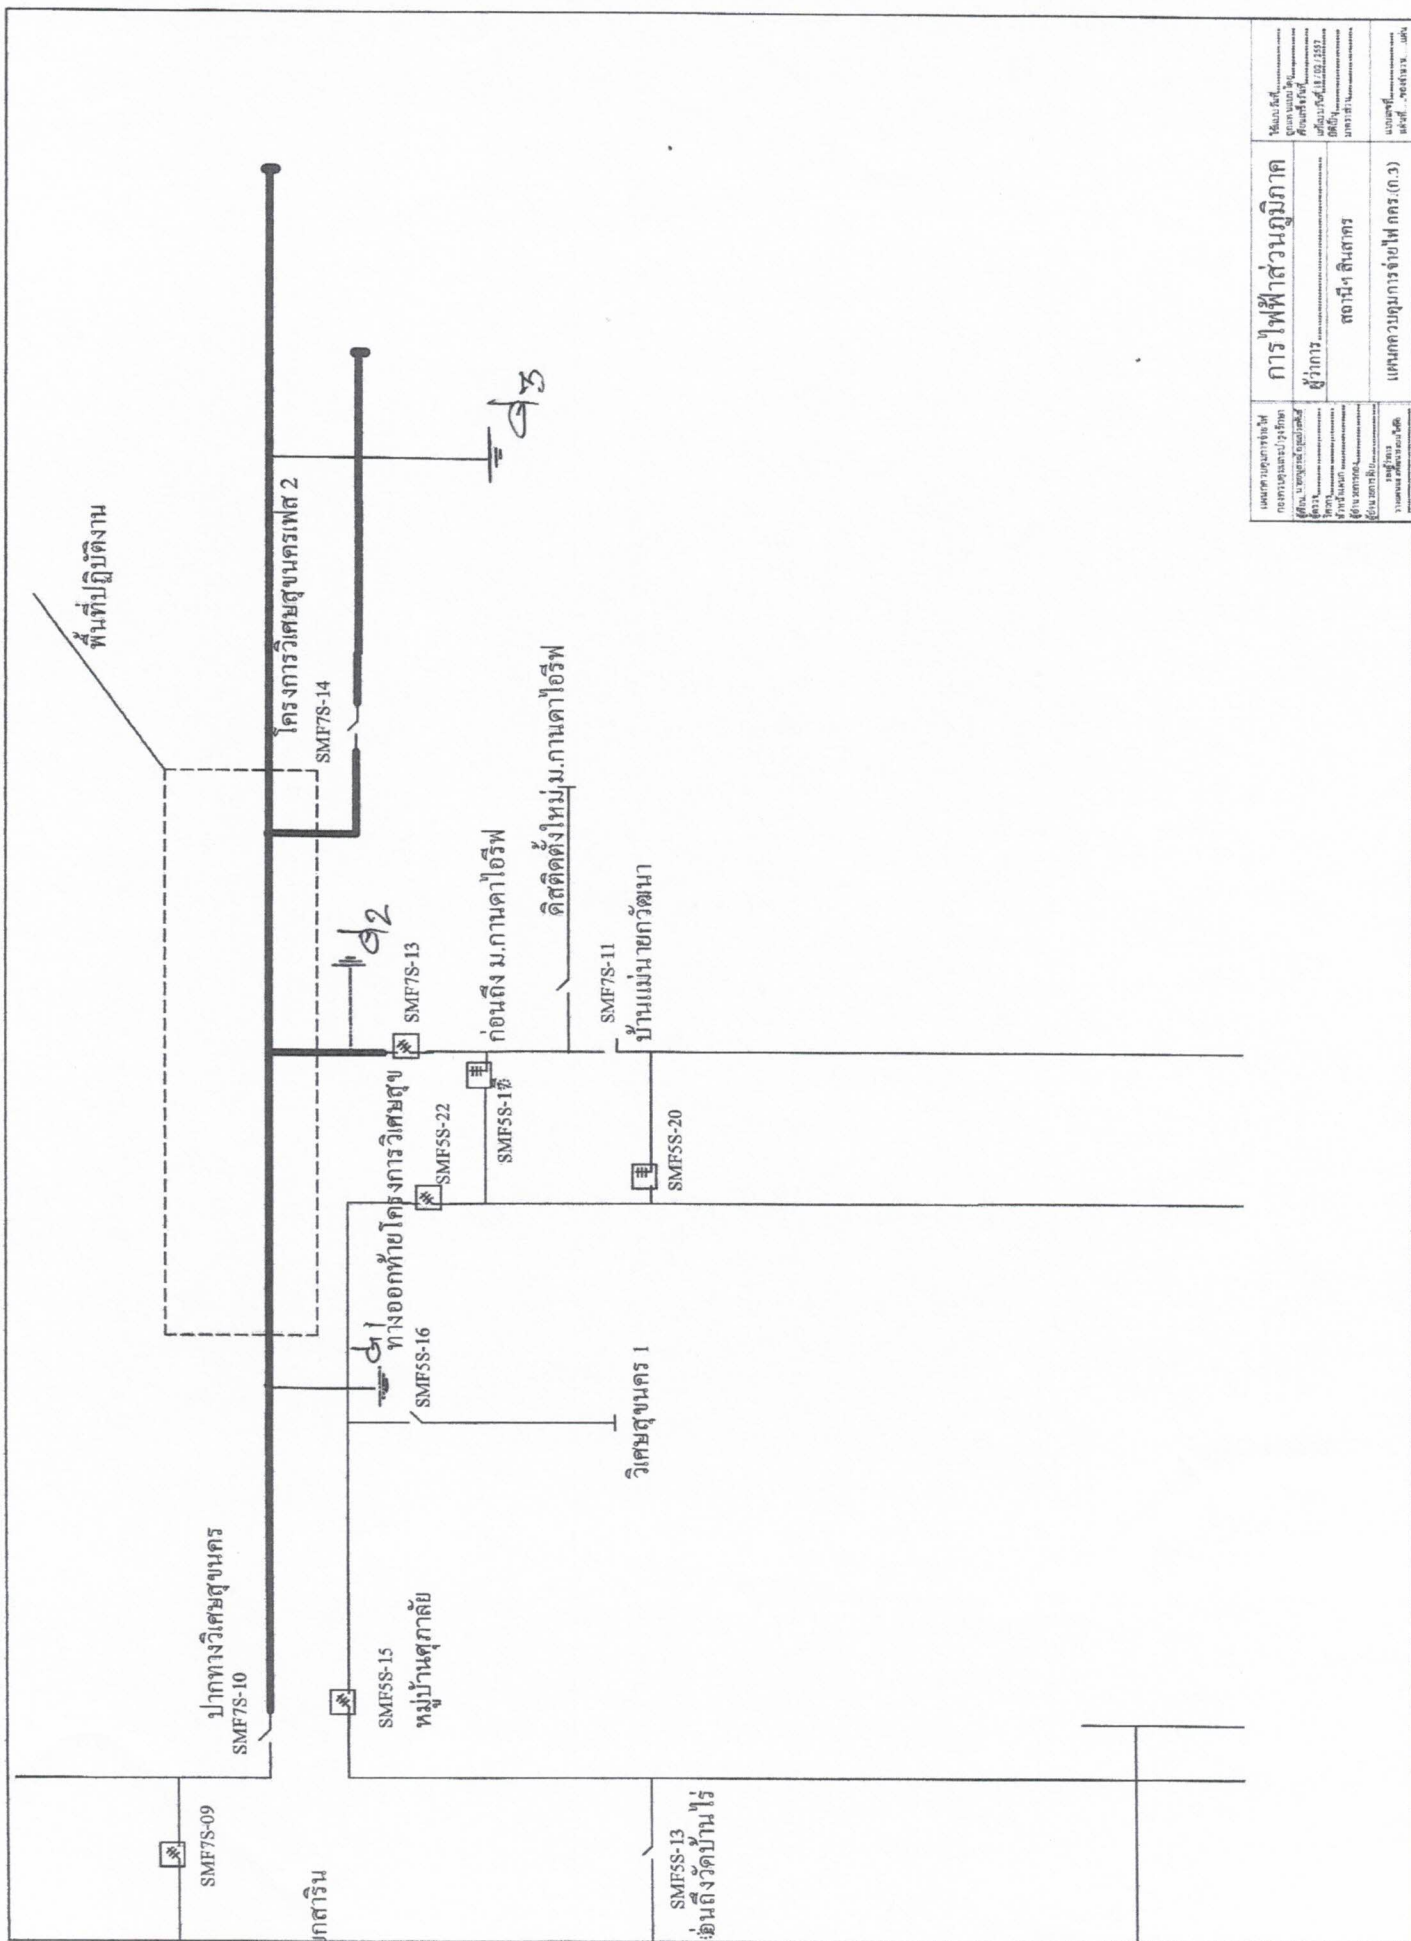
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

- | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณซอยเข้าโครงการวิเศษสุขนคร (SMF07) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 8.00 | น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.คกข. | งานที่ทำ | ปักเสาสายแรงสูง | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 643/2568 |
| 4. เตรียมการ Switching โดย | นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์ | | | วันที่ | 17 เมษายน 2568 | |
| 5. ตรวจสอบ Switching โดย |  | | | วันที่ | 17 เมษายน 2568 | |
| 6. อนุมัติ Switching โดย |  | | | วันที่ | 17 เมษายน 2568 | |
| 7. สั่งทำ Switching โดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช
2. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต
3. น.ส.สุกัญชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	-
3	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-	-
4	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	-
5	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-	-
6	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF05							
7	SMF05S-17	ปลด	สับ		คกข.		SF6	ก่อนถึง ม.กานดาไอสีฟ
8	SMF07S-13	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คกข.	SCADA	SF6	ทางออกท้ายโครงการวิเศษสุข
9	เมื่อพร้อมดับไฟ							
10	SMF07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	หมู่บ้านวิเศษสุข
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3							
15	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย							
16	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
17	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
18	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
19	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
25	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
26	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
27	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
28	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
29	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	SMF07S-10	ปลด	สับ		คกข.		DIS หมู่บ้านวิเศษสุข
32	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMF05						
33	SMF07S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ทางออกท้ายโครงการวิเศษสุข
34	SMF05S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนถึง ม.กานดาไอลิฟ
35	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
36	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
37	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
38	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

[illegible]
