



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 พ.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๐๙๒/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อติดตั้งแอร์เบรก สถานีไฟฟ้า ๑๑๕ เควี บริษัทโรงงานทอผ้าเพชรเกษม ตาม แผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๕	๒๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ติดตั้งแอร์เบรก สถานี ไฟฟ้า ๑๑๕ เควี บริษัทโรงงานทอผ้า เพชรเกษม	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ก่อนถึงโรงงาน ทอผ้าเพชรเกษม	BAL๐๗S-๐๕ หน้าโรงงานทอ ผ้าเพชรเกษม	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	๑๑๕ KV	๒๘ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๙.๐๐ น.		BAL๐๓YS-๐๔ หลังวัดป่าชัยรังษี	สถานีฯ กระทุ่มแบน ๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัทโรงงานทอผ้าเพชรเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ 5KA5 จาก บดเอ้งจนถึงโรงงานหนองนาถึง BA1735-05
ในวันที่ 28 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 824/68
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ 115 จาก KTE24B-01 ถึง BA1345-04
ในวันที่ 28 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 824/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ส. หิรัญ พงษ์ศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ บดเอ้งจนถึง โรงงานหนองนาถึง


(นางสาวหิรัญ พงษ์ศิริ)
วศก.5 หนองนาผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงงานเพชรเกษมทอผ้า (KTE02YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	19.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ติดตั้งแอร์เบรก 115 เครวี โรงงานเพชรเกษมทอผ้า				ตามใบขอปฏิบัติงาน 824/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ				วันที่	23 พฤษภาคม 2568	
5. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤษภาคม 2568	
6. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพริ้มทรร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต				วันที่	23 พฤษภาคม 2568	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : ดับไฟ 22kV วงจร SMA05 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. และดับไฟ 115kV เวลา 08.00 น. - 19.00 น. เพื่อติดตั้ง ABS ให้โรงงานเพชรเกษมทอผ้า							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KTE02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
3	BAL03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
4	SMD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
5	SMA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
6	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เครวี Loop สถานีฯ สมุทรสาคร 5 SME02,03,04YB อยู่สถานะ Close Loop ปกติ						
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการปลด DDE 22kV บริเวณก่อนถึงโรงงานเพชรเกษมทอผ้า ออกทั้งสามเฟส (ไม่มีโหลด)						
9	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการปลด DDE 22kV บริเวณก่อนถึงโรงงานเพชรเกษมทอผ้า ออกทั้งสามเฟสแล้ว						
10	เมื่อผู้ใช้ไฟ 115kV โรงงานเพชรเกษมทอผ้า พร้อมดับไฟ และปลดโหลดภายในออกแล้ว						
11	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
12	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เครวี
13	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เครวี
14	BAL03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	ท้ายซอยวัดป่าชัยรังสี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สมุทรสาคร รับทราบ						
16	แจ้งให้ทำการซื้อตรกราวด์ 22kV จุด G1 และกราวด์ 115kV จุด G2,G3 และลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
17	BAL03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
18	SMD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เครวี
19	SMA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
20	เมื่อ กฟส.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟระบบ 22kV คืนเวลา 14.00 น.						
21	SMA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งให้ทำการปลดข้อตกราวด์ 22kV จุด G1						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE 22kV บริเวณก่อนถึงโรงงานเพชรเกษมทอผ้า ทั้งสามเฟส						
25	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE 22kV บริเวณก่อนถึงโรงงานเพชรเกษมทอผ้า ทั้งสามเฟสแล้ว						
26	SMA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงจ่าย ***						
27	เมื่อ กฟส.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟระบบ 115kV คืน						
28	BAL03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		-
29	SMD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		-
30	แจ้งให้ทำการปลดข้อตกราวด์ 115kV จุด G2,G3						
31	เมื่อพร้อม AC Withstand ABS โรงงานเพชรเกษมทอผ้า รหัส BAL03YS-11 เป็นเวลา 10 นาที						
32	ตรวจสอบ ABS โรงงานเพชรเกษมทอผ้า รหัส BAL03YS-11 อยู่สถานะ Open						
33	BAL03YS-11	ปลด	สับ		สค.		ABS
34	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE		-
35	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE		-
36	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE		-
37	เมื่อ AC Withstand ABS โรงงานเพชรเกษมทอผ้า ครบเวลา						
38	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		-
39	KTE02YS-01	สับ	ปลด		KTE		-
40	KTE02YS-02	สับ	ปลด		KTE		-
41	BAL03YS-04	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ ล็อกกุญแจ		สค.		ABS
42	KTE02YS-01	ปลด	สับ		KTE		-
43	KTE02YS-02	ปลด	สับ		KTE		-
44	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE		-
45	KTE02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
46	BAL03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-
47	SMD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		-
	*** สิ้นสุด Switching ***						


สถานะการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

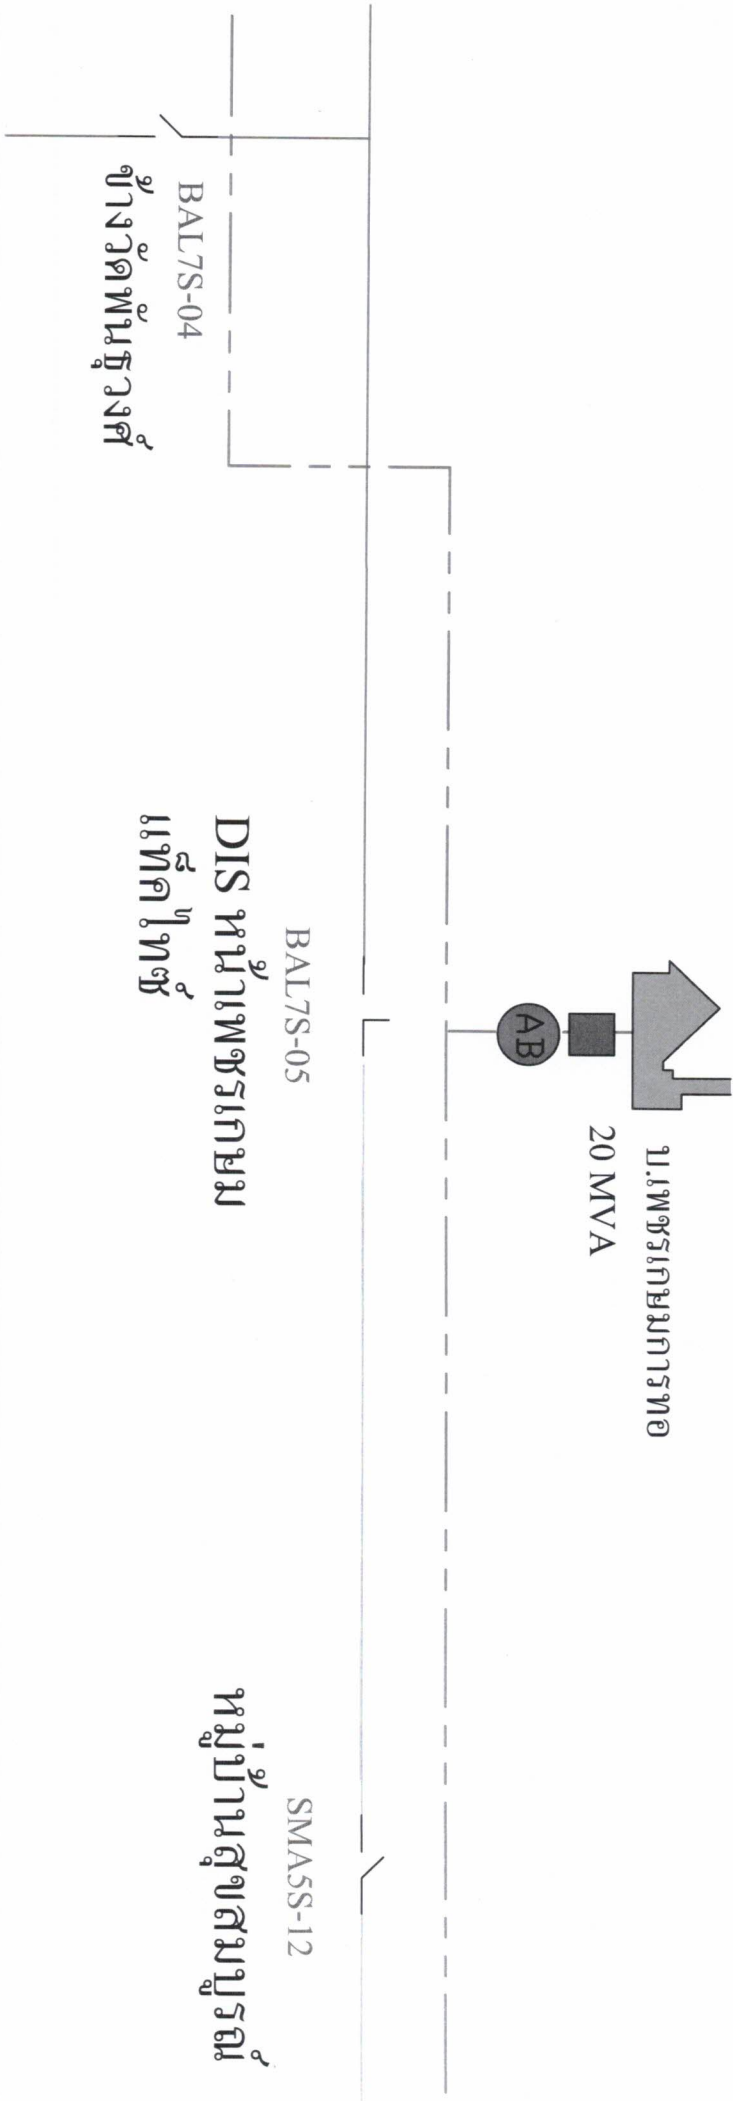

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

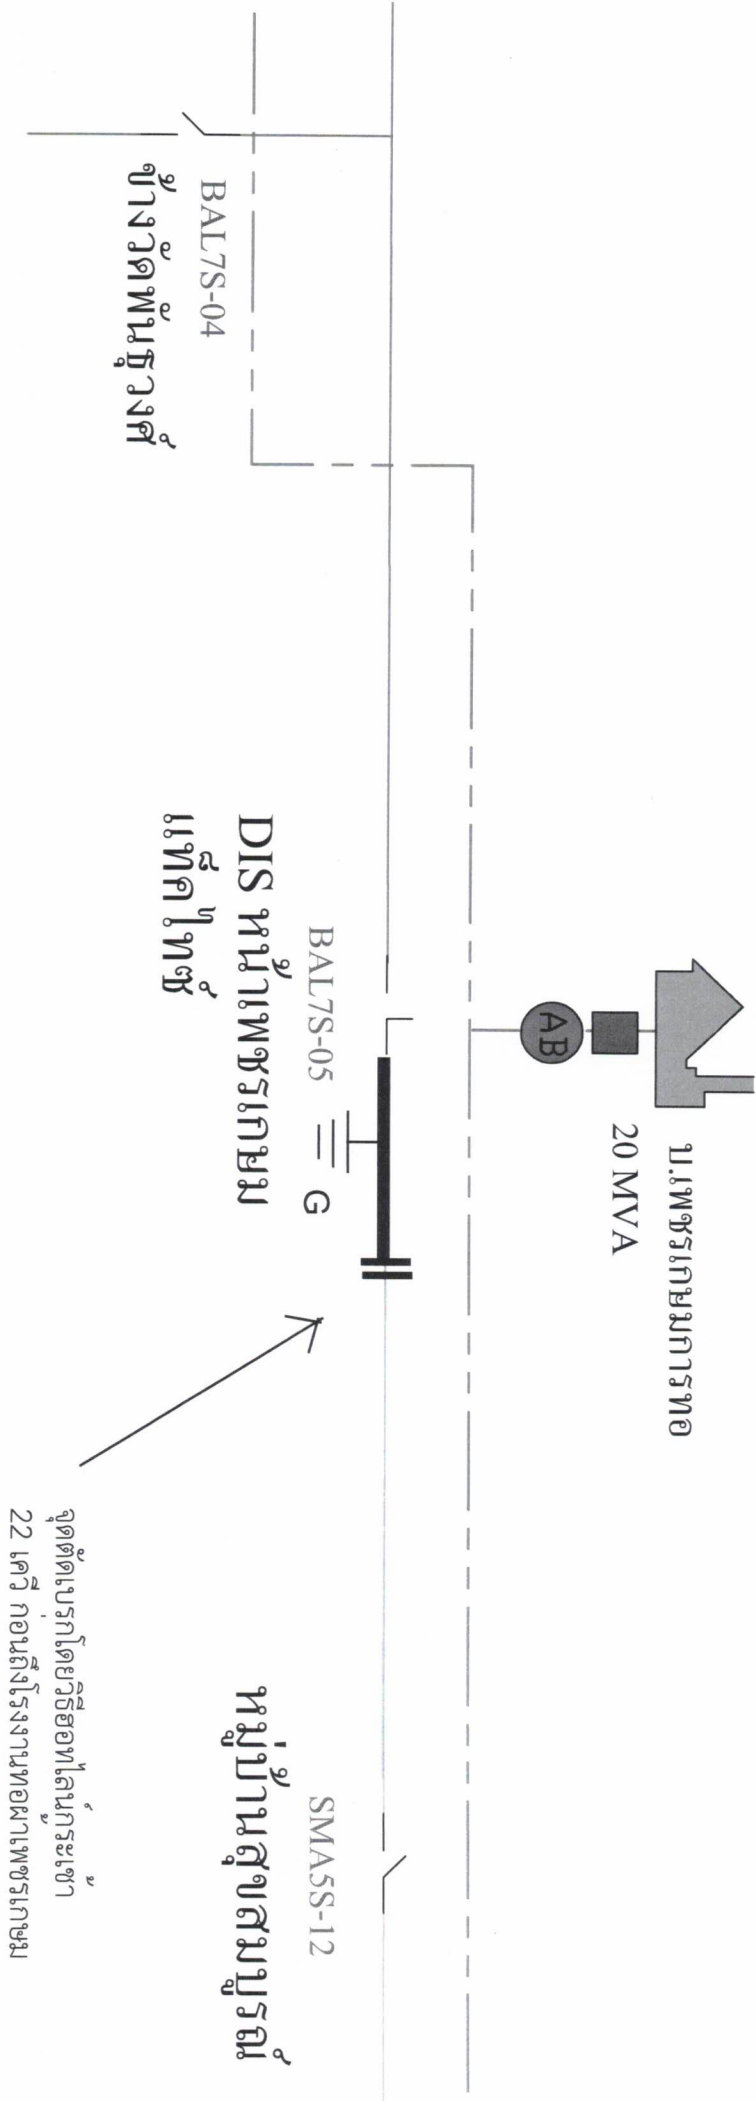

สถานะการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

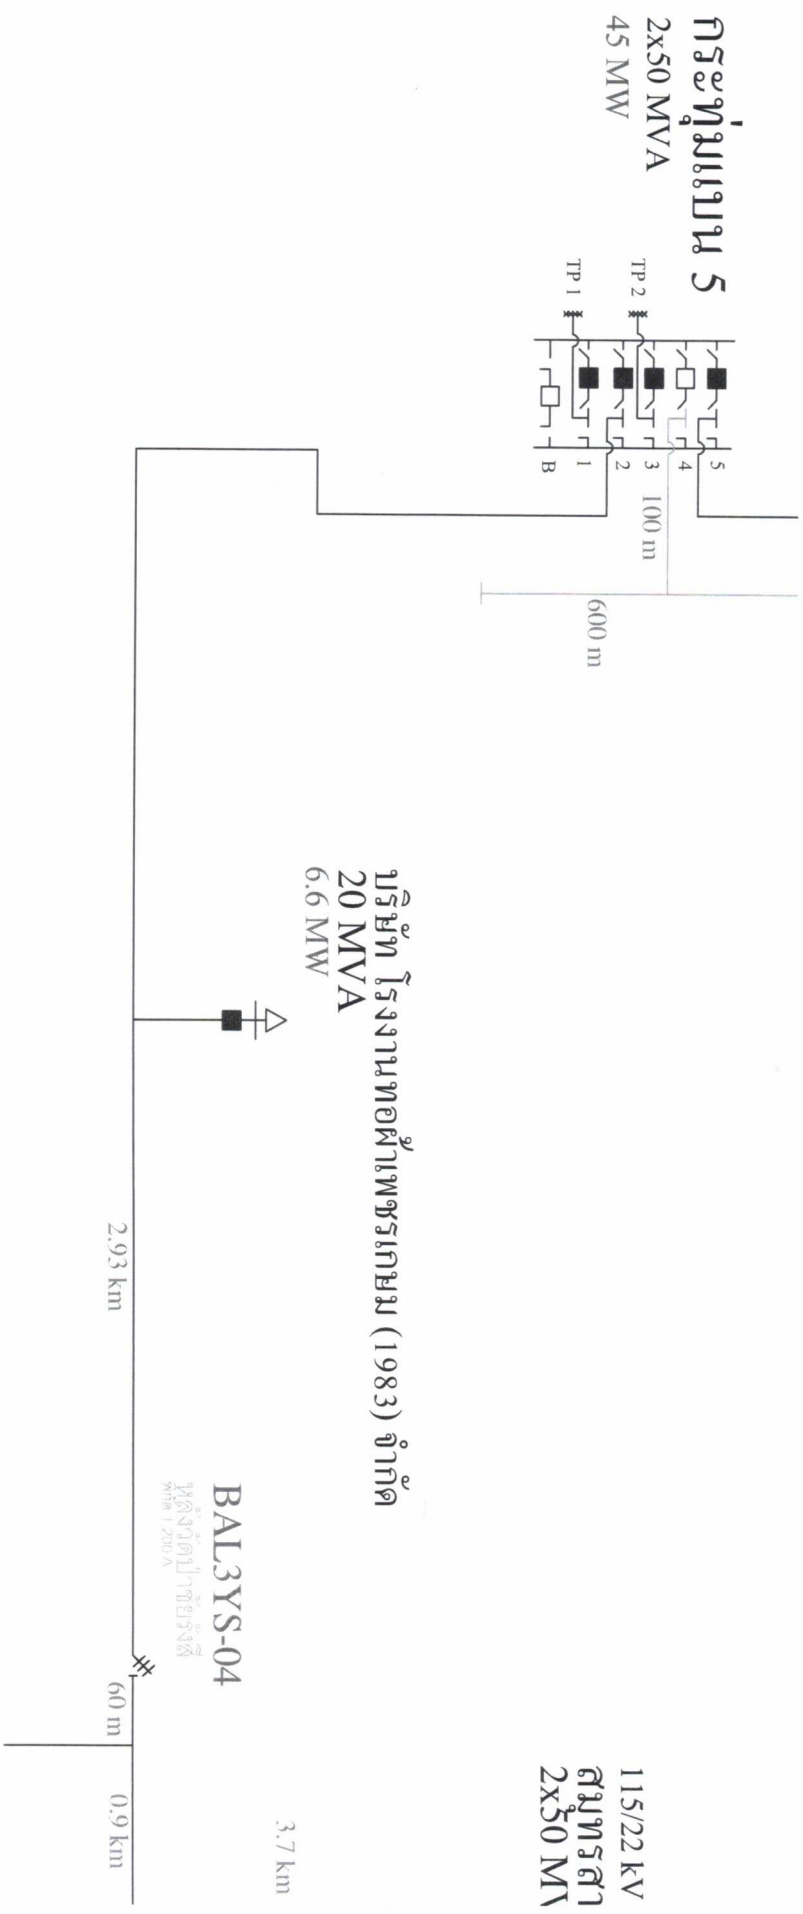

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

