



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 586 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์นันทน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้กรมโยธาธิการ ดอกเสาเข็มทำแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองข้าง สนง.กฟส.อมน. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK06	๘ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้กรมโยธาธิการ ดอกเสาเข็มทำแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองข้าง สนง.กฟส.อมน.	OYK06S-02	OYK06S-03 OYK01S-03	นายสุทธิพงษ์ คุ้มถนอม ๐๙๔-๙๕๖-๙๑๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟภายในซอยข้างสำนักงานการไฟฟ้าอ้อมน้อย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผ.ปบ โทร ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 04k06 จาก 04k 65-02 ถึง 04k 065-03
04k 015-03
ในวันที่ 8 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 443/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลี ศรีเนตร ประสานงานการขอดับไฟกับ ๒. เกียรติศักดิ์ ฮานนท์
๒๑ มิ.ย. ๖๗

ก
(นาย ศรีเนตร บัณฑิต) ๖๖
จตล. 5 ๒๓๓๓ ๒๕.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ.๐๒๓๐.
อก.บช.(ก.๓), อก.จว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี) .
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	คลองช้าง สนง.อมน. (OYK06)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ดับไฟให้กรมโยธาตอกเสาเข็ม ตามใบขอปฏิบัติงาน 443/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 23 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 23 มีนาคม 2567
	1. Shift		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสมพร,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,วรรณพงศ์,นายมนโษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
3	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		LOAD = 7.37 MW
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
5	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		LOAD = 3.18 MW
6	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		LOAD = 4.19 MW
7	ย้ายโหลด OYK06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONC06						
8	ONC06S-10	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		อมน.		SF6 ริมคลองซอยท่าพูด
9	ONC10S-04	ปลด	ล๊อค		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยอู่เหวง
10	OYK06S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS คอสะพานหลังไฟฟ้า
11	ONC10S-04	ล๊อค	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยอู่เหวง
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
13	OYK06S-02	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้าสนง.อมน.
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟอ่อน หากไม่พบไฟอ่อนให้ทำการ Short ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
21	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
22	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
23	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
24	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
26	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
27	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
28	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
30	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC			
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	OYK06S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	หน้าสนง.อมน.
35	ย้ายโหลด OYK06 บางส่วนกลับจาก ONC06							
36	ONC10S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยอุแหวง
37	OYK06S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	คอสะพานหลังไฟฟ้า
38	ONC10S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยอุแหวง
39	ONC06S-10	สับ	ปลด		อมน.		SF6	ริมคลองซอยท่าพูด
40	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
41	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
42	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
43	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
44	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2

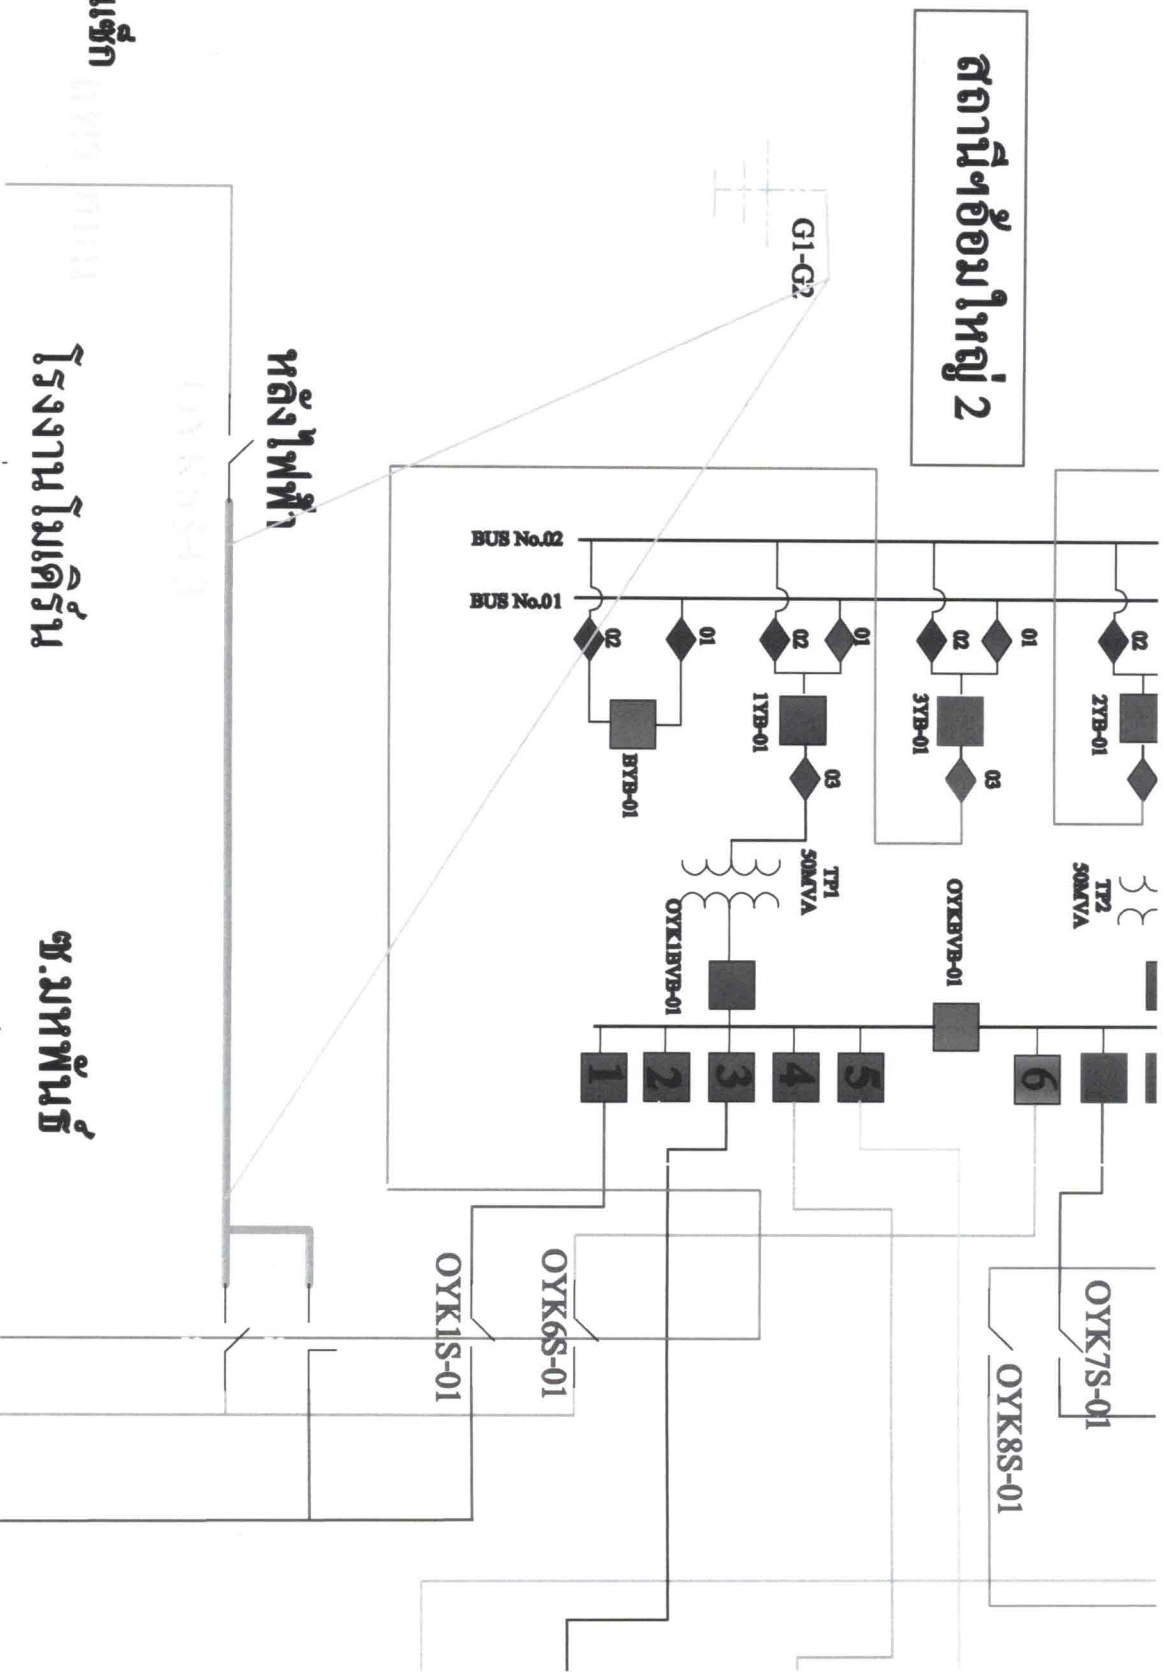

เอเชียโพลีเมติก
OYIIS-21

โรงงานโมดิรัน

ศร.มทพันธ์



กฟผ. ออมน้อย เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗

ที่ นฐ ๐๐๒๒/ ๐๒๕๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ (ส่วนต่อเติม)
นฐ ๗๓๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตขอย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ชิง
ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. สัญญาจ้างผู้ให้บริการ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้ให้บริการ ที่ รข ๓.๐๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. และ ๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไร่ชิง ระยะที่ ๓ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ว่าจ้างบริษัท พีคคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณฝั่งขวา กม.๗+๖๕๐ ถึง กม.๗+๙๔๔ โครงการต้อง ดำเนินการตอกเสาเข็ม ซึ่งต้องใช้รถเครนในการยกเสาเข็ม เพื่อลำเลียงเสาเข็มภายในโครงการ ซึ่งระหว่าง ใช้รถเครนยกเสาเข็มมีระยะห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง เพียง ๒.๖๕ เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม จึงขออนุญาตขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ศิริโรจนานท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๓๖๖ ๐๗๒๗ และนายบรรจง สีดา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๗๕๓ ๐๐๕๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

- เพื่อทราบ
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเปรมจิต สงวนแก้ว)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

(นายถิรภัทร สงวนพานิช)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟผ.ออมน้อย

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗

รจก.(ล)
รจก.(ท)
ผชน.๙
ผชน.๘
นวช.๙
นวช.๘
นตจ.
วตจ.
ผ.สน
ผ.บร
ผ.มต
ผ.บส
ผ.ปช
ผ.กส
ผ.
จป.
ห้องพิมพ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สาร ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๔๘

“ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ”
