



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๕๖๖๘ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายเพ็ญรัตน์ พงษ์สุวรรณกุล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า สามพราน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC02	21 มี.ค. 68	08.30	16.30	ชุดงานก่อสร้างและงานซ่อมย่อย ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อ รองรับการติดตั้งไฟส่องสว่างของกรม ทางหลวง	- Dis ชั่วคราว หน้าแพชวัล	- SAC02S-03 บ.เอเชีย พลาสติก	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
2.	SAC07	21 มี.ค. 68	08.30	16.30		- SAC07S สถานีสามพราน	- SAC07S-04 ก่อนยูเทิน หอมเกร็ด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... แนวถนนบรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า (ขาเข้า) ตั้งแต่ แยกยูเทินหอมเกร็ด ถึง บ.เอเชียพลาสติก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกานวัฒน์ นิตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๘๒๘๘๗ Long ๑๐๐.๒๔๔๒๗๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๘๓๔๖๑๗ Long ๑๐๐.๒๔๖๕๖๑

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ แพชวัล ถึง บ.เอเชียพลาสติก

วัน สุกรที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.


สถานี.สามพราน
PMB

SAC 07S

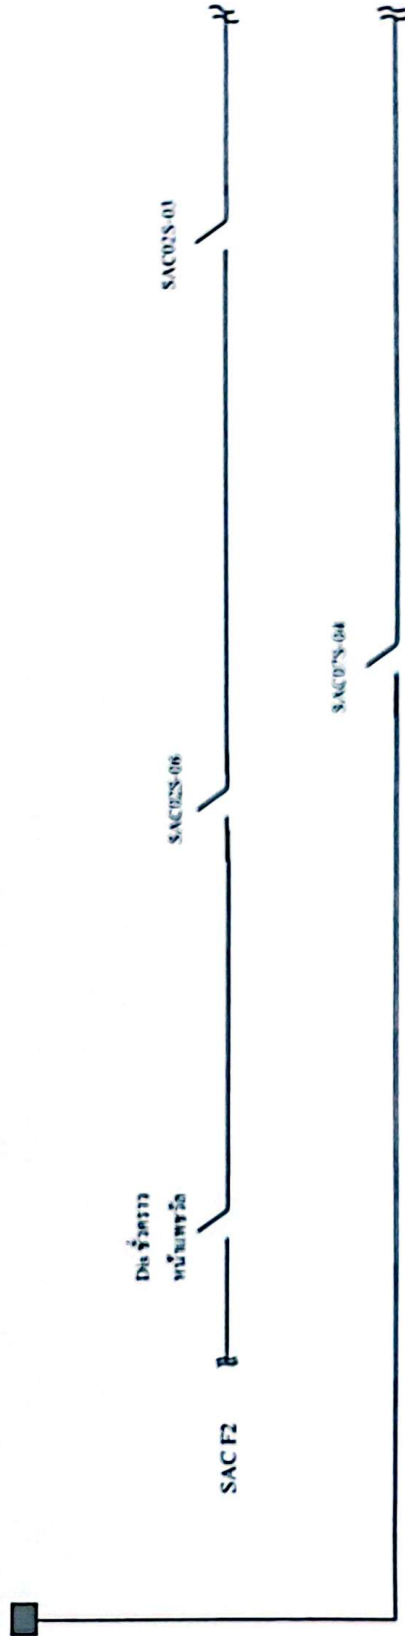

แผนผังหลังคัปไฟ บริเวณ เพชวลี ถึง บ.เอเชียพลาस्टิก
วัน สุกรที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สฟ.สามพราน
PMB

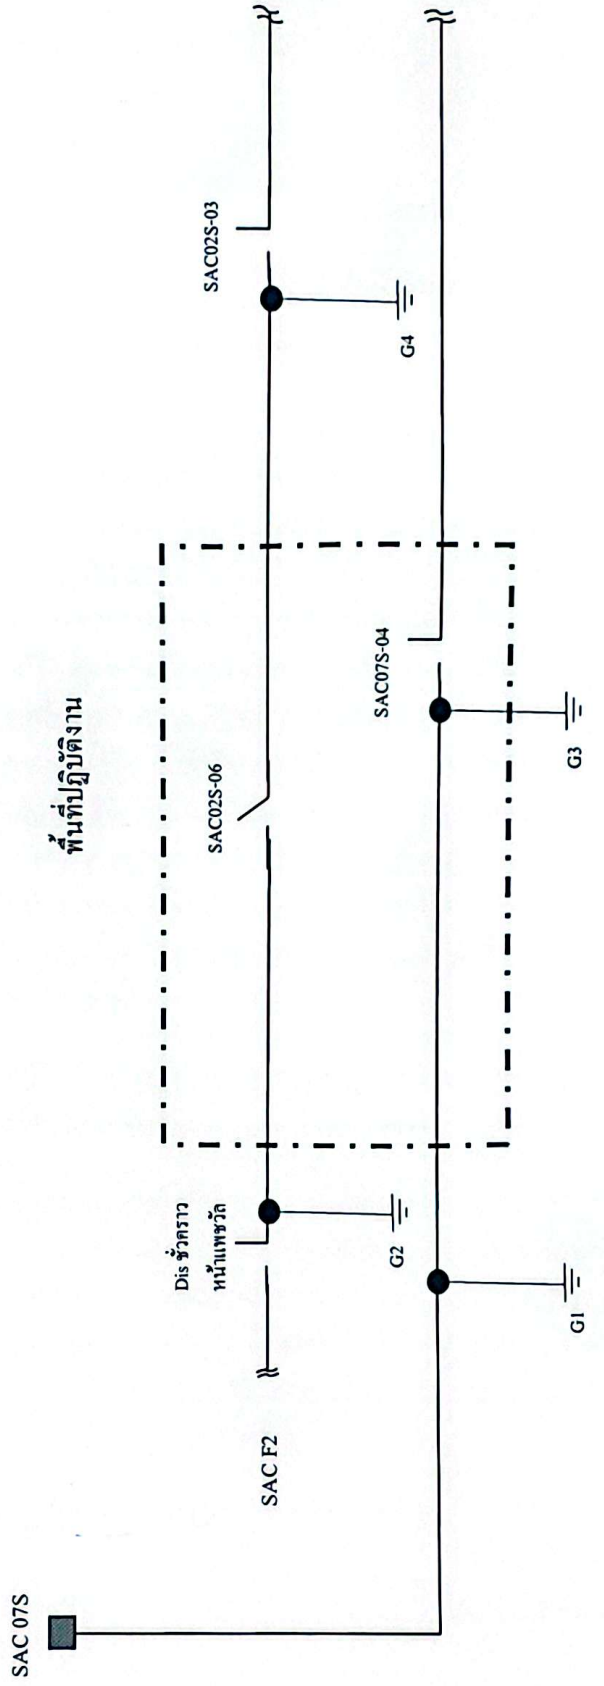

ด่วนที่สุด

ที่ สส.๗/๒๕๖๓/๒๓๗๘



ทพส.พุทธทศนทล

เลขที่รับ..... 1498

17 มี.ค. 2568

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี.....

(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง 09:02

๔๔/๗ หมู่ ๕ ถ.บรมราชชนนี ต.ห้อมเกร็ด

อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดับไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธทศนทล

ตามสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๙๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๕๔ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒๕ วัน รวมระยะเวลาทำการ ๑,๘๐๘ วัน ค่าก่อสร้าง ๓๖๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๙๐๙,๔๒๕.๐๐ บาท นั้น

เนื่องด้วยผู้รับจ้าง โดย บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด มีแผนเข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางกลับรถใต้สะพาน กม.๒๗+๑๐๐ - ๒๗+๔๐๐ RT. (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)

โดยบริเวณดังกล่าวจะใกล้กับแนวสายไฟฟ้า ๒๒ เควี เกินระยะความปลอดภัยของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธทศนทล ประสานงานการดับไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางกลับรถใต้สะพานในบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการฯได้มอบหมายให้ นายไชยยันต์ กุมกัน ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงาน(บริษัทฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๔๓๖๒๘๐๒ และ นายสุรศักดิ์ หัสตินรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐๙๒-๗๖๙๘๖๑๕ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน์ศักดิ์ อบเชย)

ชค.สส. สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)

จ.นครปฐม ๑ แห่ง
