



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๑๕๕๓ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

Switching Deadline

22 ส.ค. 67

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพ)

ด้วย กฟส.๒(บพ) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ สถานีสมุทรสาคร ๕ เชื่อม DDE แรงสูง วงจร SME๐๔ เพื่อลดโหลดวงจร BNPO๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๔	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เชื่อม DDE แรงสูง วงจร SME๐๔ เพื่อลดโหลด วงจร BNPO๖	SME๐๔S-๐๕ ถ.เอกชัยสายเก่า	จุดเปิด DDE	นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัทรักษสมุทร จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟผ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ แป้นเขียว)

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SME9 จาก SME9S-05 ถึง จุดเปิด DDE
ในวันที่ 23 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1177/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเทพ แป้นเขียว รับไฟแจ้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถนันท์ บัวสงค์

(นางสาวพริษา พงษ์ศิริ)
อศก.๕ กทนน.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒(บพ) ๑๕๕๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัททักษ์สมุทร จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 67	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	เชื่อม DDE แรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1177/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 16 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
3	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.						
5	SME09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	เอกชัยสายเก่า
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไล่น้ำมันหล่อลื่นหม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ SME09S-05 ถึง จุดตัด DDE						
7	เมื่อชุดทำงานทำการไล่น้ำมันหล่อลื่นหม้อแปลงบริเวณตั้งแต่ SME09S-05 ถึง จุดตัด DDE แล้วเสร็จ						
8	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการ จั้ม DDE ได้ (ตามผังแนบ)						
9	เมื่อชุด Hotline ให้ทำการ จั้ม DDE แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดทำงานให้นำไหลดหม้อแปลงเข้าได้ตามปกติ						
11	ย้ายไหลด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก SME09						
12	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
13	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
14	SME09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.	SF6	เอกชัยสายเก่า
15	BNP06S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SF6	แยกบุญโต แพคเตอร์รี่
16	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
17	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
18	SME09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
19	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

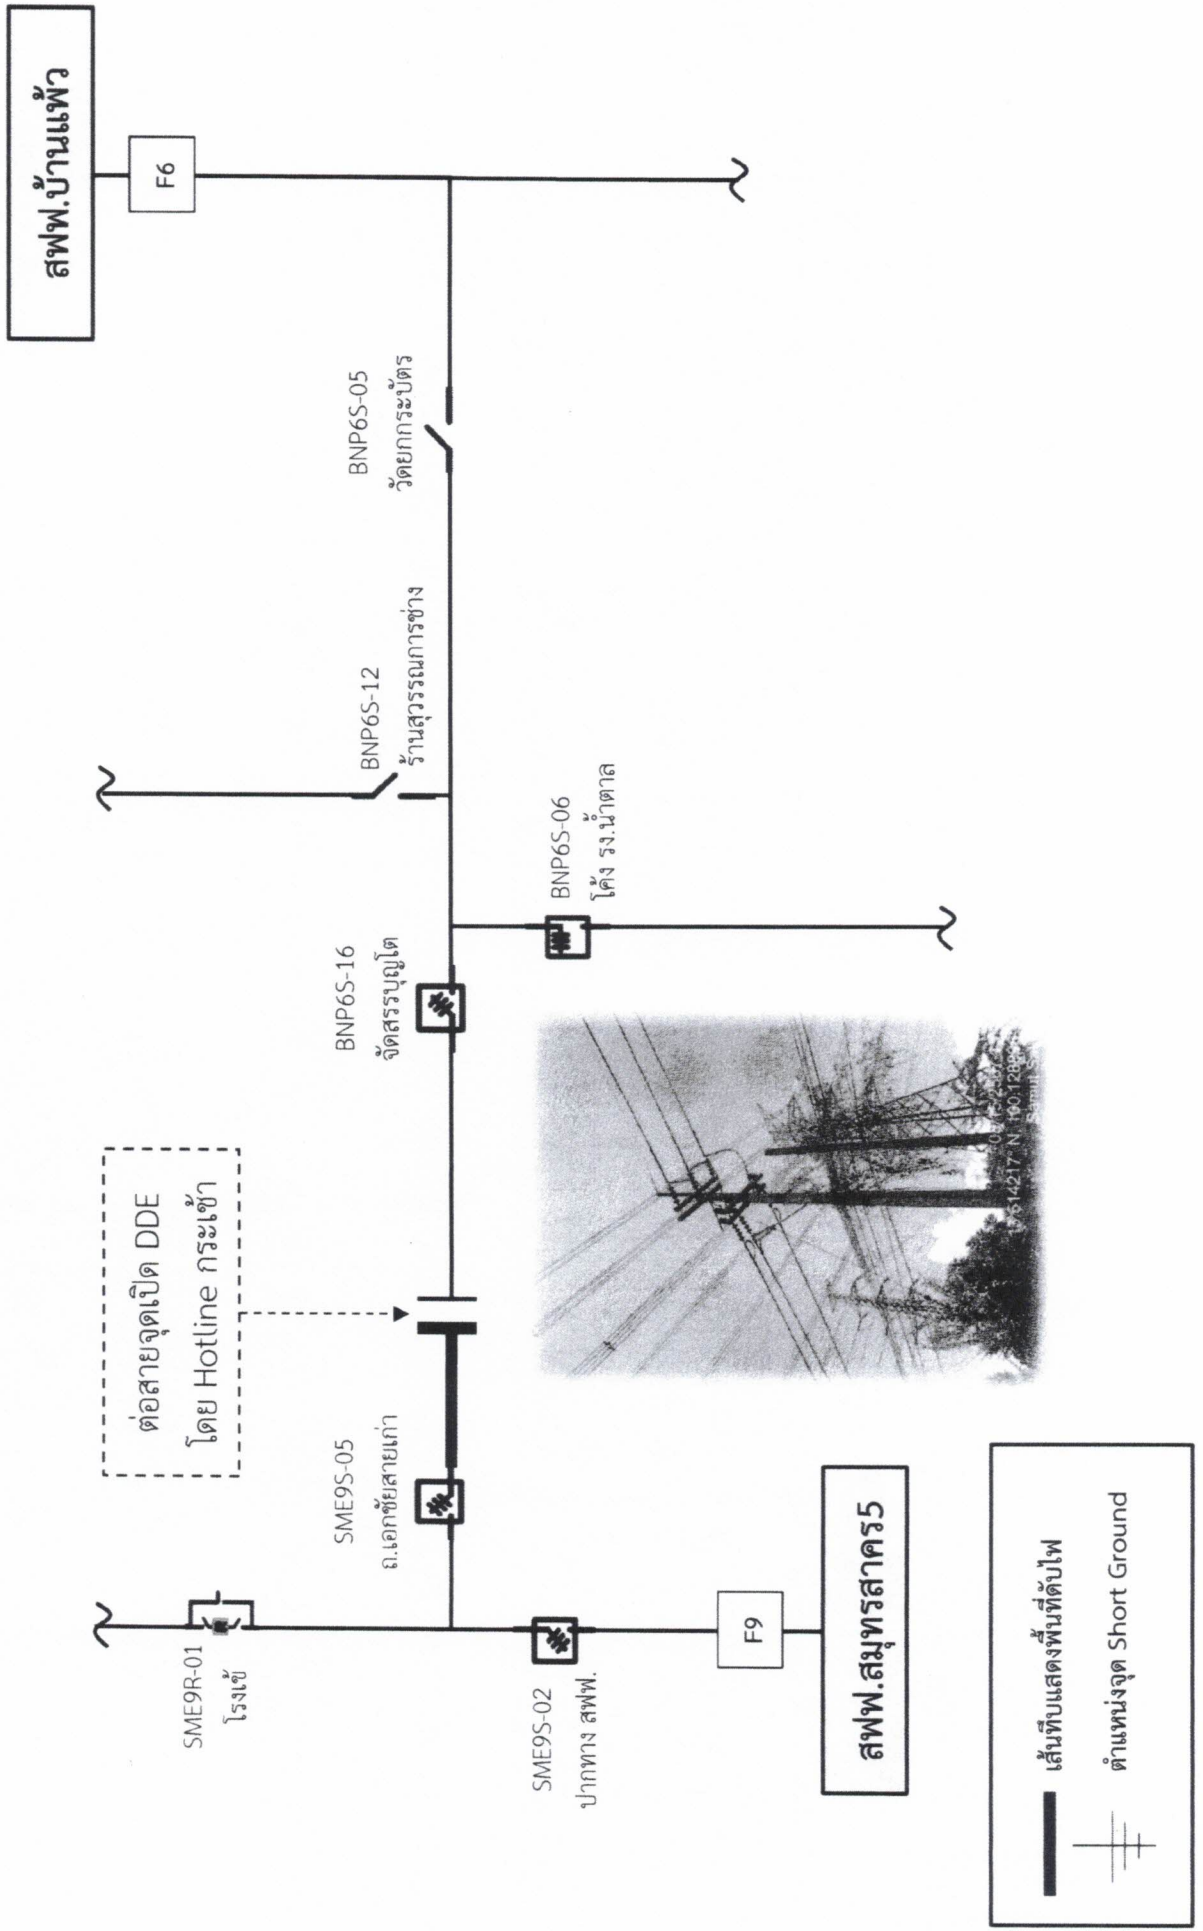

แผนผัง Single Line Diagram หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

