



วิทยขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๙๕๗๒๕๖๕

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณ์ชล

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร.สมุทรสาครจ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA3	๑๖ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง	SXA๓S-๐๖	SXA๓S-๐๗ SXA๓S-๑๑ SMF๑S-๑๓	นายประวิทย์ กรังพานิช เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF1	๑๖ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่ก่อน ถึงคร้วลูงยา	SMF๑S-๑๓ SMF๑S-๑๒ SMF๑S-๐๙	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนสันคาบ คลอง๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ผส.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)



๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)


ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนสันตปาบ คลอง2			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.คคข.	งานที่ทำ	พาดสายปักเสาไฟฟ้าแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1580/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่ 4 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 4 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 4 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
2	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
3	เมื่อ กฟผ.คคข.พร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์2(พันท้าย)จำกัด ทำการปลดขนาน						
5	เมื่อ บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์2(พันท้าย)จำกัด ทำการปลดขนานแล้วเสร็จ						
6	SXA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คคข.		SF6 ประตุน้ำสันตปาบ
7	DIS ชค.ไลน์SXA01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คคข.		DIS ก่อนถึงคริวลูงยา
8	SMF01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คคข.		SF6 บ.เอ็นแม็กซ์ โซลาร์2
9	แจ้ง กฟผ.คคข.ทำการตรวจสอบ SF6 SMF1S-09, SMF1S-13, SXA3S-07 OPEN พร้อม ล็อคคาน						
10	เมื่อ กฟผ.คคข.ทำการตรวจสอบ SF6 SMF1S-09, SMF1S-13, SXA3S-07 OPEN พร้อม ล็อคคานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
13	แจ้งชุด กฟผ.คคข.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
14	หลังจากชุด กฟผ.คคข.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
16	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
17	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟผ.คคข.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กฟผ.คคข.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
20	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
21	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
23	แจ้ง กฟผ.คคข.ทำการปลดล็อคคาน SF6 SMF1S-09, SMF1S-13, SXA3S-07 ออกได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อ กฟภ.คกข.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 SMF1S-09,SMF1S-13,SXA3S-07 ออกแล้วเสร็จ						
25	SMF01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		คกข.		SF6 บ.เอ็นแม็กซ์ โซลาร์2
26	DIS ชค.ไลน์SXA01	ปลด	ล๊ับ		คกข.		DIS ก่อนถึงคริวลูงยา
27	SXA03S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ปลด		คกข.		SF6 ประตุน้ำสันดาบ
28	แจ้ง บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์2(พันท้าย)จำกัด ทำการขนานไฟเข้าระบบได้						
29	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
30	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

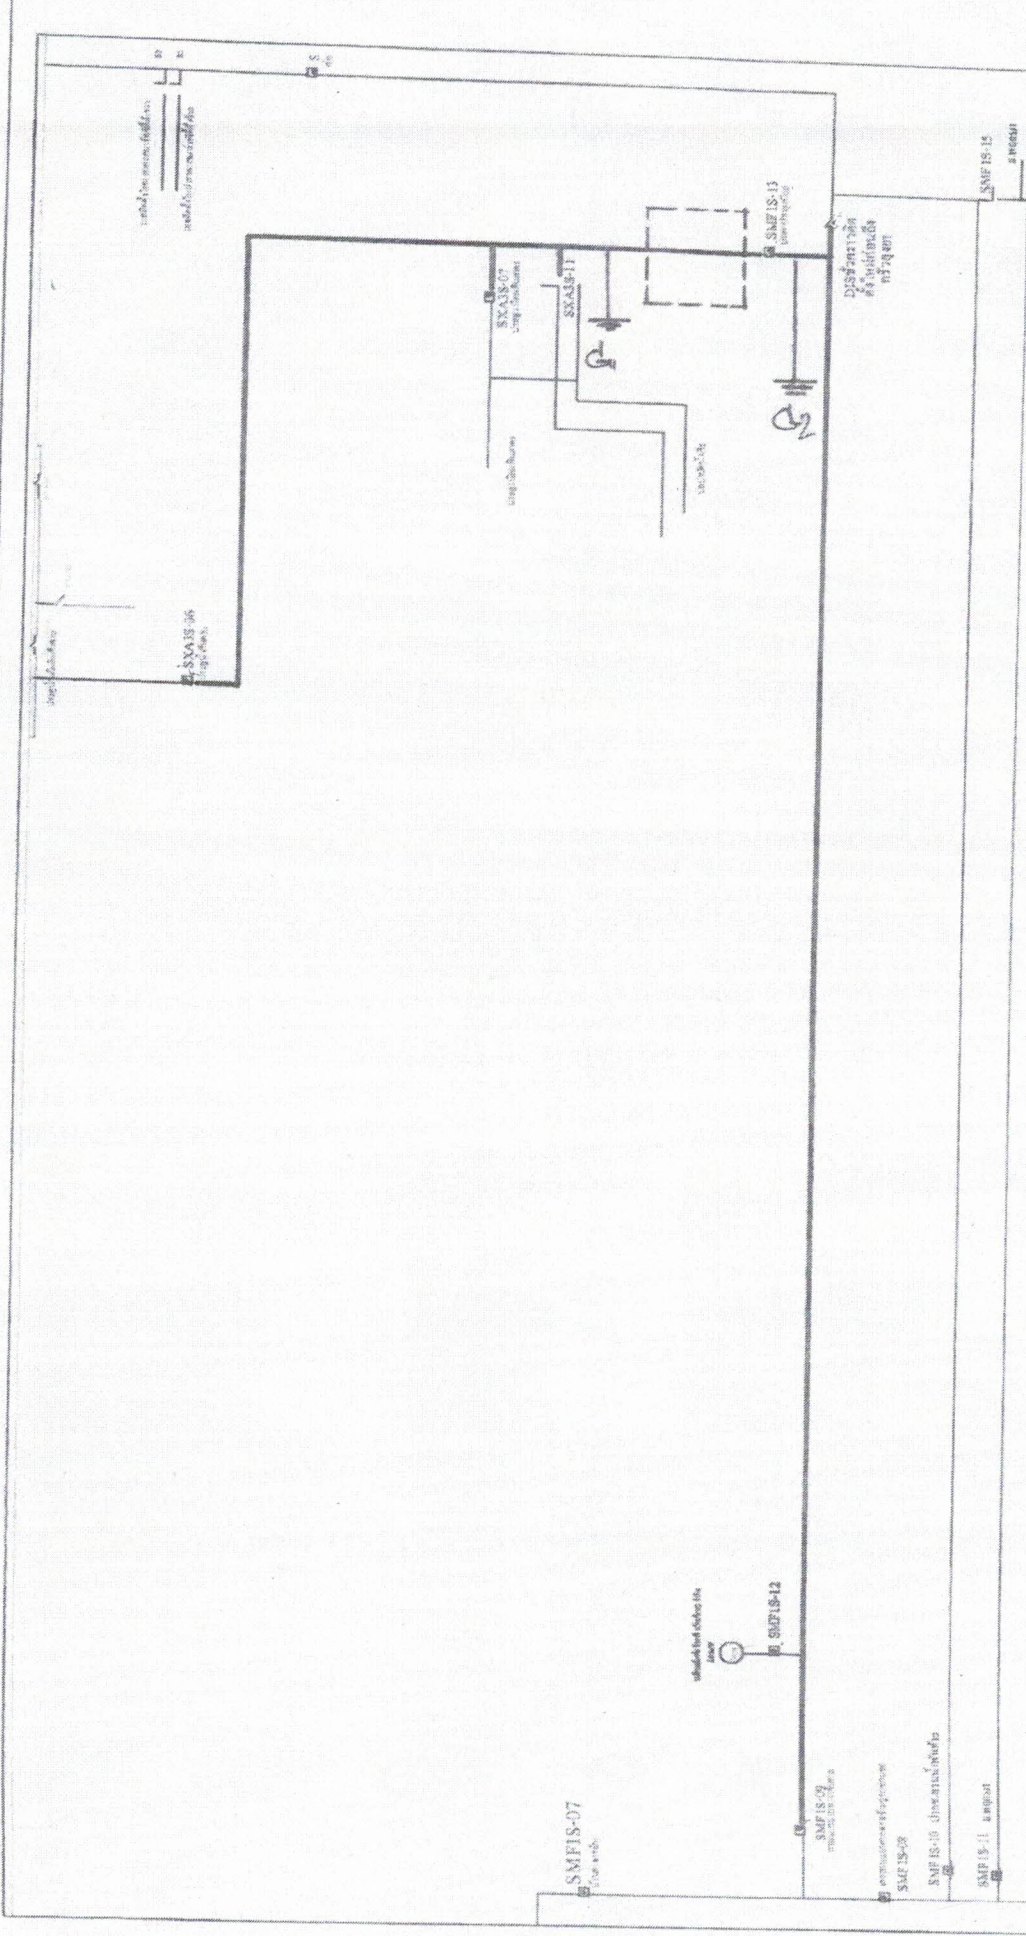

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ภูเก็ต
 สาขาภูเก็ต

ชื่อโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อผู้ทำ	สาขาภูเก็ต
ชื่อผู้ควบคุม	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่อผู้อนุมัติ	
ชื่อผู้รับอนุมัติ	
ชื่อผู้ดำเนินการ	
ชื่อผู้ติดตาม	
ชื่อผู้บันทึก	
ชื่อผู้พิมพ์	
