



Switching Deadline

18 ส.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 810/2567

วันที่ 16 ส.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ช่างงาน บ.ศรีชลธร จำกัด ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณชิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่/เวลา	ถึง/เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	19 ส.ค. 67	8.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบเช็คสถานะสัญญาณชิมการ์ด LBS ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส DBA๐๑YS-๐๘	DBA 1YS-03 เปิดนายเอ็ม	DAA1YB-01 สถานี ด้านข้าง	นายอำนวยการ กิตติ โพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.868986... Long: ...99.842119.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.86938... Long: ... 99.84566.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก DBA01YS-03 ถึง DAA01YB-01

ในวันที่ 19 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1174/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร์ เสงี่ยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี
วศก.๓ กฟภ.ดบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟส.ดบ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี..... - DAA -))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน LBS DBA01YS-08 ปากทาง บ.บริษัทแอนดีไซน์
- กำหนดวันที่ทำงาน 19-ส.ค.-67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ตรวจสอบสัญญาฉนวนขีมการ์ด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1174/2567
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 16 สิงหาคม 2567
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 สิงหาคม 2567
- อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 16 สิงหาคม 2567
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 kV DAA01YB-01 อยู่สถานะ Open						
3	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานี DBA
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	OFF ATS สถานีฯ DAA						
6	ตรวจสอบ LOW GAS LBS DBA01YS-03 อยู่สถานะ ไม่ LOW GAS						
7	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS กว๊ายเดี่ยวเปิดนายเอ็ม
8	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมิด 115 kV
9	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมิด 115 kV
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	ไม่ Short Ground เนื่องจากไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานที่สายส่ง						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
14	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานี DBA
สิ้นสุด Switching แรก							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับ สภาพปกติ						
16	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานี DBA
17	จ่ายไฟ 115 kV						
18	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมิด 115 kV
19	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมิด 115 kV
20	ตรวจสอบ LOW GAS LBS DBA01YS-03 อยู่สถานะ ไม่ LOW GAS						
21	DBA01YS-03	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		ดบ.		LBS กว๊ายเดี่ยวเปิดนายเอ็ม
22	ON ATS สถานีฯ DAA						
23	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW ช่างสถานี DBA
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟสายส่ง 115 เควี ให้ บ.ศรีชลธร จำกัดปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ DBA1YS-03 เป็นต้นไปจนถึง DAA1YB-03 สถานีด้านซ้าย

สถานีเดิมบาง

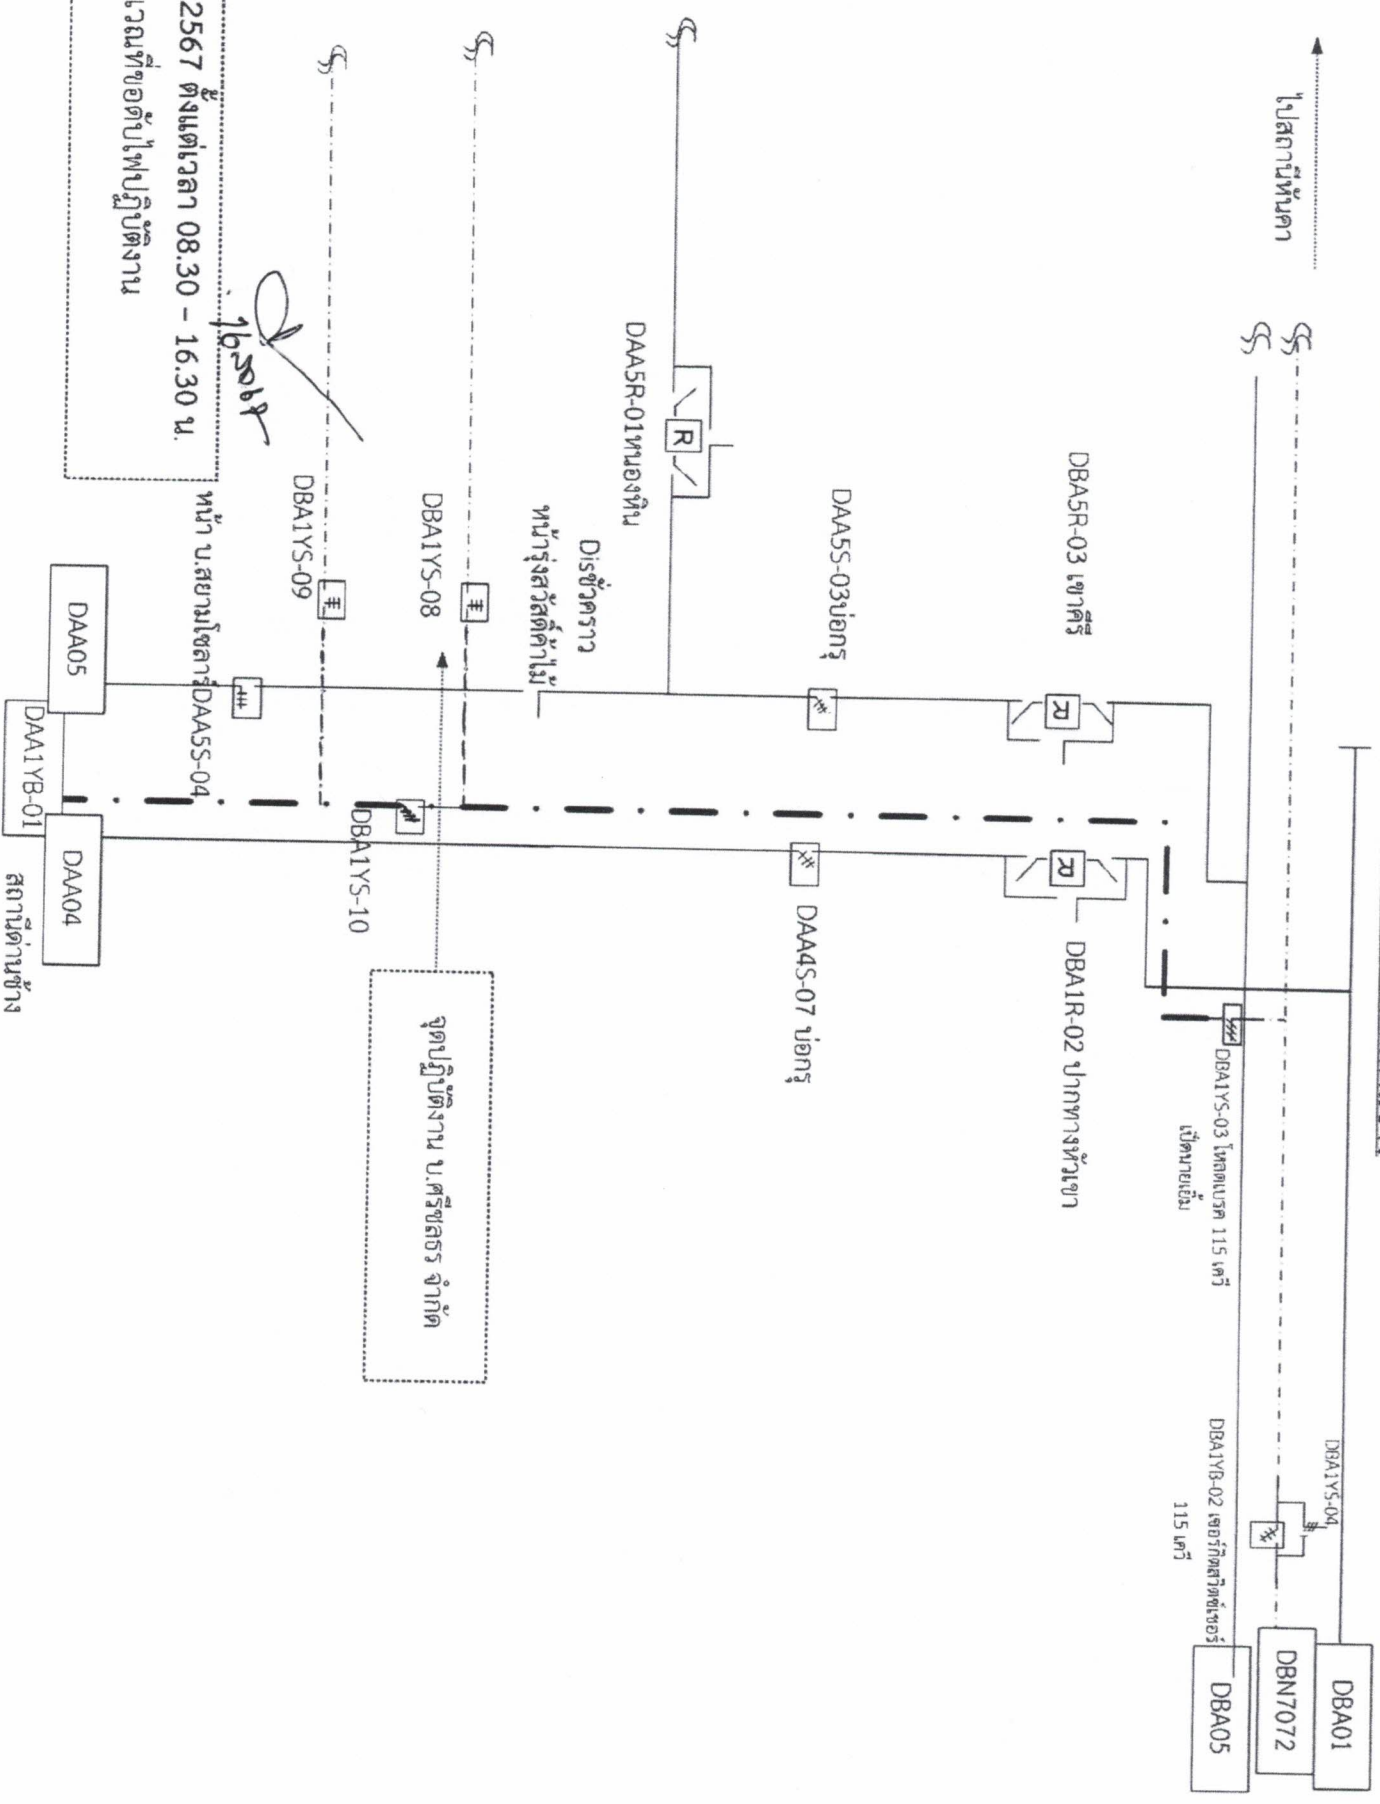

วันที่ 19 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-766

วันที่ 15 สิงหาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท วก.9 กรย.(ก.3))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อตรวจเช็คสถานะสัญญาณขิมการ์ด Load Break Switch 115 รหัสสั่งการ DBA01YS-08 สำหรับสั่งการระบบสื่อสารผ่าน SCADA ในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 3350 - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4086 บริเวณ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพรภัทร ลือขจร

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
คุณกัญญ์วรินทร์ วงษ์สนอง
093-329-8963
